



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO  
MANTENIMIENTO  
Proyecto Tasa de Seguridad**



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Operador            | ELEPHAS SAS           |
| Contrato disponible | 166_2026              |
| Técnico responsable | Hector Garcia Palacio |
| Cédula del técnico  | 15388863              |

## 1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Municipio                    | Támesis                      |
| Departamento                 | Antioquia                    |
| Fecha diagnóstico            | 26/08/2026                   |
| Vereda / sector              | OTRA BANDA                   |
| Dirección del punto / sector | Calle 13, Támesis, Antioquia |
| Latitud                      | 5.6647156811547115           |
| Longitud                     | -75.7178793134035            |
| Coordenadas formulario       | -75.72_5.66                  |

## 2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV              |
| Información Ubicación CCTV                           | PVV 1 Los Carmona |



|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO                       |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO                |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM                      |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO                       |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación de Antioquia |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO                       |

Foto 1



Foto 2



Foto 3

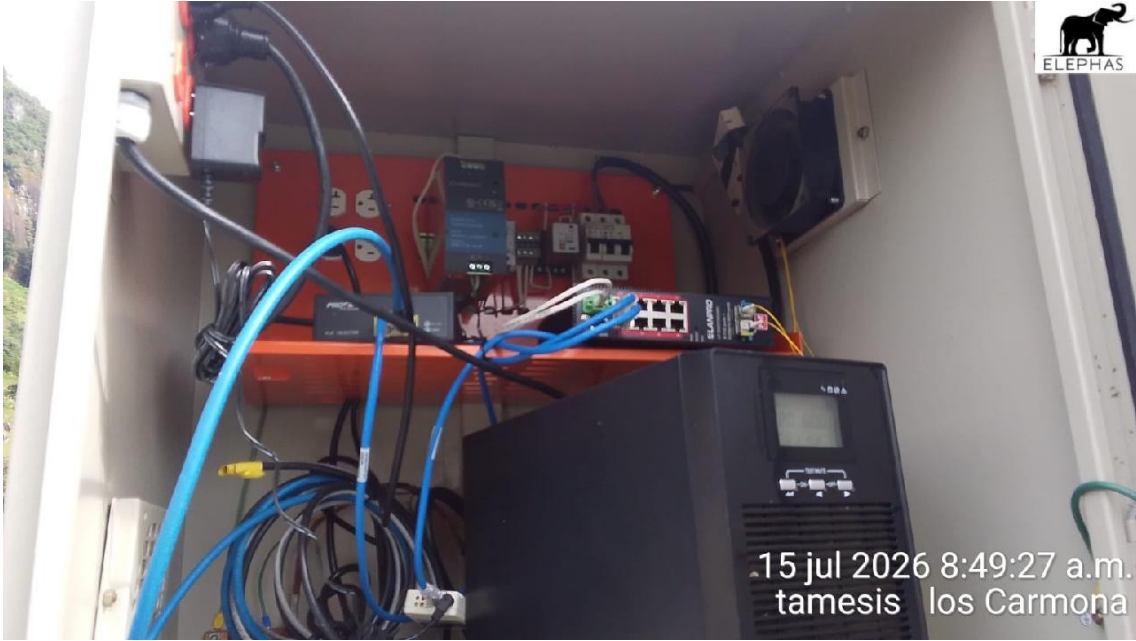


Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                             |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de anclaje:                    | POSTE                 |
| Tipo de poste                       | POSTE_CONCRE          |
| Altura del poste (m)                | 14MTS                 |
| Tipo de servicio                    | ENERGIA               |
| Dirección de referencia del anclaje | Calle 11 con calle 13 |
| Propietario del poste               | MUNICIPIO             |
| Tipo tension                        | BAJA                  |
| Red secundaria                      | TB_FO                 |

|                                                                                                                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Estado en el que se encuentra el anclaje:                                                                                                                                             | BUENO |
|  <p>15 jul 2026 8:38:38 a.m.<br/>5°39'53.291"N 75°43'4.376"W<br/>Támesis<br/>tamesis los Carmona</p> |       |
| Requiere Cambio de anclaje:                                                                                                                                                           | NO    |
| GABINETE METÁLICO                                                                                                                                                                     |       |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                             | SI    |
| Existe Gabinete Metálico:                                                                                                                                                             | BUENO |
|  <p>15 jul 2026 8:49:27 a.m.<br/>tamesis los Carmona</p>                                           |       |
| Requiere Kit de Ventilación Doble:                                                                                                                                                    | NO    |
| CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO                                                                                                                                                         |       |
| Existe Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                    | SI    |
| Estado de las Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                             | BUENO |
| Requiere Caja Distribución Vertical:                                                                                                                                                  | NO    |
| INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA                                                                                                                                                           |       |
| Existe Infraestructura Subterránea:                                                                                                                                                   | SI    |




|                                                                                                                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:                                                                                                                                    | CAJA_50X50 |
| Estado Caja 50x50:                                                                                                                                                                      | BUENO      |
|  <p>15 jul 2026 8:39:15 a.m.<br/>5°39'52.96"N 75°43'4.334"W<br/>Támesis<br/>tamesis los Carmona</p>    |            |
| Requiere Infraestructura Subterránea:                                                                                                                                                   | NO         |
| CORONA ANTIESCALATORIA                                                                                                                                                                  |            |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                          | SI         |
| Existe Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                          | BUENO      |
| Requiere Corona Antiescalatoria:                                                                                                                                                        | NO         |
| BRAZO DE SOPORTE                                                                                                                                                                        |            |
| Existe Brazo de Soporte:                                                                                                                                                                | SI         |
| Estado Brazo de Soporte:                                                                                                                                                                | BUENO      |
|  <p>15 jul 2026 8:50:49 a.m.<br/>5°39'52.328"N 75°43'3.84"W<br/>Támesis<br/>tamesis los Carmona</p> |            |
| Requiere Brazo de Soporte:                                                                                                                                                              | NO         |

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

## ACOMETIDA ELÉCTRICA

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Existen Cables: | SI    |
| Estado Cables:  | BUENO |


Foto Cables

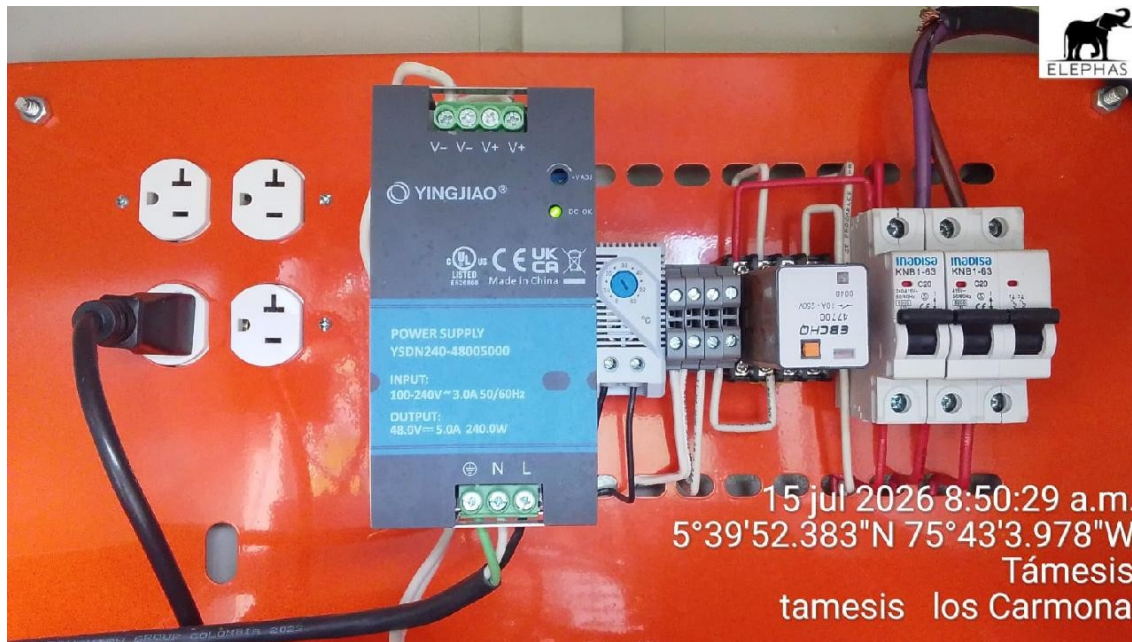

|                   |    |
|-------------------|----|
| Requiere Cables:  | NO |
| ⚡ TABLERO BREAKER |    |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Existe Tablero Breaker: | NO    |
| Existe Breaker:         | SI    |
| Estado Breaker:         | BUENO |

Foto Breaker

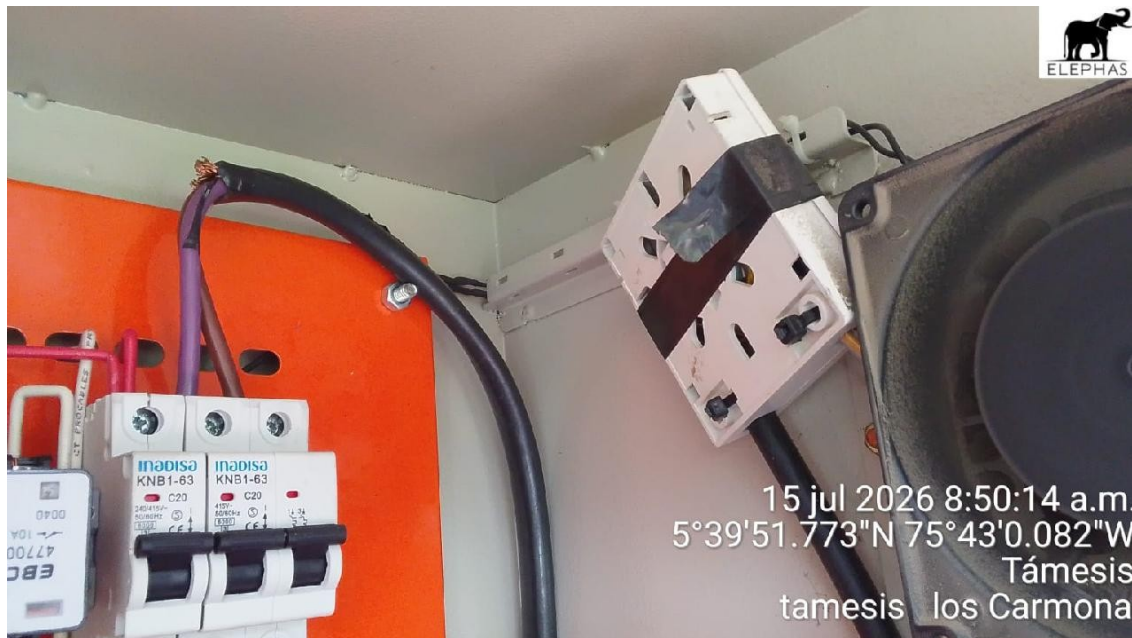

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Requiere Breaker:        | NO |
| ⚡ TRANSFORMADOR REDUCTOR |    |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Existe Transformador Reductor: | SI    |
| Estado Transformador Reductor: | BUENO |



Foto Transformador Reductor



15 jul 2026 8:50:10 a.m.  
5°39'51.773"N 75°43'0.082"W  
Támesis  
támesis los Carmona

Requiere Transformador Reductor:

NO

 TUBERÍA

Existe Tubería:

NO

Requiere Tubería:

NO

 CORAZA

Existe Coraza:

SI

Estado Coraza:

BUENO

Foto Coraza



15 jul 2026 8:50:51 a.m.  
5°39'52.434"N 75°43'3.936"W  
Támesis  
támesis los Carmona

Requiere Coraza 3/4":

NO

 UPS


Existe UPS:

SI

Estado UPS:

BUENO


Foto UPS

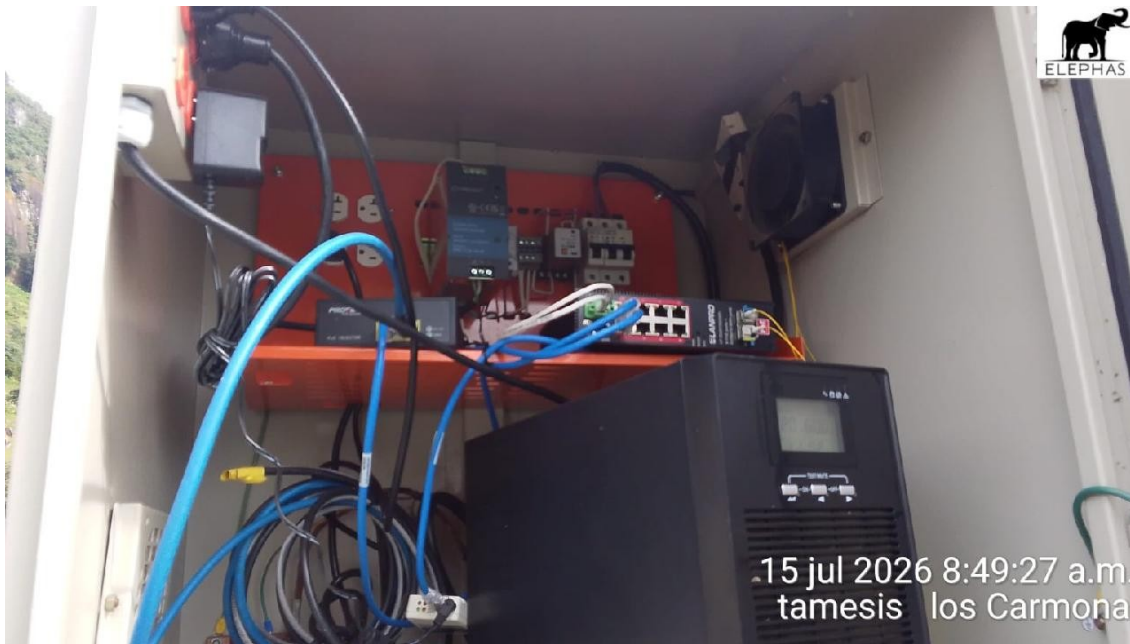

15 jul 2026 8:49:27 a.m.  
tamesis los Carmona

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Requiere UPS:                    | NO    |
| BATERÍAS UPS                     |       |
| Existen Baterías UPS:            | NO    |
| Requiere Baterías UPS:           | NO    |
| SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) |       |
| Existe SPT:                      | SI    |
| Estado SPT:                      | BUENO |

Foto SPT

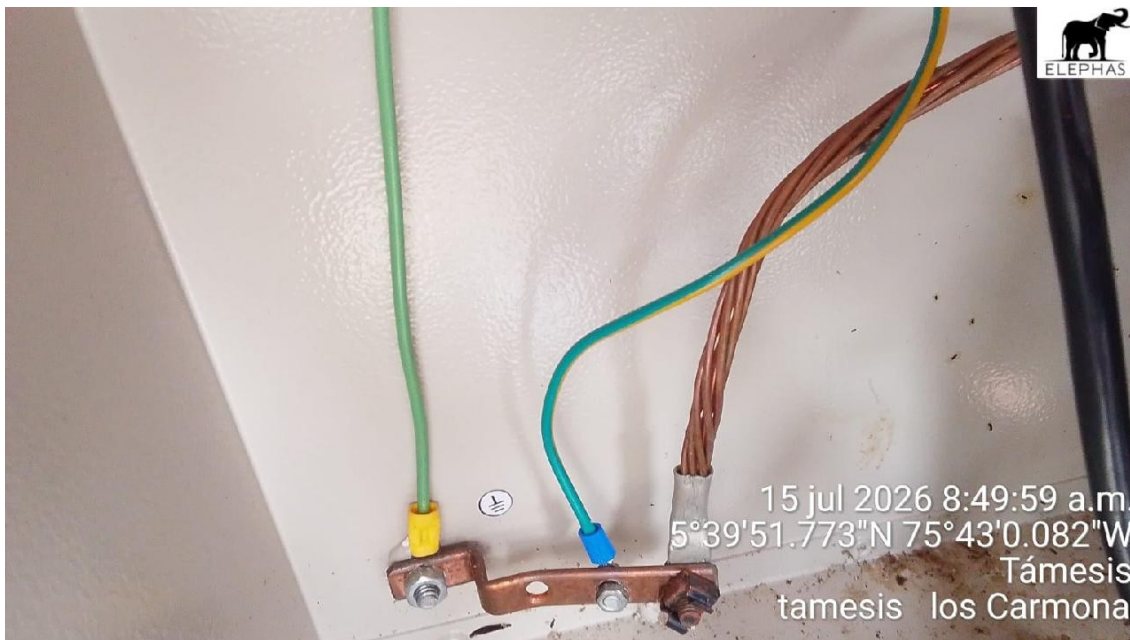

15 jul 2026 8:49:59 a.m.  
5°39'51.773"N 75°43'0.082"W  
Támesis  
tamesis los Carmona

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Requiere SPT:                 | NO                   |
| PROTECCIÓN                    |                      |
| Existe Protección:            | NO                   |
| Requiere Protección:          | SI                   |
| Tipo de Protección requerida: | PROTECCION_ELECTRICA |

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un): | 1                                                               |
| Observaciones Protección:                    | El Gabinete no cuenta con DPS para la protección de los Equipos |
| TOMA 125 V                                   |                                                                 |
| Existe Toma 125 V:                           | SI                                                              |
| Estado Toma 125 V:                           | BUENO                                                           |

Foto Toma 125 V




|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Requiere Toma 125 V:               | NO |
| CANALETA PLÁSTICA                  |    |
| Existe Canaleta Plástica:          | NO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO |

## 5. COMPONENTES DE EQUIPOS

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS |       |
| Existe Fibra Óptica:           | SI    |
| Estado Fibra Óptica:           | BUENO |



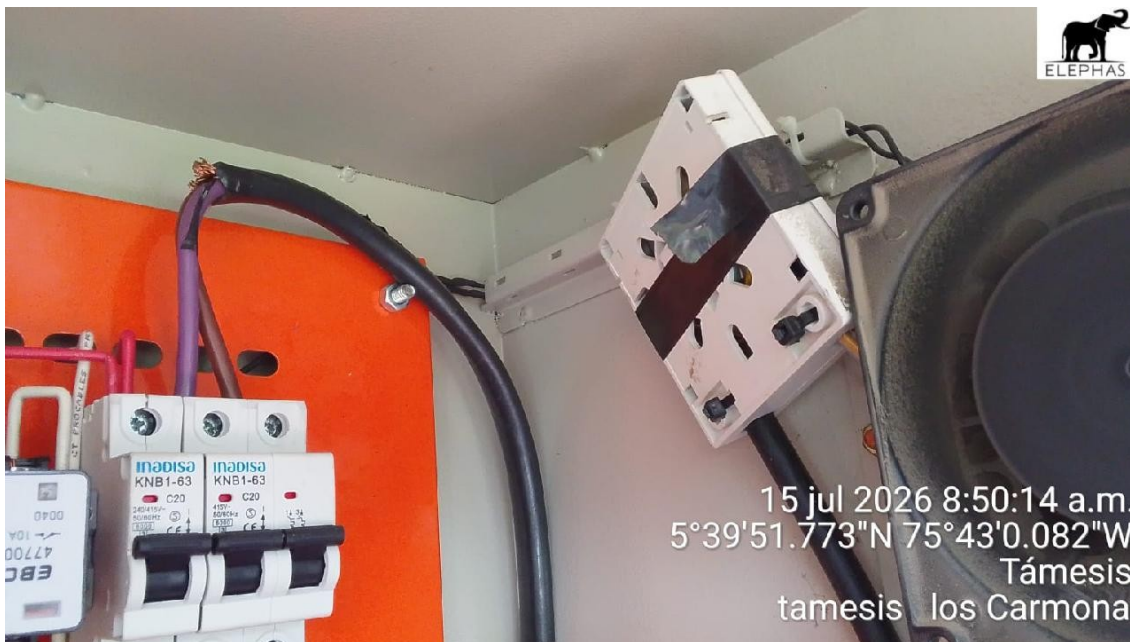

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Requiere Fibra Óptica: | NO             |
|                        | 🔌 INYECTOR POE |
| Existe Inyector PoE:   | SI             |
| Estado Inyector PoE:   | BUENO          |



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Requiere Inyector PoE: | NO            |
|                        | ⚡ PATCH CORD  |
| Existe Patch Cord:     | SI            |
| Estado Patch Cord:     | BUENO         |
| Requiere Patch Cord:   | NO            |
|                        | 🔌 PATCH PANEL |
| Existe Patch Panel:    | NO            |
| Requiere Patch Panel:  | NO            |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Requiere Toma RJ45:                     | NO    |
| 📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO               |       |
| Existe Organizador de Cableado:         | NO    |
| Requiere Organizador de Cableado:       | NO    |
| 🔄 CONVERTIDOR MONOMODO                  |       |
| Existe Convertidor Monomodo:            | NO    |
| Requiere Convertidor Monomodo:          | NO    |
| 📡 MÓDULO TRANSCEPTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO |       |
| Existe Módulo Óptico:                   | SI    |
| Estado Módulo Óptico:                   | BUENO |
| Requiere Módulo Óptico:                 | NO    |
| 🔌 SWITCH                                |       |
| Existe Switch:                          | SI    |
| Estado Switch:                          | BUENO |



|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Requiere Switch:                | NO    |
| 📷 CÁMARA                        |       |
| Existe Cámara:                  | SI    |
| Cantidad de cámaras existentes: | 1     |
| CÁMARA EXISTENTE 1              |       |
| Tipo de cámara                  | PTZ   |
| Estado de la cámara             | BUENO |



15 jul 2026 8:50:58 a.m.  
5°39'52.68"N 75°43'4.116"W  
Támesis  
támesis los Carmona

|                            |    |
|----------------------------|----|
| ¿Requiere Cámara?          | NO |
| Requiere Burbuja Domo PTZ: | NO |
| ENRUTADOR VPN              |    |
| Existe Enrutador VPN:      | NO |
| EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS |    |
| Existe Equipo TX/RX:       | NO |
| Requiere Equipo TX/RX:     | NO |

## 7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUNCIONANDO                                                                                                                     |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                                                                                              |
| Seleccione el tipo de mantenimiento:                                                  | CORRECTIVO                                                                                                                      |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | El punto se encuentra operativo pero no cuenta con DPS para la protección de los equipos, y organización de los cables internos |

## 8. CONTROL DE APROBACIÓN
