



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Urrao
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	15/09/2026
Vereda / sector	EL INIDIO
Dirección del punto / sector	Carrera 30, Urrao, Antioquia
Latitud	6.317339338962451
Longitud	-76.13423531296986
Coordenadas formulario	-76.13_6.32

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 3 LPR Parque



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	ESTRUCTURA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 30 con Calle 30 parque principal
Estado en el que se encuentra el anclaje:	MALO



Requiere Cambio de anclaje:

NO

 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:

CAJA_50X50

Estado Caja 50x50:

BUENO



Requiere Infraestructura Subterránea:

NO

 CORONA ANTIESCALATORIA

Existe Corona Antiescalatoria:

SI

Existe Corona Antiescalatoria:

BUENO

Requiere Corona Antiescalatoria:

NO

 BRAZO DE SOPORTE

Existe Brazo de Soporte:

NO

Requiere Brazo de Soporte:

NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

 ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:

SI

Estado Cables:


BUENO

Foto Cables



Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor

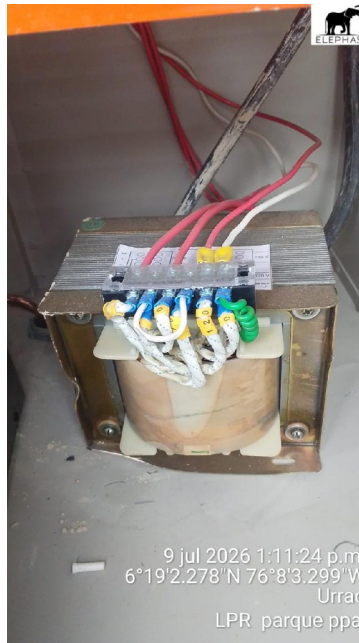

Requiere Transformador Reductor:	NO
🔧 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO

Requiere Tubería:	NO
CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:	NO
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO

Foto SPT



Requiere SPT:	NO
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	El Gabinete no cuenta con DPS
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
----------------------	----

CANALETA PLÁSTICA

Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO

INYECTOR POE

Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



Requiere Inyector PoE:	NO
------------------------	----

PATCH CORD

Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO

PATCH PANEL

Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO

CONVERTIDOR MONOMODO

Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO

MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO

Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO

SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO
	
Requiere Switch:	NO
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	LPR
Estado de la cámara	BUENO
	
¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO

ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	SUM-OE11
Descripción de la actividad	OSTES TIPO L, ALTURA ENTRE 5400 - 6000 MM EN PERFIL TUBULAR 6" ESPESOR 3MM, ANCHO DE 5500 MM EN PERFIL TUBULAR DUBLE DE 4 1/2",ESPESOR 3MM SEPARADOR DE 345MM EN PERFIL TUBULAR DE 2",ESPESOR 3MM,PLACA BASE DE 400X400X ½" CON PIE DE AMIGOS EN PLATINA DE ½"
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe cambiar la estructura ya que fue colicionada y presenta averias
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE11 ESTRUCTURA EN L-a20b5ea5536c4f4aabf0fd69495cb272.xlsx
	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	INST-OE08
Descripción de la actividad	Instalación gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe instalar nuevamente el gabinete en la estructura nueva
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-73b97a1089594a76af35e597eb9a7262.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	INST-OE14
Descripción de la actividad	INSTALACION PUNTO NUEVO DE CÁMARA FIJA PARA

	RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR , INCLUYE IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y ENERGIA Y TODAS LAS ACTIVIDADES Y ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEFINIDOS EN ANEXO TECNICO.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe instalar nuevamente la camara y configurarla en la nueva estructura
Archivo APU adjunto	APU INST-OE14 CAMARA LPR-b42dec44f3794c4ca026f334b6bb3e6a.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 4	
Código del ítem	INST-OE17
Descripción de la actividad	INSTALACION POSTES TIPO L PARA MONTAJE DE SISTEMAS LPR, INCLUYE, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, CIMENTACIÓN, DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE, ACABADOS Y DEMAS ACTIVIDADES Y ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACION YFUNCIONAMIENTO
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se ddebe retirar la estructura vieja y montar la nueva
Archivo APU adjunto	APU INST-OE17 ESTRUCTURA EN L-8dc072d04f9a42b5885e4dc6d0b17807.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 5	
Código del ítem	INST-OE19
Descripción de la actividad	INSTALACION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 4 SC/LC,IP 65, ENTRADA (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe desmontar y volver a empalmar la caja OB
Archivo APU adjunto	APU INST-OE19 CAJA OB-9e857b243e0c4ff393951dc32ff277a1.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de manteniemento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se sugiere el cambio de la estructura LPR ya que esta fue colisionada, quedando ladiada con posibilidad de que se caiga

8. CONTROL DE APROBACIÓN
