



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Urrao
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	14/09/2026
Vereda / sector	LA LUCIA
Dirección del punto / sector	Urrao, Antioquia
Latitud	6.3280507837604905
Longitud	-76.13279775223023
Coordenadas formulario	-76.13_6.33

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV1 LPR Jaipera pasa a ser PVV1 LPR entrada Caicedo



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacio de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	ESTRUCTURA
Dirección de referencia del anclaje	calle 40 con carrera 22
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO

 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

SI

Observaciones Caja Distribución Vertical:

El punto sera trasladado de su ubicacion actual a la direccion que se deja en la

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI


Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	MALO
 05/07/2026 16:13:46 6.3256633333333334N 76.13633499999999W Urrao LPR Jaivera Traslado	
Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CANALIZACION_PROY,CAJA_50X50_PROY
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO
 9 jul 2026 2:47:48 p.m. 6°19'32.499"N 76°8'10.785"W Urrao LPR jaipera	
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	NO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO

Foto Cables

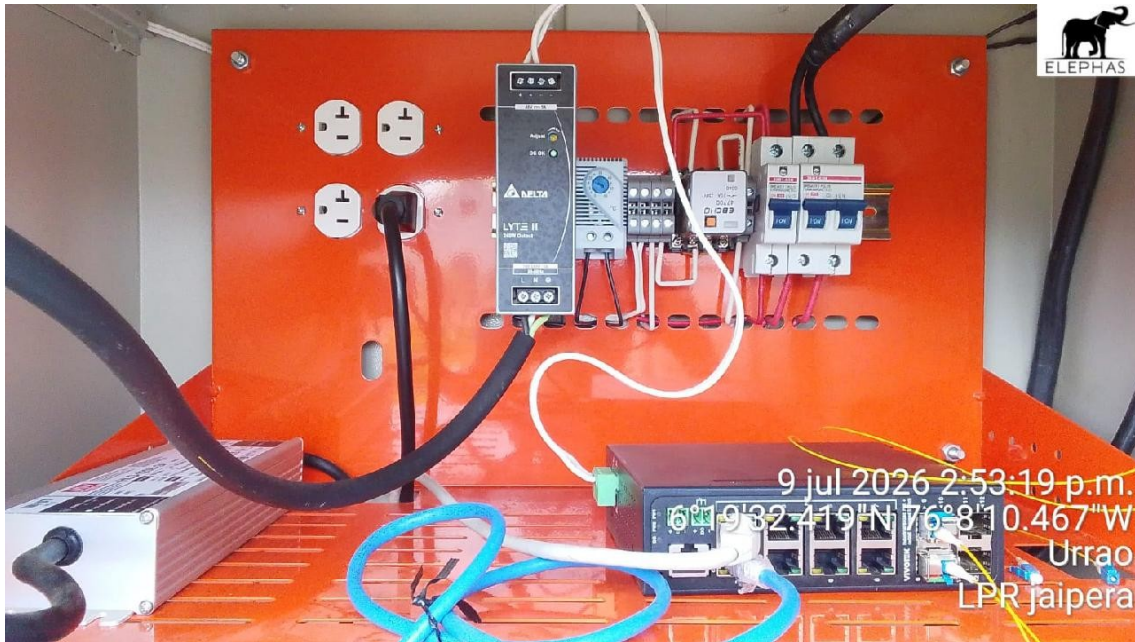

Requiere Cables:	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad Cable 2x8+8 AWG (ml):	30
Observaciones Cables:	El concentrico que tenia la LPR fue uzado para la instalacion de la camara

⚡ TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO

Foto Breaker




Requiere Breaker:	NO
-------------------	----

TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor

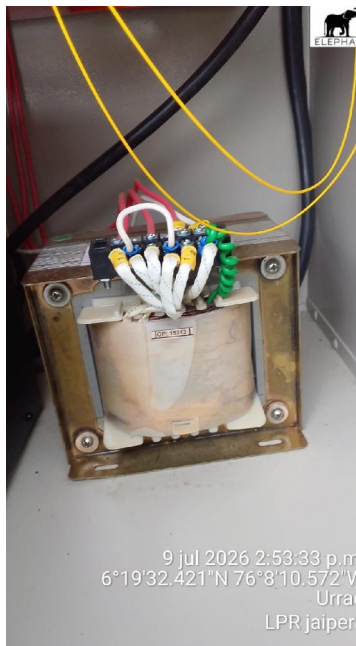

Requiere Transformador Reductor:	NO
TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO

UPS

Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO


Foto UPS



9 jul 2026 2:52:46 p.m.
6°19'28.629"N 76°8'9.279"W
Urrao
LPR jaipera

Requiere UPS:	NO
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO

Foto SPT

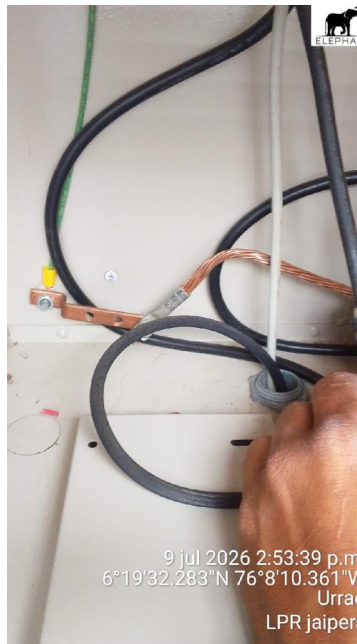

9 jul 2026 2:53:39 p.m.
6°19'32.283"N 76°8'10.361"W
Urrao
LPR jaipera

Requiere SPT:	SI
Observaciones SPT:	A pesar de que la puesta a tierra esta buena se requiere de la instalaicon de
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI

Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	El punto no cuenta con DPS
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Foto Toma 125 V	
	
Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	SI
Observaciones Fibra Óptica:	La FO fue utilizada para conectar la camara PTZ que se instalo para
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
⚡ PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSEPTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	LPR
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	SI
Tipo de Cámara requerida:	LPR
Cantidad de cámaras requeridas:	1
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
Observaciones Cámara:	Se solicio dejar el punto con dos camaras, en la actualidad solo existe 1

ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE08
Descripción de la actividad	Instalación gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe instalar nuevamente el gabinete en la nueva ubicacion
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-1363a9b8adb3414989e3ecf4bdc3c385.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	INST-OE14
Descripción de la actividad	INSTALACION PUNTO NUEVO DE CÁMARA FIJA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR , INCLUYE IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE CONECTIVIDAD Y ENERGIA Y TODAS LAS ACTIVIDADES Y ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEFINIDOS EN ANEXO TECNICO.
Unidad	UN
Cantidad	2
Justificación	Se deden de instalar y configurar las dos camaras en la nueva ubicacion
Archivo APU adjunto	APU INST-OE14 CAMARA LPR-0d86ab1c32fc4d32b1eb5ecb41f44e3e.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	INST-OE15
Descripción de la actividad	INSTALACION DE LICENCIA PARA INTEGRACION DE CÁMARA EN VMS
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe de instalar la licencia para la camara nueva
Archivo APU adjunto	APU INST-OE15 LICENCIA CAMARAS-3421d28571e94d1ab60ded2060dd116b.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 4	
Código del ítem	INST-OE16
Descripción de la actividad	INSTALACION DE LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS ALTA VELOCIDAD POR CÁMARA PARA VMS, ASOCIADO A PLATAFORMA EXISTENTE SIES-D, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTEGRACION, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (IF-LPR-H-CMM),
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe instalar la licencia LPR para la camara nueva
Archivo APU adjunto	APU INST-OE16 LICENCIA LPR-ce586cc79851406db82a036af02b6b0e.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 5	
Código del ítem	INST-OE17
Descripción de la actividad	INSTALACION POSTES TIPO L PARA MONTAJE DE SISTEMAS LPR, INCLUYE, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, CIMENTACIÓN, DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE, ACABADOS Y DEMAS ACTIVIDADES Y ELEMENTOS NECESARIO PARA

	SU CORRECTA IMPLEMENTACION, FUNCIONAMIENTO
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere de la instalacion de la estructura LPR y la cimentacion de la misma
Archivo APU adjunto	APU INST-OE17 ESTRUCTURA EN L-200ea89df135482f9e79ddf78d9fb92a.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 6	
Código del ítem	INST-OE18
Descripción de la actividad	INSTALACIÓN DE CABLE CONCENTRICO 2X8 +8 AWG, INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LOS DEFINIDOS EN ANEXO TECNICO.
Unidad	ML
Cantidad	30
Justificación	Se debe de instalar la nueva acometida electrica
Archivo APU adjunto	APU INST-OE18 CONCENTRICO-c5a6e91c2ff046fd9900addc68b5d662.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 7	
Código del ítem	INST-OE19
Descripción de la actividad	INSTALACION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 4 SC/LC,IP 65, ENTRADA (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe conectorizar e instlar la caja OB nuevamente
Archivo APU adjunto	APU INST-OE19 CAJA OB-a5ff535eec2a4a27bb14ba3c13c2caff.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 8	
Código del ítem	SUM-OE09
Descripción de la actividad	ADQUISICION DE LICENCIA PARA INTEGRACION DE CÁMARA EN VMS, ASOCIADO A PLATAFORMA EXISTENTE SIES-D (MCC-CAM S0R-CAM).
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe reemplazar suministrar una licencia para la nueva camara LPR
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE09 LICENCIA CAMARA-d93aa0ab9ddf4c349841fc35ffccf6be.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 9	
Código del ítem	SUM-OE10
Descripción de la actividad	ADQUISICION DE LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA INTEGRACION DE CÁMARA EN VMS ASOCIADO A PLATAFORMA EXISTENTE SIES-D
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere de 1 licencia LPR para la camara nueva
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE10 LICENCIA LPR-7b35bec52ecd474c8465a2f9db20123f.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUERA_SERVICIO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de manteniemiemo:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Dado que la conectividad y la acometida fueron tomadas para el punto de la PTZ que va a reemplazar el punto LPR se requiere de la instalacion de la infraestructura en el punto nuevo

8. CONTROL DE APROBACIÓN
