

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Urrao
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	15/09/2026
Dirección del punto / sector	Betulia - Urrao, Urrao, Antioquia
Latitud	6.298128206895405
Longitud	-76.1314450662693
Coordenadas formulario	-76.13_6.3

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 2 Fovis pasa a ser PVV2 LPR Ingreso Betulia



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE

Tipo de anclaje:	ESTRUCTURA
Dirección de referencia del anclaje	Salida via Urrao Betulia
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO

 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

El punto sera trasladado a la entrada de Urrao, a la altura de la planata de

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

SI

Observaciones Caja Distribución Vertical:

Es necesario 1 caja de distribucion

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CANALIZACION_PROY,CAJA_50X50_PROY

CORONA ANTIESCALATORIA

Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
 BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	NO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO

Foto Cables




Requiere Cables:	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad Cable 2x8+8 AWG (ml):	50
Observaciones Cables:	Se requiere de acometida electrica para la nueva ubicacion de la camara LPR
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO

Foto Breaker



Requiere Breaker:	NO
💡 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor

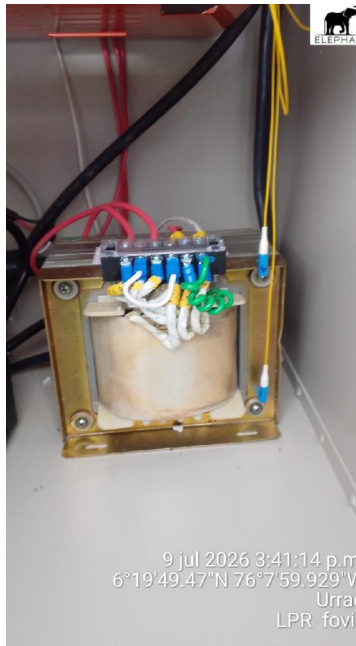

Requiere Transformador Reductor:

NO

 TUBERÍA

Existe Tubería:

NO

Requiere Tubería:

NO

 CORAZA

Existe Coraza:

SI

Estado Coraza:

BUENO

Foto Coraza



Requiere Coraza 3/4":

NO

 UPS

Existe UPS:

SI

Estado UPS:

BUENO

Foto UPS



9 jul 2026 3:38:44 p.m.
6°19'49.663"N 76°7'59.765"W
Urrao
LPR fovis

Requiere UPS:

NO

BATERÍAS UPS

Existen Baterías UPS:

NO

Requiere Baterías UPS:

NO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)


Existe SPT:

SI

Estado SPT:

BUENO

Foto SPT

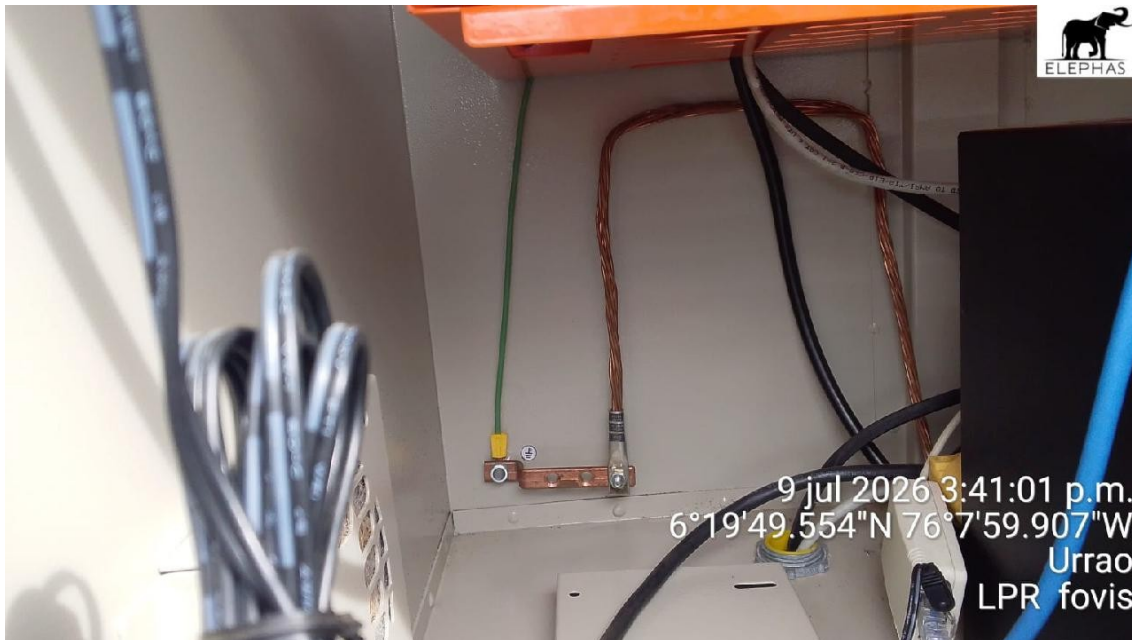

9 jul 2026 3:41:01 p.m.
6°19'49.554"N 76°7'59.907"W
Urrao
LPR fovis

Requiere SPT:

SI

Observaciones SPT:

Se debe de instalar 1nuevo sistema de puesta a tierra en la nueva ubicacion

PROTECCIÓN

Existe Protección:

NO

Requiere Protección:

SI

Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	El gabinete no cuenta con DPS
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	SI
Observaciones Fibra Óptica:	Se requiere de 350 metros de FO para conectar la nueva ubicacion del punto
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



9 jul 2026 3:40:53 p.m.
6°19'49.554"N 76°7'59.907"W
Urrao
LPR fovis

Requiere Inyector PoE:	NO
	⚡ PATCH CORD
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
	🔌 PATCH PANEL
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
	📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
	🔄 CONVERTIDOR MONOMODO
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
	📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
	🔌 SWITCH
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	LPR
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	SI
Tipo de Cámara requerida:	LPR
Cantidad de cámaras requeridas:	1
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
Observaciones Cámara:	Solicitan la instalacion de 1 nueva camara LPR, para cubrir la entrada y la

ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE08
Descripción de la actividad	Instalación gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe instlar nuevamente el gabinete con todos sus componentes
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-6df5e4a013704a4ebf927cc5cb688390.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	INST-OE14
Descripción de la actividad	INSTALACION PUNTO NUEVO DE CÁMARA FIJA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS – LPR
Unidad	UN
Cantidad	2
Justificación	Se deben instalar y configurar las 2 camaras LPR en el nuevo punto de instalacion
Archivo APU adjunto	APU INST-OE14 CAMARA LPR-8adad6b69a4f4038bd02fc26ce1ddd54.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	INST-OE15
Descripción de la actividad	INSTALACION DE LICENCIA PARA INTEGRACION DE CÁMARA EN VMS, ASOCIADO A PLATAFORMA EXISTENTE SIES-D, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTEGRACION, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, (MCC-CAM S0R-CAM).
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe de instalar 1 licencia para la camara adicional
Archivo APU adjunto	APU INST-OE15 LICENCIA CAMARAS-c43ca318c7034c6dab00a4b8a550ac5d.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 4	
Código del ítem	INST-OE16
Descripción de la actividad	INSTALACION DE LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS ALTA VELOCIDAD POR CÁMARA PARA VMS, ASOCIADO A PLATAFORMA EXISTENTE SIES-D, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTEGRACION, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (IF-LPR-H-CMM),
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe instalar 1 licencia de camara LPR para la camara adicional
Archivo APU adjunto	APU INST-OE16 LICENCIA LPR-42a91d14b0fa4f739daa6e878e55d5f6.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 5	
Código del ítem	INST-OE17
Descripción de la actividad	INSTALACION POSTES TIPO L PARA MONTAJE DE SISTEMAS LPR, INCLUYE, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO ESTRUCTURAL, CIMENTACIÓN, DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE,

	ACABADOS Y DEMAS ACTIVIDADES Y ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe instalar la estructura con su cimentacion en la nueva ubicacion
Archivo APU adjunto	APU INST-OE17 ESTRUCTURA EN L- ecc98ea7d65d441abd75c2da59f11b0f.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 6	
Código del ítem	INST-OE18
Descripción de la actividad	INSTALACIÓN DE CABLE CONCENTRICO 2X8 +8 AWG, INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LOS DEFINIDOS EN ANEXO TECNICO.
Unidad	ML
Cantidad	50
Justificación	Se debe instalar nuevamente la acometida
Archivo APU adjunto	APU INST-OE18 CONCENTRICO-6b3d500d27ce46a18a961150a68b314a.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 7	
Código del ítem	INST-OE19
Descripción de la actividad	INSTALACION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 4 SC/LC, IP 65, ENTRADA (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe fusionar e instalar nuevamente la caja OB
Archivo APU adjunto	APU INST-OE19 CAJA OB-5401c73d7e5641eebe843049888b3b16.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 8	
Código del ítem	SUM-OE09
Descripción de la actividad	ADQUISICION DE LICENCIA PARA INTEGRACION DE CÁMARA EN VMS, ASOCIADO A PLATAFORMA EXISTENTE SIES-D (MCC-CAM S0R-CAM).
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe adquirir 1 licencia para la camara adicional
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE09 LICENCIA CAMARA-7f644691181e4b13a311472c947398bb.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 9	
Código del ítem	SUM-OE10
Descripción de la actividad	ADQUISICION DE LICENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE PLACAS PARA INTEGRACION DE CÁMARA EN VMS ASOCIADO A PLATAFORMA EXISTENTE SIES-D
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe adquirir 1 licencia LPR para la camara adicional
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE10 LICENCIA LPR-fa1e8a4f6320465eb35d3c63f152b3b4.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se debe trasladar el punto a la ubicacion nueva

8. CONTROL DE APROBACIÓN
