

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Caicedo
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	30/07/2026
Vereda / sector	BELLA AGUADA
Dirección del punto / sector	Calle 6 5 1-1, Caicedo, Antioquia
Latitud	6.405764
Longitud	-75.982889
Coordenadas formulario	-75.98_6.41

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estación de policía 6.405764, -75.982889

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	POLICIA
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Se desconoce

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones	
	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
Observaciones UPS:	Se encuentra en buenas condiciones. Se realizaron pruebas de autonomía con el fin de validar el tiempo de respaldo energético ante una posible interrupción del suministro eléctrico. La UPS matuvo energizados los equipos sin complicaciones.
🔋 BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	SI
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	SI
Tipo de protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
🔌 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	REGULAR

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se recomienda la instalación de una unidad de distribución de energía (PDU) adicional en el rack, debido a que la PDU existente se encuentra ocupada al 100 % de su capacidad.
🔌 TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
📏 CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

📶 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF

Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

SI

Estado inyector PoE:

BUENO

Foto inyector PoE



¿Requiere inyector PoE?

NO

⚡ PATCH CORD

Existe patch cord:

NO

¿Requiere patch cord?

NO

🔌 PATCH PANEL

Existe patch panel:

SI

Estado patch panel:

BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?

NO

¿Requiere toma RJ45?

NO

📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado:

NO

¿Requiere organizador de cableado?

NO

🔄 CONVERTIDOR MONOMODO

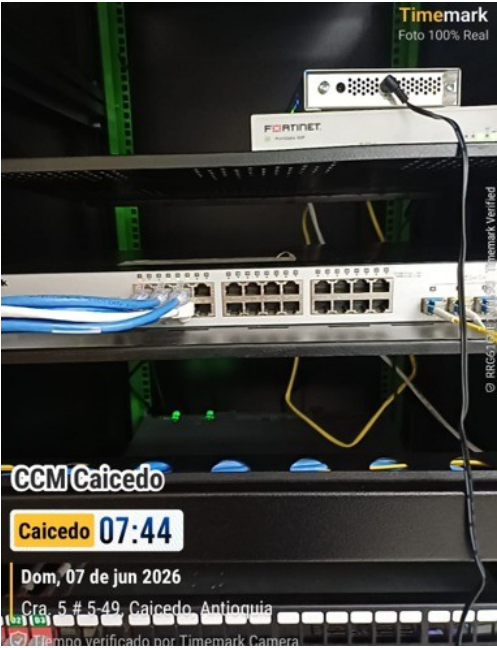
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
MÓDULO TRANSCCEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	NO
¿Requiere módulo óptico?	NO
SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO
Foto switch 	
¿Requiere switch?	NO
Observaciones switch:	Actualmente se cuenta con un switch de 24 puertos de los cuales tiene 19 disponibles
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO

Foto equipo A/C mini split



¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
Observaciones equipo A/C mini split:	Se recomienda realizar mantenimiento preventivo para garantizar su correcto funcionamiento, optimizar su eficiencia energética y prolongar su vida útil.
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVER NVR

Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?	NO
-------------------------	----

LICENCIAS

Existen licencias: NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR

Existe monitor: SI

Cantidad monitor existente (un): 2

Estado monitor: BUENO

Foto monitor



¿Requiere monitor? NO

☐ ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo: SI

Cantidad existente (un): 1

Estado estación de trabajo: BUENO

Foto estación de trabajo



¿Requiere estación de trabajo?	NO
Observaciones estación de trabajo:	conformado por el escritorio, monitores, CPU, se encuentra en buenas condiciones físicas y operativas, sin evidenciar novedades que afecten su funcionamiento
🎮 JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
🔌 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	NO
¿Requiere cable HDMI?	NO
💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
Foto luminarias	
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO

Foto puertas



VENTANAS

Existen ventanas: NO

CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso: NO

CERRAMIENTO

Existe cerramiento: NO

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	El CCM se encuentra en funcionamiento, se recomienda la instalación de los elementos de seguridad ante posibles sobretensiones, requiere de mantenimiento preventivo para garantizar la vida útil de todos los equipos.

9. CONTROL DE APROBACIÓN
