

Operador	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA
Contrato disponible	173_2026
Técnico responsable	Uriel Ospina
Cédula del técnico	93134724

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	El Bagre
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	25/08/2026
Dirección del punto / sector	El Bagre, Antioquia
Latitud	7.586755555555555
Longitud	-74.79916111111111
Coordenadas formulario	-74.8_7.59

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	7°35'35.41" -74°48'7.20"

Google Earth - Editar Marca de posición

Nombre: PCN 5 LOS COMODATO ARRIBA

Latitud: 7°35'12.32"N

Longitud: 74°47'56.98"O

Descripción Estilo, color Ver Altitud

Agregar vínculo Agregar imagen de la Web... Agregar imagen local...

Aceptar Cancelar

Fechas de imágenes: 5/25/2026 7°35'09.51" N 74°47'53.37" O elevación 87 m alt. ojo 1.28 km

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del anclaje	CAMARA #05 LOS COMODATOS ARRIBA
Propietario del poste	MUNICIPIO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:	NO
GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	BUENO



Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:	BUENO



Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:

CANALIZACION,CAJA_50X50

Estado Canalización:

REGULAR



Estado Tubería:

BUENO

Estado Caja 50x50:

BUENO



Requiere Infraestructura Subterránea:

NO

 CORONA ANTIESCALATORIA

Existe Corona Antiescalatoria:

SI

Existe Corona Antiescalatoria:

BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:

NO

 BRAZO DE SOPORTE

Existe Brazo de Soporte:

SI

Estado Brazo de Soporte:

BUENO



Requiere Brazo de Soporte:

NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:

SI

Estado Cables:

BUENO

Requiere Cables:

NO

⚡ TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:

SI

Estado Tablero Breaker:

BUENO

Foto Tablero Breaker



Existe Breaker:

SI

Estado Breaker:

BUENO

Requiere Breaker:	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO
Foto Transformador Reductor	
Requiere Transformador Reductor:	NO
TUBERÍA	
Existe Tubería:	SI
Estado Tubería:	BUENO
Requiere Tubería:	NO
CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	MALO
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	UPS en mal estado, se encuentra alarmada.
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO

Foto SPT



Requiere SPT:	NO
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_POTENCIA
Protección de potencia, video y datos en cámaras (un):	1
Observaciones Protección:	Se requiere protección IP para la cámara
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
✏ CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
🔑 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO

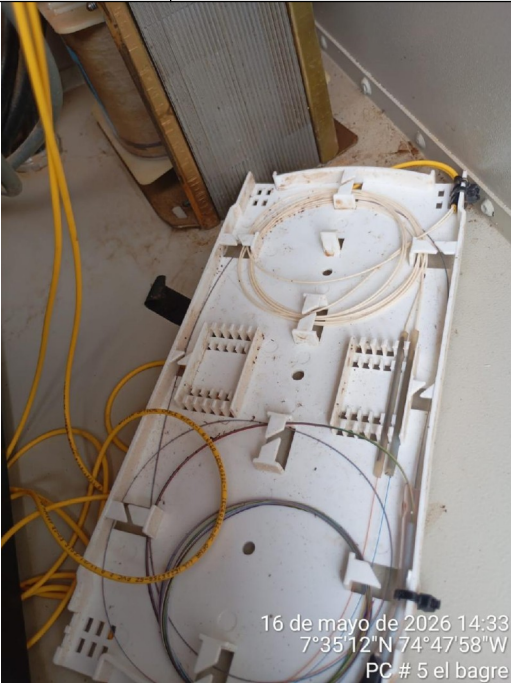


Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
🦋 MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO

SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO
 16 de mayo de 2026 14:31 7°35'12"N 74°47'57"W PC # 5 el bagre	
Requiere Switch:	NO
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO
 16 de mayo de 2026 14:29 7°35'12"N 74°47'57"W PC # 5 el bagre	
¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO

🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	ADQUISICION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 8 SC/LC, IP 65, ENTRADA 2 x (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalación de una Caja de Distribución Óptica (OB), con el fin de brindar mayor seguridad, organización y protección a los pigtails que realizan la conexión hacia el switch
	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de manteniemiiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se requiere realizar mantenimiento correctivo en el punto de cámara, que incluye la instalación de la protección IP, UPS y caja OB, además limpieza general de todos los componentes asociados al sistema, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa.

8. CONTROL DE APROBACIÓN
