


Operador	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA
Contrato disponible	173_2026
Técnico responsable	Uriel Ospina
Cédula del técnico	93134724

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	El Bagre
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	25/08/2026
Dirección del punto / sector	Carrera 37, El Bagre, Antioquia
Latitud	7.597702777777778
Longitud	-74.8020138888889
Coordenadas formulario	-74.8_7.6

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	7°35'51.73", -74°48'7.25"

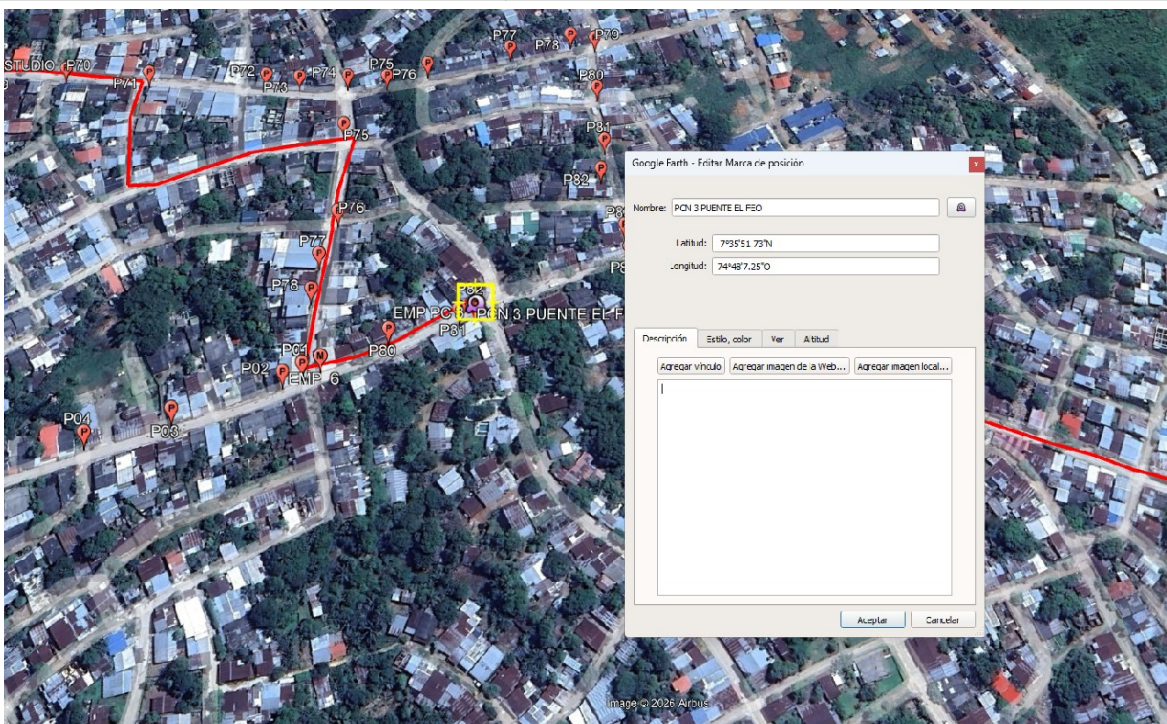

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del anclaje	CAMARA #03 PUENTE EL FEO
Propietario del poste	MUNICIPIO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:	NO
GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	BUENO



Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:	BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CANALIZACION

Estado Canalización:

REGULAR



Estado Tubería:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
Observaciones Infraestructura Subterránea:	La canalización se observa obstruida por construcción de piso en concreto.

CORONA ANTIESCALATORIA

Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO

BRAZO DE SOPORTE

Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO

TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:	SI
Estado Tablero Breaker:	BUENO

Foto Tablero Breaker



Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO

TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:	NO
----------------------------------	----

TUBERÍA

Existe Tubería:	SI
Estado Tubería:	BUENO
Requiere Tubería:	NO

CORAZA

Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔧 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	MALO
Foto UPS	
	
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	UPS en mal estado, se encuentra alarmada.
🔧 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	REGULAR
Requiere SPT:	NO
Observaciones SPT:	No es posible realizar verificación del SPT debido a que se encuentra
🔧 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_POTENCIA
Protección de potencia, video y datos en cámaras (un):	1
Observaciones Protección:	Se requiere protección IP para la cámara
🔧 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
🔧 CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO

INYECTOR POE

Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



26/04/2026 08:49:20
7.59767N 74.80198W

Requiere Inyector PoE:	NO
------------------------	----

⚡ PATCH CORD

Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO

🔌 PATCH PANEL

Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO

📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO

🔄 CONVERTIDOR MONOMODO

Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO

📡 MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO

Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO

🔌 SWITCH

Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



26/04/2026 08:47:56
7.59768N 74.80209W

Requiere Switch:	NO
	CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



26/04/2026 8:27:31
785000000001N 74.80191166666667W
48-16 Carrera 41
El Bagre
Antioquia

¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
	ENRUTADOR VPN
Existe Enrutador VPN:	NO
	EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	ADQUISICION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 8 SC/LC, IP 65, ENTRADA 2 x (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalación de una Caja de Distribución Óptica (OB), con el fin de brindar mayor seguridad, organización y protección a los pigtails que realizan la conexión hacia el switch
	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se requiere realizar mantenimiento correctivo en el punto de cámara, que incluye la instalación de la protección IP, UPS y caja OB, además limpieza general de todos los componentes asociados al sistema, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa.

8. CONTROL DE APROBACIÓN
