

Operador	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA
Contrato disponible	173_2026
Técnico responsable	Juan Pablo Serna Hernandez
Cédula del técnico	1037627002


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Nechí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	24/08/2026
Vereda / sector	SANTA MARIA
Dirección del punto / sector	052420, Nechí, Antioquia
Latitud	8.095428962858549
Longitud	-74.77349379390407
Coordenadas formulario	-74.77_8.1

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de policia

Evidencia ubicación CCM

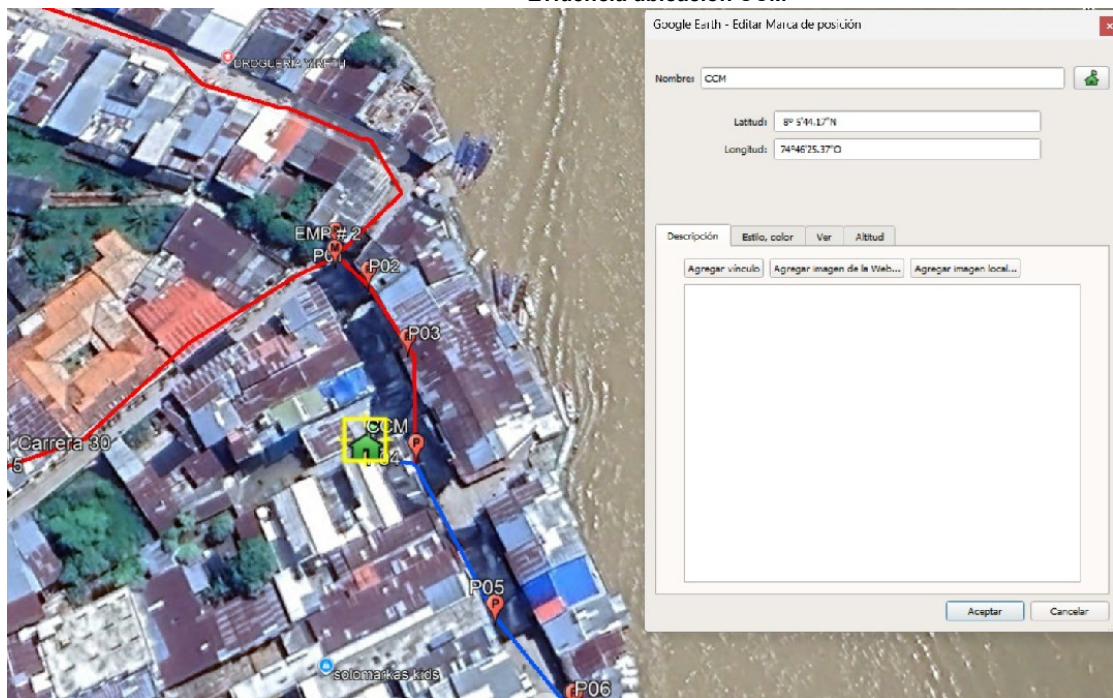

¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	POLICIA
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación De Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
¿Personal de T.I. en sitio?	SI

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones	
 17/05/2026 13:33:41 8.09550N 74.77378W NODO NECHI	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Existe breaker:	SI
Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	SI
Estado tubería:	BUENO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



18/05/2026 11:06:05
8.09551N 74.77377W
NODO NECHI

¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	SI
Estado protección:	BUENO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO
¿Requiere PDU multitoma?	NO
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANAleta PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	SI
Estado canaleta plástica:	BUENO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO


▼ ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO
Foto ODF	
	
¿Requiere ODF?	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
▼ PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel




¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO

Foto organizador de cableado

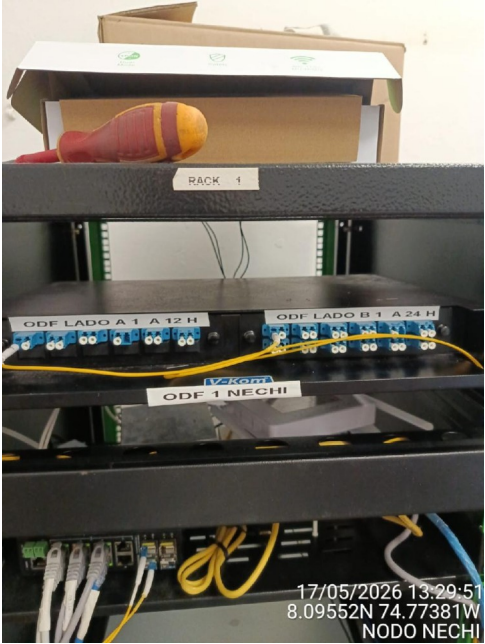

¿Requiere organizador de cableado?	NO
📁 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
📁 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO

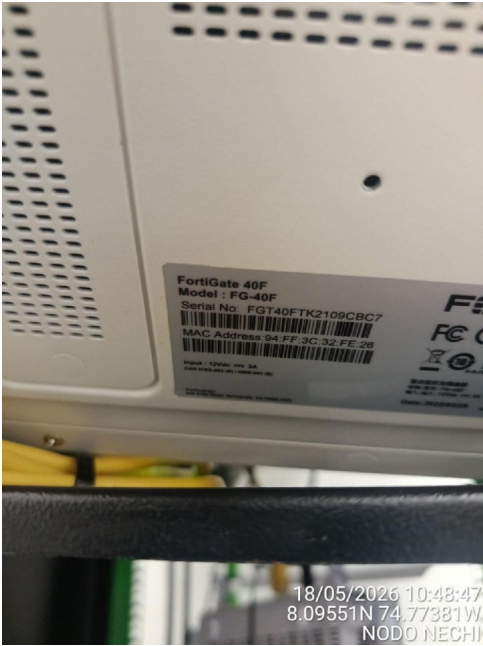SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO
Foto switch	
	
¿Requiere switch?	NO
DISCO DURO	
Existe disco duro:	SI
Estado disco duro:	BUENO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO
Foto firewall	
	
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	

Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO
Foto equipo A/C mini split 	
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	SI
Estado electroimán 600 lb:	BUENO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?

NO

 LICENCIAS

Existen licencias:

SI

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR

Existe monitor:

SI


Cantidad monitor existente (un):

1

Estado monitor:

BUENO

Foto monitor

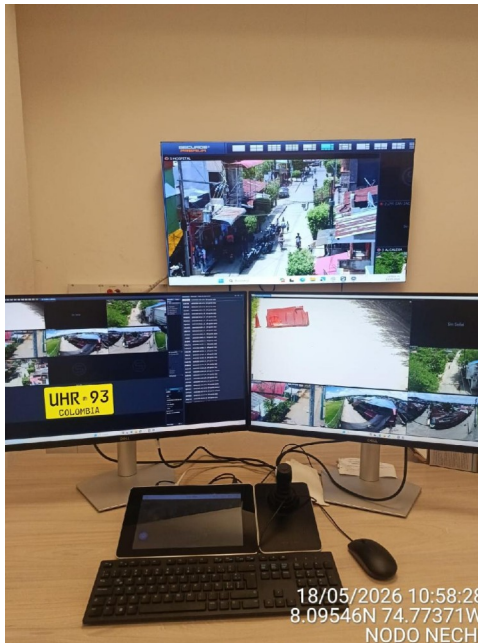

¿Requiere monitor?

NO

 ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:

SI

Cantidad existente (un):

1

Estado estación de trabajo:	BUENO
Foto estación de trabajo	
	
¿Requiere estación de trabajo?	NO
Observaciones estación de trabajo:	Estación de trabajo con dos monitores
🎮 JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO
¿Requiere configuración?	NO
🔌 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	3
Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO
💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO
🪟 VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
🔑 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
🚧 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	Mantenimiento de unidad manejadora (evaporadora) de 24000 btu tipo cassette
Unidad	UN

Cantidad	1
Justificación	Realizar inspección y mantenimiento preventivo del equipo, verificando su estado general, funcionamiento, limpieza y posibles fallas, y efectuar las reparaciones necesarias según el diagnóstico técnico.
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	En el Centro de Control y Monitoreo (CCM) se requiere realizar mantenimiento y diagnóstico del sistema de aire acondicionado, adicionales actividades de instalación cámara interna con visualización al rack de telecomunicaciones.

9. CONTROL DE APROBACIÓN
