

Operador	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA
Contrato disponible	173_2026
Técnico responsable	Juan Pablo Serna Hernandez
Cédula del técnico	1037627002

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Nechí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	25/08/2026
Vereda / sector	CAÑO PESCADO
Dirección del punto / sector	Silgado Coneo Edwin Antonio
Latitud	8.09916329707
Longitud	-74.7803897534
Coordenadas formulario	-74.78_8.1

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	8° 5'56.99" -74°46'49.40"



17 de mayo de 2026 11:20
8.0992N 74.78038W
Nechí

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_META
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del anclaje	LPR SAN JACINTO
Propietario del poste	MUNICIPIO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



17 de mayo de 2026 11:20
8.0992N 74.78038W
Nechí

Requiere Cambio de anclaje:

NO


 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO

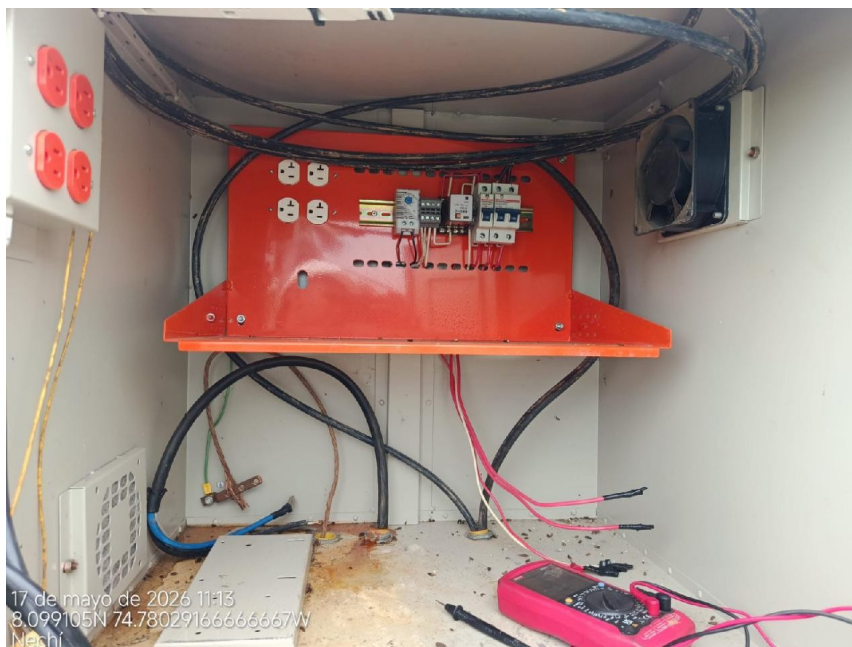

17 de mayo de 2026 11:13
8.099105N 74.78029166666667W
Nechí

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

Gabinete se encuentra en buen estado.

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Tubería:	BUENO
Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
Observaciones Infraestructura Subterránea:	CAJA INSPECCION OBSTRUIDA CON TIERRA
 CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Estado Corona Antiescalatoria:	BUENO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
Observaciones Corona:	Corona Se Encuentra En Buen Estado
 BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	NO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

 ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
 TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	SI
Estado Tablero Breaker:	BUENO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	SI
Observaciones Transformador:	Se requiere de transformador ya que no cuenta con uno.
 TUBERÍA	
Existe Tubería:	SI
Estado Tubería:	BUENO
Requiere Tubería:	NO
 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
 UPS	
Existe UPS:	NO
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	El punto de cámara se encuentra sin UPS
 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	REGULAR
Requiere SPT:	NO
Observaciones SPT:	No es posible realizar la validación del SPT, debido a que la caja se encuentra
 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO

Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_POTENCIA
Protección de potencia, video y datos en cámaras (un):	1
Observaciones Protección:	Se requiere protección IP para la cámara.
⚡ TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
🔧 CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
🔧 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	SI
Observaciones Patch Cord:	No cuenta con patch Cord
⚡ PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO

🔌 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	SI
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	SI
Tipo de Switch requerido:	SW_8P
Cantidad Switch (un):	1
Observaciones Switch:	Punto no cuenta con Switch
📷 CÁMARA	
Existe Cámara:	NO
¿Requiere Cámara?	SI
Tipo de Cámara requerida:	LPR
Cantidad de cámaras requeridas:	1
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	ADQUISICION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 8 SC/LC, IP 65, ENTRADA 2 x (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalación de una Caja de Distribución Óptica (OB), con el fin de brindar mayor seguridad, organización y protección a los pigtails que realizan la conexión hacia el switch.
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de manteniimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se requiere realizar instalacion de equipos en el punto de cámara, que incluye la instalación de la protección IP, UPS y caja OB, Switch, camara, además limpieza general de todos los componentes asociados al sistema, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa.

8. CONTROL DE APROBACIÓN
