


Operador	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA
Contrato disponible	173_2026
Técnico responsable	Uriel Ospina
Cédula del técnico	93134724

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Zaragoza
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	24/08/2026
Vereda / sector	BUENOS AIRES
Dirección del punto / sector	Calle 63 44B 2-100, El Bagre, Antioquia
Latitud	7.607341666666667
Longitud	-74.80735555555556
Coordenadas formulario	-74.81_7.61

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	7°36'26.43"N, 74°48'26.48"O

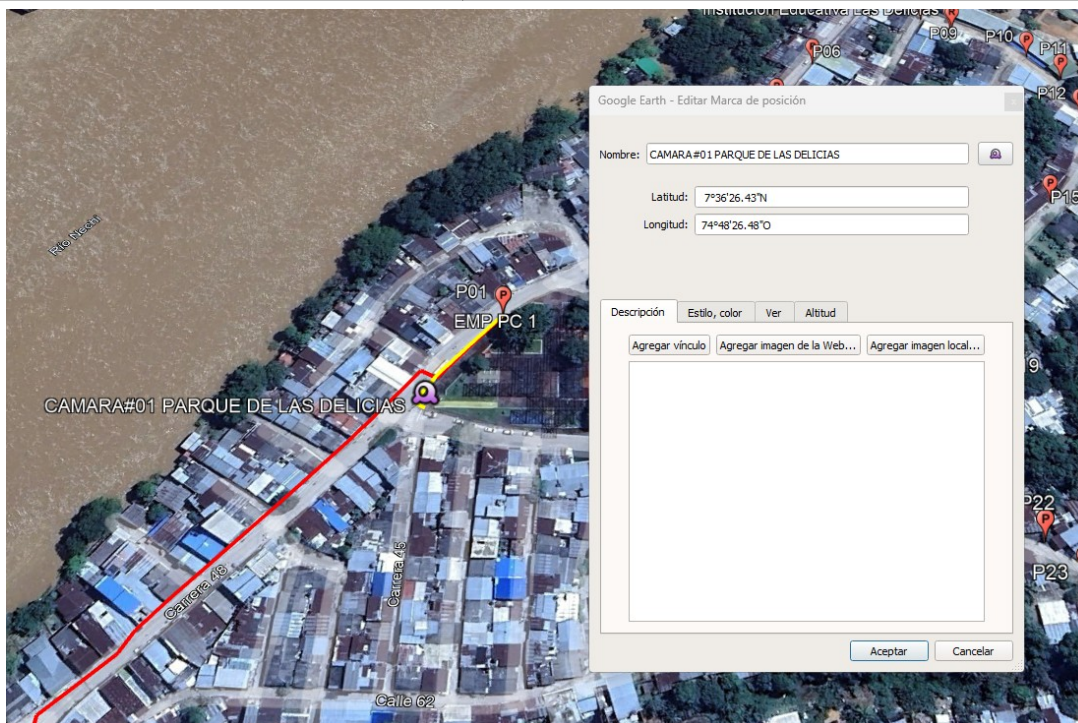

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del anclaje	CAMARA #01 PARQUE DE LAS DELICIAS
Propietario del poste	MUNICIPIO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO


 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO

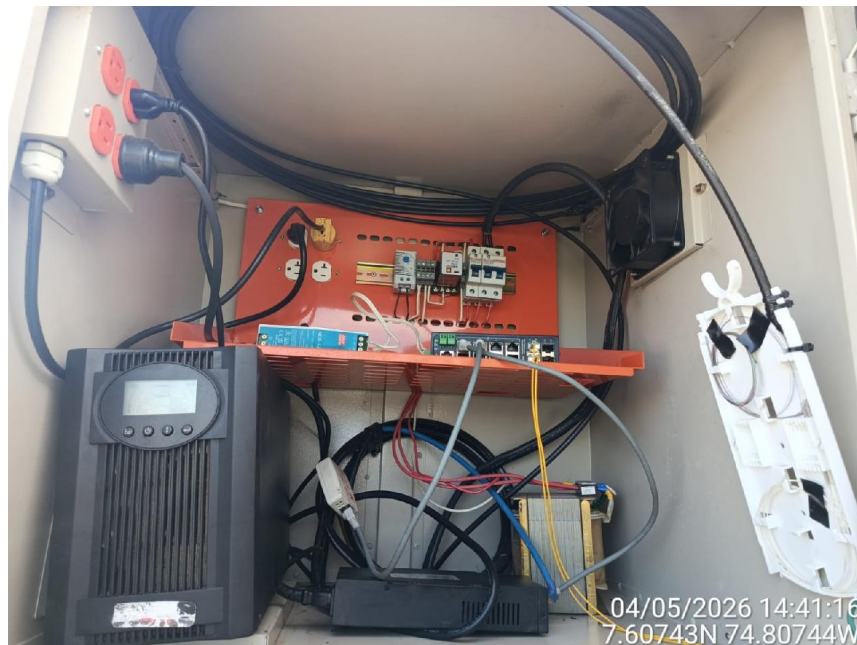

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:

CANALIZACION

Estado Canalización:	BUENO
Estado Tubería:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
🛡️ CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
🔧 BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	SI
Estado Tablero Breaker:	BUENO

Foto Tablero Breaker



Existe Breaker:

SI

Estado Breaker:

BUENO

Foto Breaker



Requiere Breaker:

NO

TRANSFORMADOR REDUCTOR


Existe Transformador Reductor:

SI

Estado Transformador Reductor:

BUENO

Foto Transformador Reductor

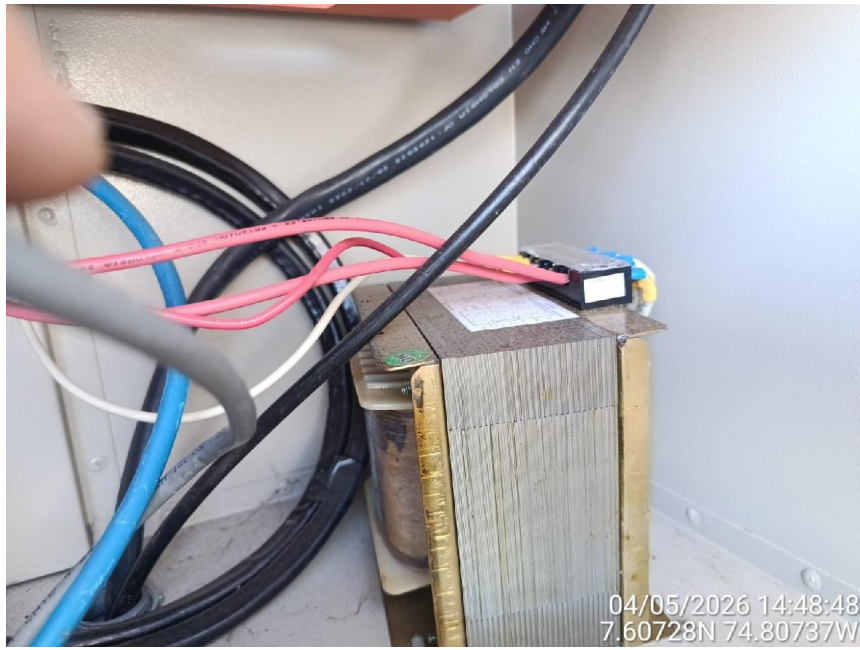

Requiere Transformador Reductor:	NO
✂ TUBERÍA	
Existe Tubería:	SI
Estado Tubería:	BUENO
Requiere Tubería:	NO
💧 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	MALO

Foto UPS



Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	UPS en mal estado, se encuentra alarmada.
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	REGULAR
Requiere SPT:	NO
Observaciones SPT:	No es posible realizar la validación del SPT, la caja se encuentra soldada.
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_POTENCIA
Protección de potencia, video y datos en cámaras (un):	1
Observaciones Protección:	Se requiere protección IP para la cámara.
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO

🔌 INYECTOR POE

Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



04/05/2026 14:48:24
7.60720N 74.80736W

Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	

Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO

🔌 PATCH PANEL

Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO

📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO

🔄 CONVERTIDOR MONOMODO

Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO

📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO

Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO

🔌 SWITCH

Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
	ENRUTADOR VPN
Existe Enrutador VPN:	NO
	EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

✂ ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	ADQUISICION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 8 SC/LC, IP 65, ENTRADA 2 x (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalación de una Caja de Distribución Óptica (OB), con el fin de brindar mayor seguridad, organización y protección a los pigtails que realizan la conexión hacia el switch.
	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se requiere realizar mantenimiento correctivo en el punto de cámara, que incluye la instalación de la protección IP, el reemplazo de la UPS defectuosa, la instalación de la caja OB y la limpieza general de todos los componentes asociados al sistema, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa.

8. CONTROL DE APROBACIÓN
