


Operador	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA
Contrato disponible	173_2026
Técnico responsable	Uriel Ospina
Cédula del técnico	93134724

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Zaragoza
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	24/08/2026
Vereda / sector	BUENOS AIRES
Dirección del punto / sector	Zapata Suarez Carlos Mario
Latitud	7.60505
Longitud	-74.80913333333334
Coordenadas formulario	-74.81_7.61

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	7°36'18.18" -74°48'32.88"

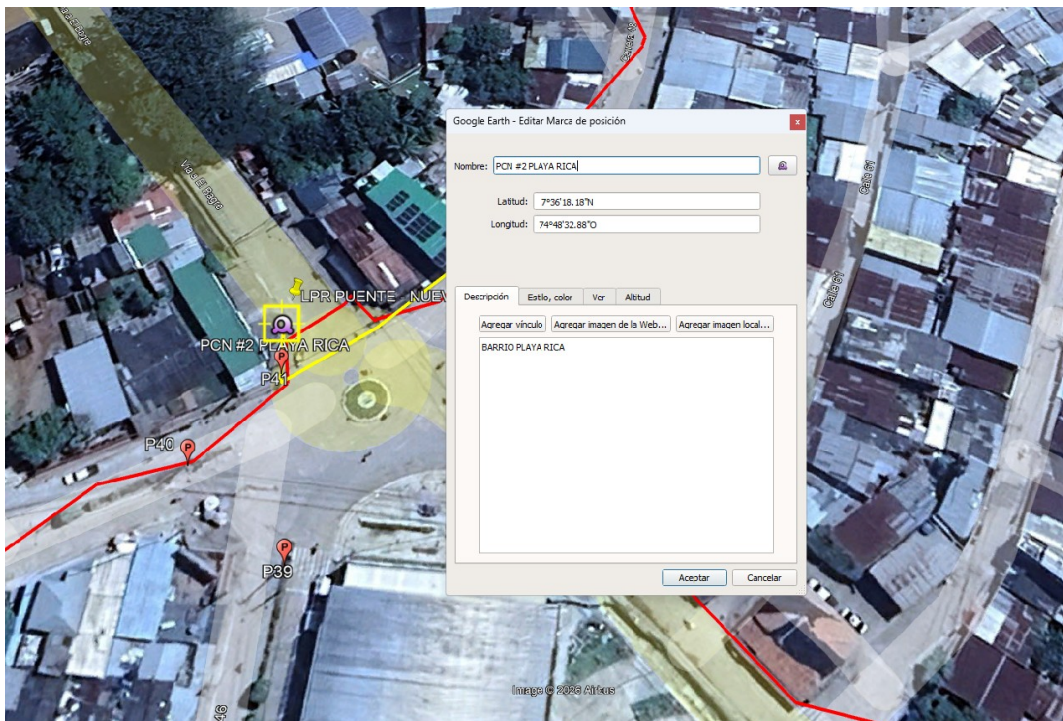

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del anclaje	CAMARA #02 PLAYA RICA
Propietario del poste	MUNICIPIO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



4/05/2026 7:34:49
7.60517500000001N 74.80914W
6010 Carrera 48
El Bagre
Antioquia

Requiere Cambio de anclaje:

NO


 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO

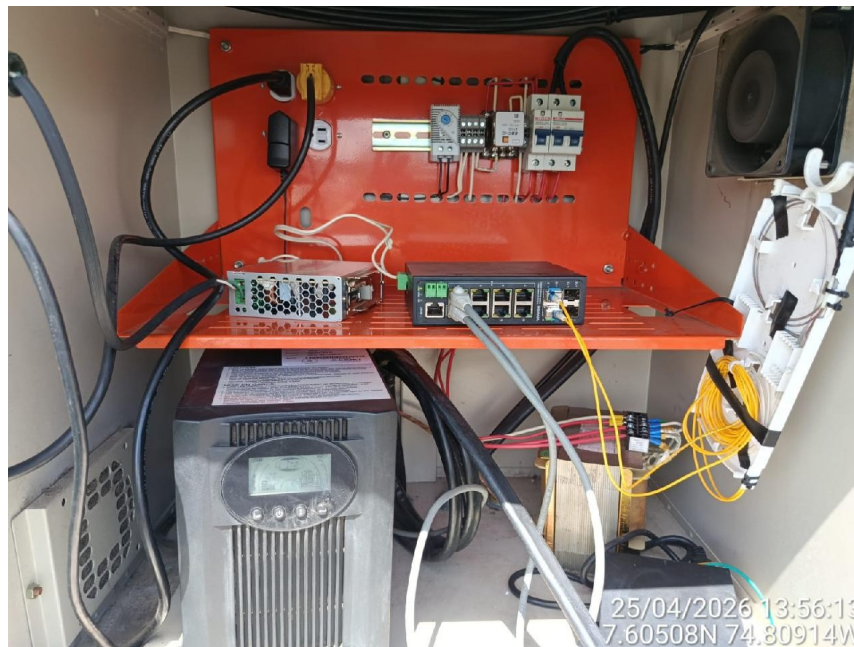

25/04/2026 13:56:13
7.60508N 74.80914W

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO



Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CANALIZACION
Estado Canalización:	BUENO
Estado Tubería:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	SI
Estado Tablero Breaker:	BUENO

Foto Tablero Breaker




Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO

TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor

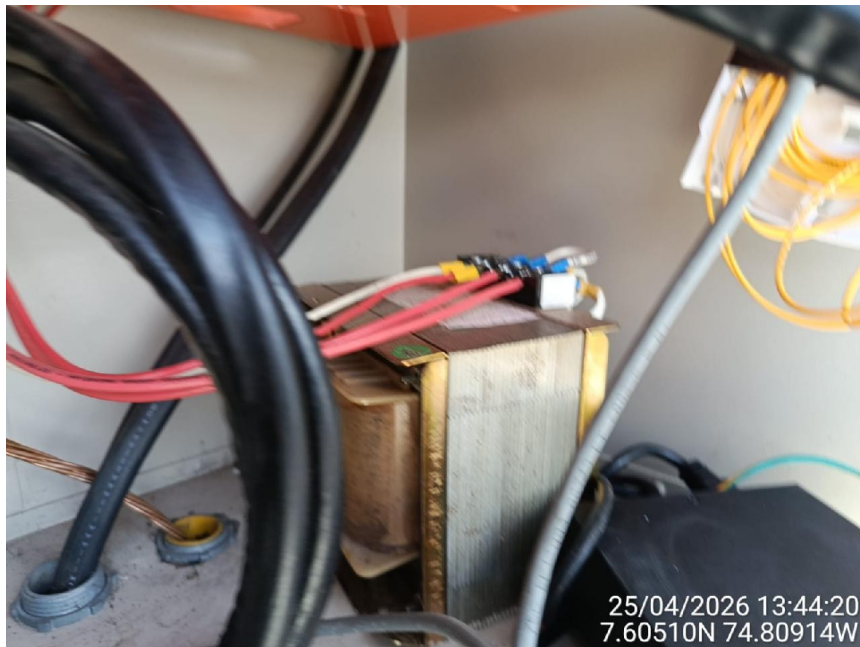

Requiere Transformador Reductor:	NO
----------------------------------	----

TUBERÍA

Existe Tubería:	SI
Estado Tubería:	BUENO
Requiere Tubería:	NO

CORAZA

Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔧 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	MALO
Foto UPS	
	
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	UPS en mal estado, se encuentra alarmada.
🔧 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	REGULAR
Requiere SPT:	NO
Observaciones SPT:	No es posible realizar la validación del SPT, la caja se encuentra soldada.
🔧 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_POTENCIA
Protección de potencia, video y datos en cámaras (un):	1
Observaciones Protección:	Se requiere protección IP para la cámara.
🔧 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



25/04/2026 13:44:05
7.60510N 74.80916W

Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
⚡ PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO




Requiere Switch:	NO
	CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
	ENRUTADOR VPN
Existe Enrutador VPN:	NO
	EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

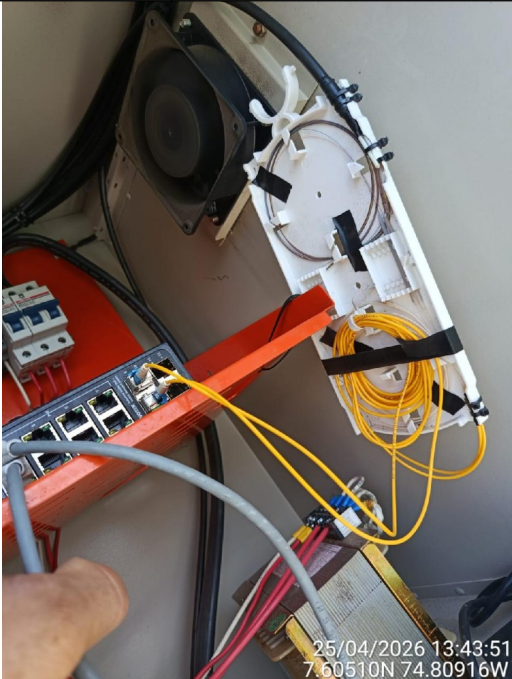ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	ADQUISICION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 8 SC/LC, IP 65, ENTRADA 2 x (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalación de una Caja de Distribución Óptica (OB), con el fin de brindar mayor seguridad, organización y protección a los pigtails que realizan la conexión hacia el switch.
	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se requiere realizar mantenimiento correctivo en el punto de cámara, que incluye la instalación de la protección IP, el reemplazo de la UPS defectuosa, la instalación de la caja OB y la limpieza general de todos los componentes asociados al sistema, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa.

8. CONTROL DE APROBACIÓN
