

Operador	CI2 S.A
Contrato disponible	167_2026
Técnico responsable	Richard Castellar Jimenez
Cédula del técnico	8174082

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Arboletes
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	24/09/2026
Dirección del punto / sector	Zapata Hernandez Lina Marcela
Latitud	8.84962497355673
Longitud	-76.4257462016243
Coordenadas formulario	-76.43_8.85

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	Calle principal, vía a montería, antes del puente, en el sector la Ye (Y)



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Tigo
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Calle principal, via a montería, antes del puente, en el sector la Ye (Y)
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
 4/08/2026, 4:23:58 p.m. +8.849626,-76.425682 Arboletes, Antioquia PTZ SECTOR LA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
 GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		BUENO
 4 ago 2026 4:39:45 p.m. 8.8496N-76.4257W # 25-99 Carrera 10 Arboletes Antioquia Altitud: 10.2msnm Velocidad: 0.3km/h Mantenimiento CCTV-Arboletes PTZ SECTOR LA Y C12		
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		NO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		
Existe Infraestructura Subterránea:		NO
Requiere Infraestructura Subterránea:		NO

Observaciones Infraestructura Subterránea:	No se observa infraestructura subterránea
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO



Requiere Brazo de Soporte:	NO
----------------------------	----

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
---------------------	--

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Foto Cables	
 4 ago 2026 4:38:07 p.m. 8.8497N 76.4257W # 29A-86 Calle 26 Arboletes Antioquia Altitud:14.9msnm Velocidad:0.3km/h Mantenimiento CCTV Arboletes PTZ SECTOR LA Y Cj2	
Requiere Cables:	NO
Observaciones Cables:	La acometida se toma del poste auxiliar, entra al gabinete via aerea a través
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Foto Breaker	
 4 ago 2026 4:37:00 p.m. 8.8496N 76.4257W # 25-99 Carrera 30 Arboletes Antioquia Altitud:11.5msnm Velocidad:0.5km/h Mantenimiento CCTV Arboletes PTZ SECTOR LA Y Cj2	
Requiere Breaker:	NO
⚡ TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:	NO
	TUBERÍA
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
	CORAZA
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO

Foto Coraza



Requiere Coraza 3/4":	NO
	UPS
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	REGULAR

Foto UPS



4 ago 2026 4:45:02 p.m.
8.8496N 76.4257W
29A-36 Calle 26
Arboletes
Antioquia
Altitud:13.6msnm
Velocidad:0.4km/h
Mantenimiento CCTV Arboletes
PTZ SECTOR LA Y
CJ2

Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	La UPS existente no tiene autonomía, al irse la energía , se apaga.
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	SI
Estado Baterías UPS:	MALO


Foto Baterías UPS



4 ago 2026 4:45:00 p.m.
8.8496N 76.4257W
29A-36 Calle 26
Arboletes
Antioquia
Altitud:15.2msnm
Velocidad:1.0km/h
Mantenimiento CCTV Arboletes
PTZ SECTOR LA Y
CJ2

Requiere Baterías UPS:	SI
Tipo de Baterías UPS requeridas:	UPS_1_5
Observaciones Baterías UPS:	Se requiere baterías, si se opta por el cambio de baterías.
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO

Foto SPT

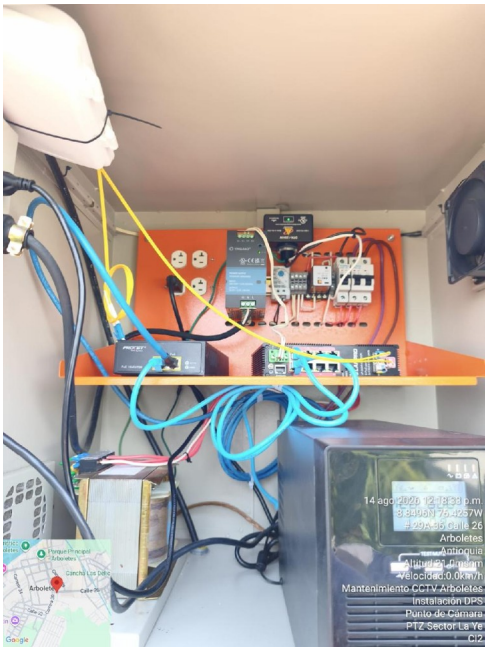

Requiere SPT:	NO
Observaciones SPT:	Al pie del anclaje, no se observa caja de registro del SPT, pero se puede
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	Al momento de hacer el diagnostico no se visualizó protección DPS, se
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
	
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO



Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO



Requiere Módulo Óptico:	NO
	 SWITCH
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	En el momento del diagnostico, no se observó protección DPS, se requiere el suministro y la instalación del DPS

8. CONTROL DE APROBACIÓN
