



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	CI2 S.A
Contrato disponible	167_2026
Técnico responsable	Richard Castellar Jimenez
Cédula del técnico	8174082

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO


Municipio	Arboletes
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	24/09/2026
Vereda / sector	EL GUAIMARO
Dirección del punto / sector	Calle 26, Arboletes, Antioquia
Latitud	8.852208297667946
Longitud	-76.4198417515337
Coordenadas formulario	-76.42_8.85

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	En la ferreteria PVC Construcciones, al lado de la torre de comunicacion



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Tigo
¿Requiere actualización de conexión?	NO

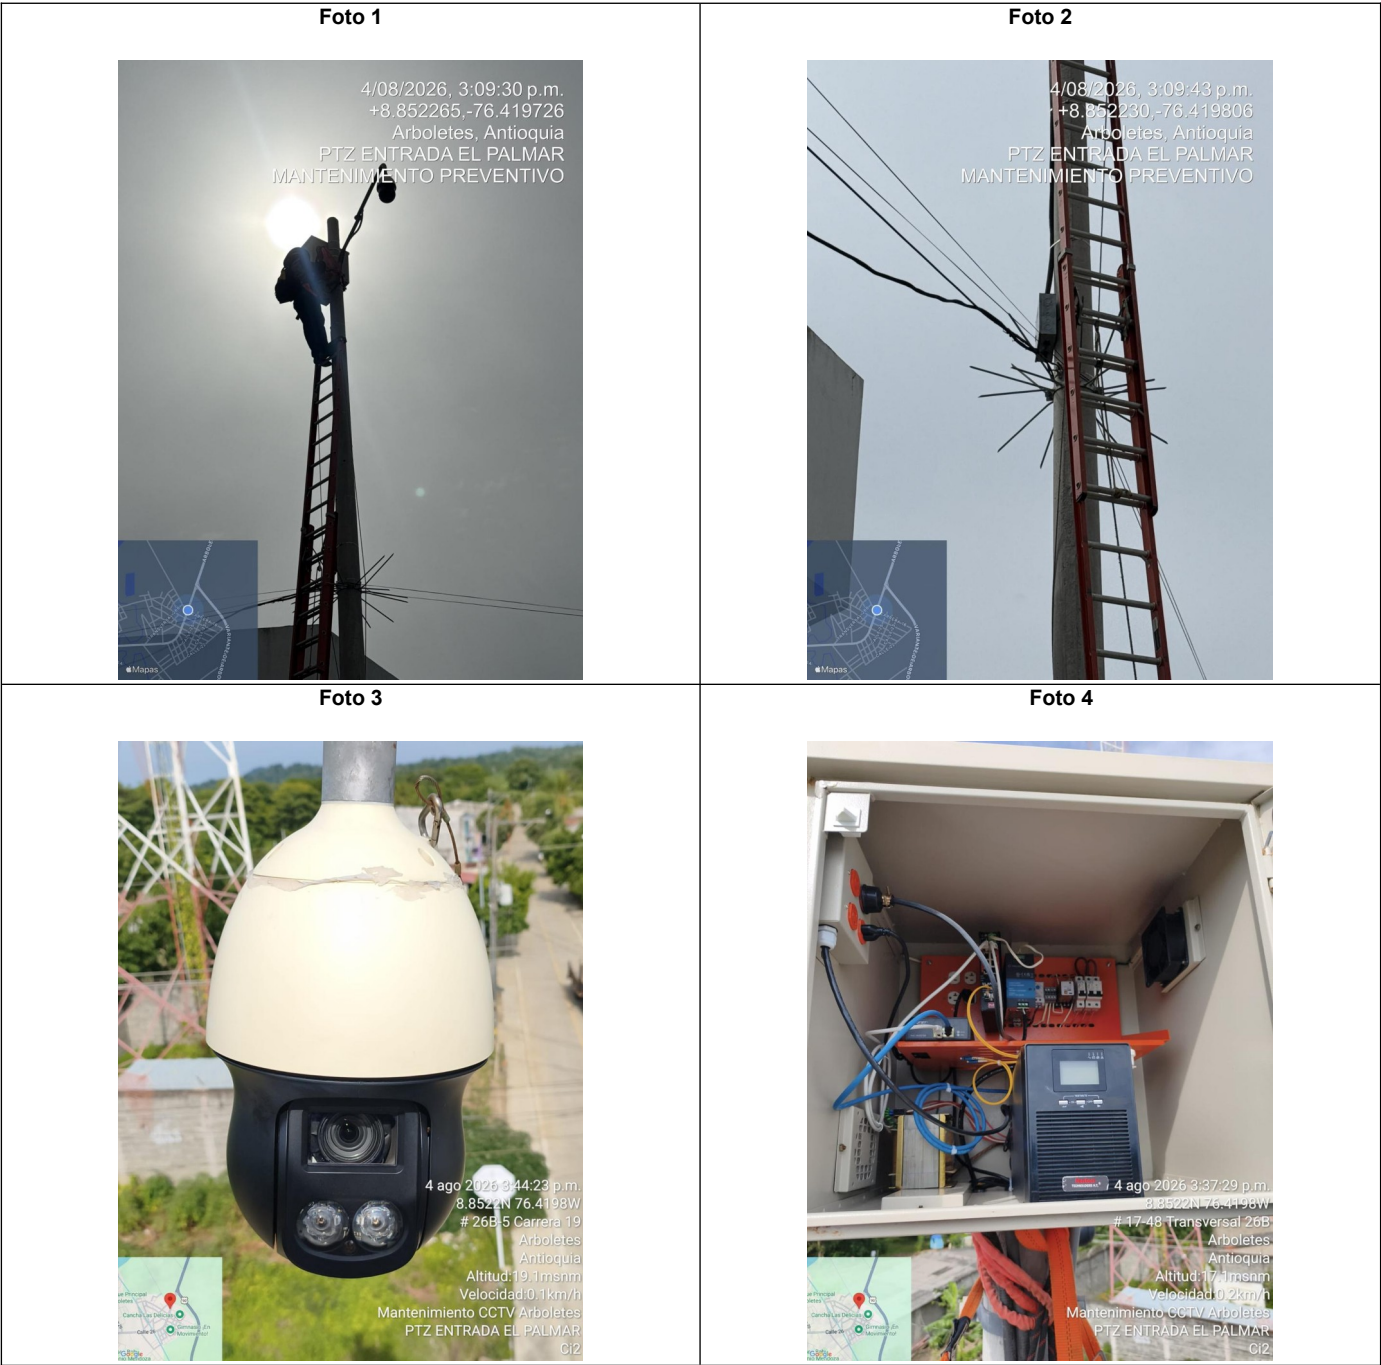

3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Dirección de referencia del anclaje	Calle principal, salida para montería, al frente de la torre de comunicaciones
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



4/08/2026, 3:09:11 p.m.
+8.852323,-76.419768
Arboletes, Antioquia
PTZ ENTRADA EL PALMAR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Requiere Cambio de anclaje:

NO

 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



4 ago 2026 3:10:18 p.m.
8.8523N 76.4198W
26AA-25 Carrera 18
Arboletes
Antioquia
Altitud:26.7msnm
Velocidad:0.0km/h
Mantenimiento CCTV Arboletes
PTZ ENTRADA EL PALMAR
CI2

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

NO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

NO

Requiere Infraestructura Subterránea:

NO

Observaciones Infraestructura Subterránea:

Se observa la trena o acometida eléctrica y la Instalación de fibra óptica via


CORONA ANTIESCALATORIA

Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	

Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO

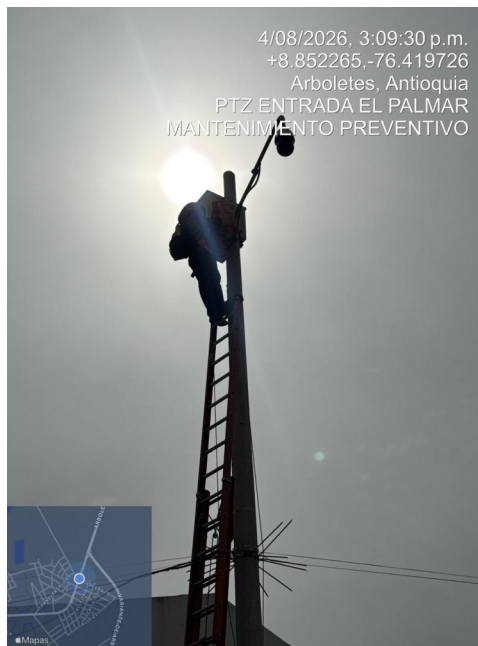

Requiere Brazo de Soporte:	NO
----------------------------	----

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	SI
-----------------	----

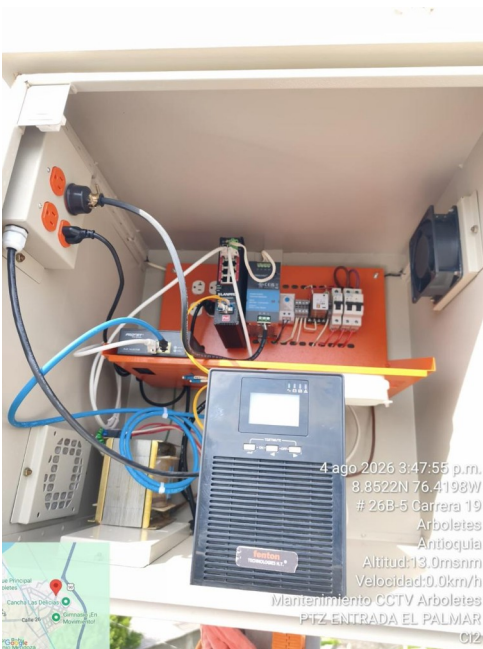
Estado Cables:	BUENO
Foto Cables	
 4/08/2026, 3:09:43 p.m. +8.852230,-76.419806 Arboletes, Antioquia PTZ ENTRADA EL PALMAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Foto Breaker	
 4 ago 2026 3:47:55 p.m. 8.8522N 76.4198W # 26B-5 Carrera 19 Arboletes Antioquia Altitud:13.0msnm Velocidad:0.0km/h Mantenimiento CCTV Arboletes PTZ ENTRADA EL PALMAR C/2	
Requiere Breaker:	NO
⚡ TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:

NO

TUBERÍA

Existe Tubería:

NO

Requiere Tubería:

NO

CORAZA

Existe Coraza:

SI

Estado Coraza:

BUENO

Foto Coraza



Requiere Coraza 3/4":

NO

Observaciones Coraza:

Se observan dos corazas que entran al gabinete, asegurada con suncho.

UPS


Existe UPS:

SI

Estado UPS:


REGULAR

Foto UPS

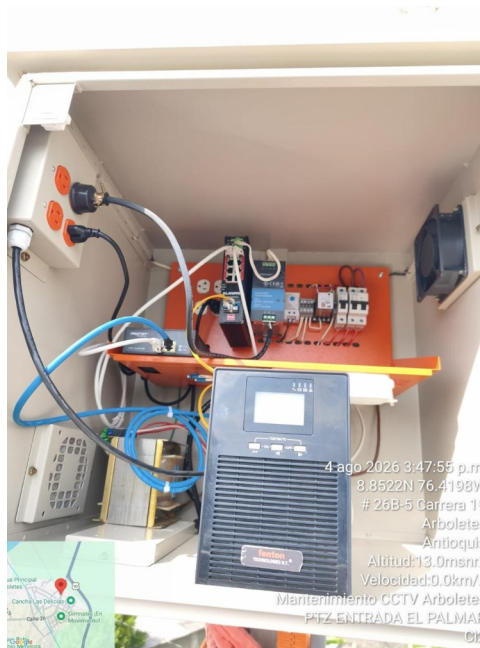

Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	La UPS existente no tiene autonomía, al irse la energía pública se apaga.
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	SI
Estado Baterías UPS:	MALO

Foto Baterías UPS

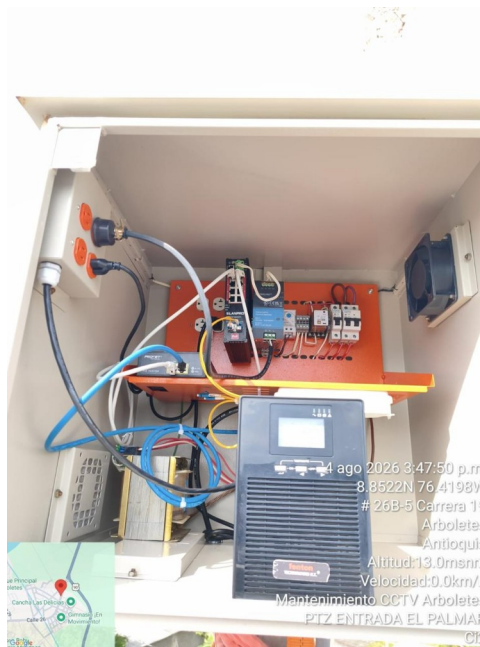

Requiere Baterías UPS:	SI
Tipo de Baterías UPS requeridas:	UPS_1_5
Observaciones Baterías UPS:	Requiere batería si se opta por el cambio de las baterías.
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO

Foto SPT



Requiere SPT:	NO
Observaciones SPT:	El SPT sube en tubería por el poste auxiliar, llega al poste de la PTZ via aérea
🔵 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
🟡 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
----------------------	----

✎ CANALETA PLÁSTICA

Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



Requiere Fibra Óptica:	NO
------------------------	----

🔗 INYECTOR POE

Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO

⚡ PATCH CORD

Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO



Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO



Requiere Módulo Óptico:	NO
	 SWITCH
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	El SPT que aterriza el gabinete, los equipos y pa PTZ, ubicada en el sector ENTRADA AL PALMAR, se instaló en el poste auxiliar, llega al poste de dicha PTZ vía aérea y entra al gabinete a través de coraza. Se requiere instalar protección DPS.

8. CONTROL DE APROBACIÓN
