

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
--	---	---

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Titiribí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	16/09/2026
Dirección del punto / sector	Carrera 20, Titiribí, Antioquia
Latitud	6.063707387778474
Longitud	-75.79356657939046
Coordenadas formulario	-75.79_6.06

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de Policia

Evidencia ubicación CCM



4 jul 2026 1:00:55 p.m.
6.0634763N 75.7935916W
20-28 Carrera 20
Titiribí
Titiribí
Antioquia
CCM

¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Comandante de Estación
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1

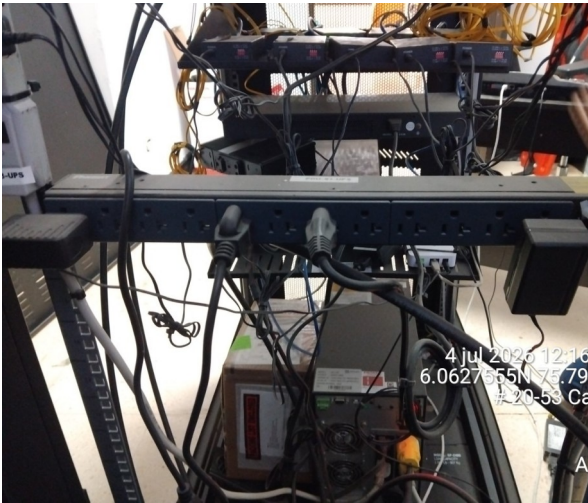


Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones	
 4 jul 2026 12:32:58 p.m. 6.0636815N 75.7936651W 20-42 Carrera 20 Titiribi Titiribí Antioquia CCM	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	SI
Tipo de cable requerido:	UTP_6
Cantidad cable UTP Cat. 6 (ml):	30
Observaciones cables:	para conectar la estacion de trabajo
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO

Foto tablero breaker




Existe breaker:	SI
Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma

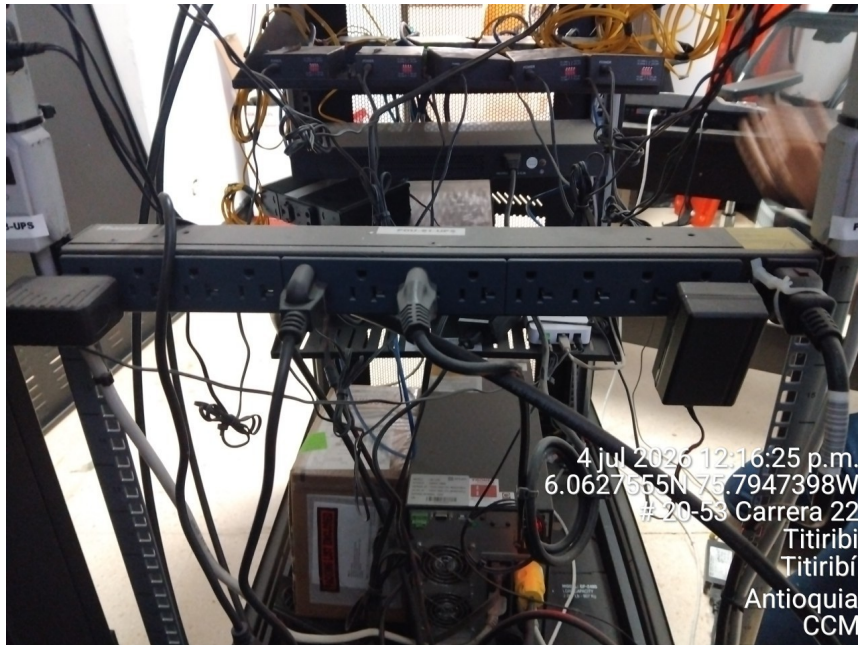

¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se requiere de 3 PDU para el nuevo rack nuevo
🔌 TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
¿Requiere toma 125 V?	NO
🔌 CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

📶 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
🔌 ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?	NO
🔌 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	SI
Estado inyector PoE:	BUENO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	NO
¿Requiere patch panel?	NO

¿Requiere toma RJ45?	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO
Foto organizador de cableado  4 jul 2026 12:58:00 p.m. 6.0636793N 75.7936804W 20-42 Carrera 20 Titiribi Titiribi Antioquia CCM	
¿Requiere organizador de cableado?	SI
Cantidad organizador de cableado (un):	4
Observaciones organizador de cableado:	se requieren organizadores para el nuevo rack
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	SI
Estado convertidor monomodo:	BUENO
Foto convertidor monomodo  4 jul 2026 11:55:09 a.m. 6.0638106N 75.7937298W 20-42 Carrera 20 Titiribi Titiribi Antioquia CCM	
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCIEIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	SI

Estado módulo óptico:		BUENO
Foto módulo óptico		
		
¿Requiere módulo óptico?		NO
SWITCH		
Existe switch:		SI
Estado switch:		BUENO
Foto switch		
		
¿Requiere switch?		NO
DISCO DURO		
Existe disco duro:		NO
¿Requiere disco duro?		NO
FIREWALL		
Existe firewall:		NO
¿Requiere instalación de firewall?		NO
ENRUTADOR VPN		

Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO

Foto enrutador VPN



4 jul 2026 12:34:26 p. m.
6.0699693N 75.7921961W
Titiribi
Titiribí
Antioquia
CCM TITIRIBÍ

EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO

ELECTROIMÁN 600 LB

Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR


Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?	SI
Cantidad servidor NVR (un):	1
Observaciones servidor NVR:	Se sugiere la instalacion de un servidor nuevo para aumentar almacenamiento y procesamiento
LICENCIAS	
Existen licencias:	SI


Foto licencias

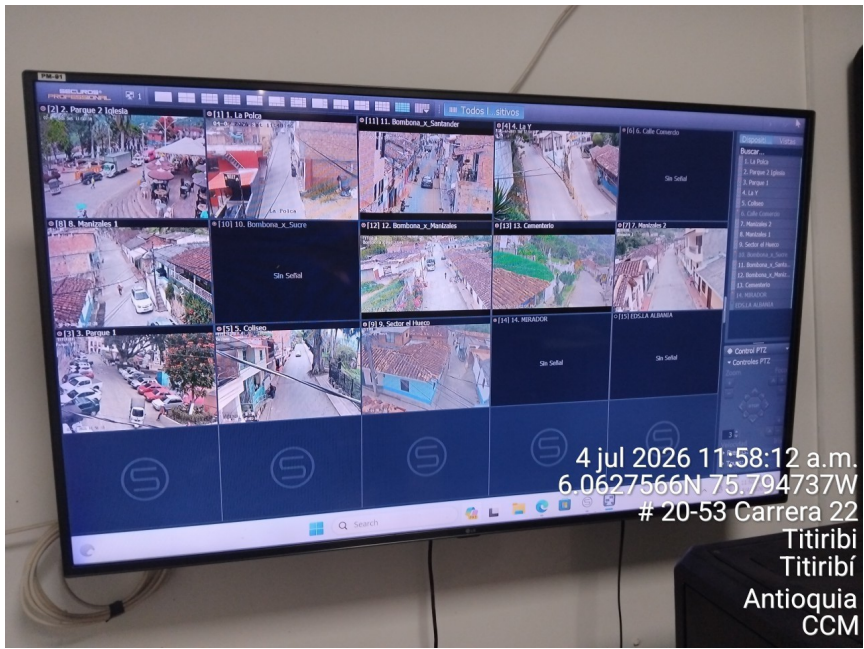

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor

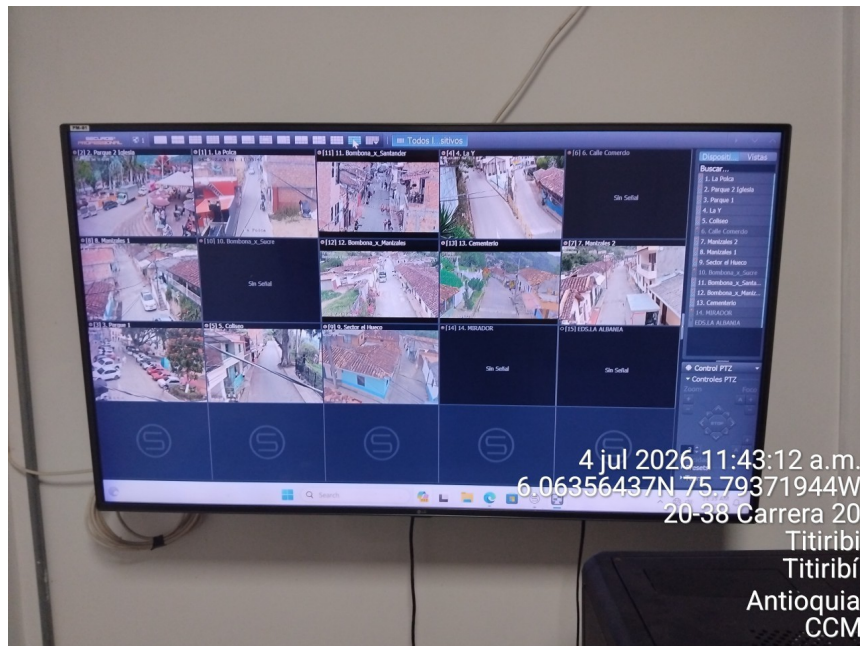

¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	NO
¿Requiere estación de trabajo?	SI
Cantidad requerida (un):	1
Observaciones estación de trabajo:	actualmente el CCM no cuenta con estacion de trabajo, se trabaja directamente sobre el servidor
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO

Foto joystick de operación



¿Requiere configuración?	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI

Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO
💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
Foto luminarias	
 4 jul 2026 12:39:40 p.m. 6.0636879N 75.7936875W 20-42 Carrera 20 Titiribi Titiribí Antioquia CCM	
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	REGULAR
🪟 VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
🔑 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
🚧 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO

Foto cerramiento



4 jul 2026 1:00:55 p.m.
6.0634763N 75.7935916W
20-28 Carrera 20
Titiribi
Titiribí
Antioquia
CCM

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

✂ ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE03
Descripción de la actividad	INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	ML
Cantidad	30
Justificación	se requiere el UTP para comunicar el rack con la estacion de trabajo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE03 CABLE UTP CAT 6A-40fd9c4320ff4cb38ff1f5e3d34c0eb5.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	INST-OE10
Descripción de la actividad	Instalacion de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15R polo aislado a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	3
Justificación	Se requiere la instalacion de PDU ya que actualmente se cuenta con multitomas
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU-7b9ad90cf2c240efb48a8b356927dceb.xlsx



4 jul 2026 12:23:31 p.m.
6.0636769N 75.7936762W
20-42 Carrera 20
Titiribí
Titiribí
Antioquia
CCM

ACTIVIDAD EXTRA 3

Código del ítem	INST-OE11
Descripción de la actividad	Instalacion de organizador de cableado en rack, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	4
Justificación	Es nesesario la instalacion de organizadores en el rack nuevo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE11 ORGANIZADOR-5765a75e75e94ff2a960b741376232d3.xlsx

Sin evidencia fotográfica

ACTIVIDAD EXTRA 4

Código del ítem	SUM-OE03
Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE MONITOR DE OPERADOR 27". INCLUYE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS .
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	es nesesario el suministro de 1 monitor de 27" para la estacion de trabajo
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE03 MONITOR 27- 15c32b6ae9dc4297a9eef43ae18f297.xlsx

Sin evidencia fotográfica

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se requiere trasladar el rack actual al rack nuevo, con la empalmeria de FO, y el traslado de los elementos actuales, desmonte de los equipos que estan obsoletos

9. CONTROL DE APROBACIÓN
