



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad




Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Titiribí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	17/09/2026
Dirección del punto / sector	Cajero Automático
Latitud	6.0608314378437536
Longitud	-75.79138080631854
Coordenadas formulario	-75.79_6.06

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 10 Cementerio

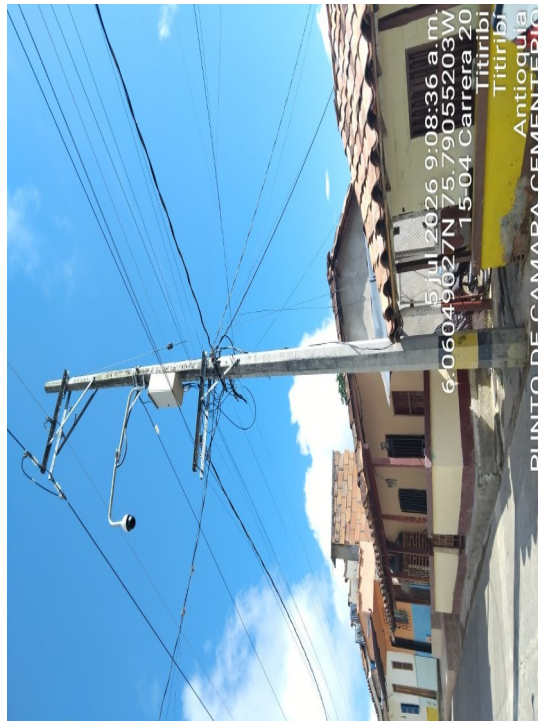

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2


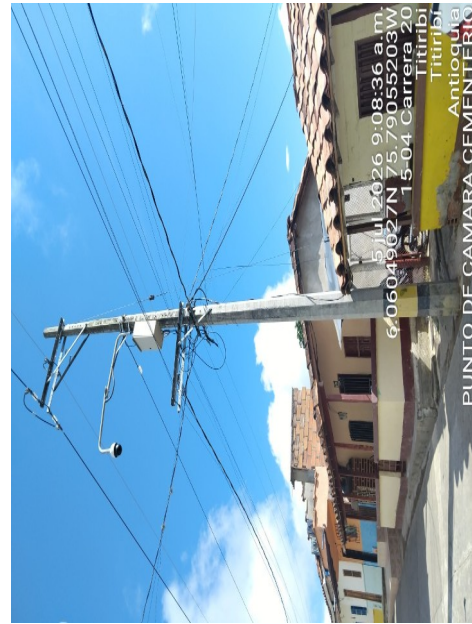


Foto 3



Foto 4

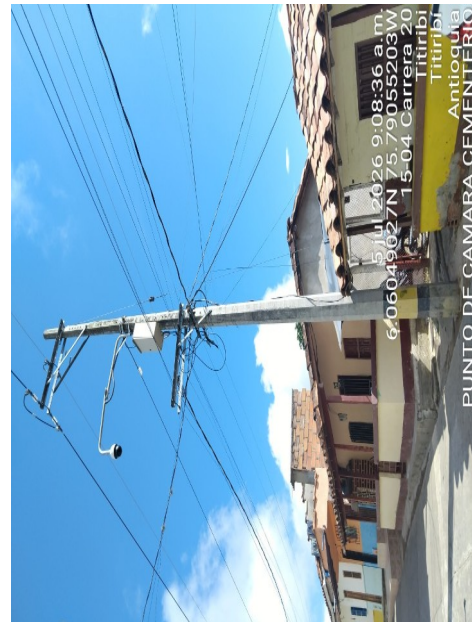

3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	ENERGIA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 20 con calle 15
Propietario del poste	EPM
Tipo tension	MEDIA
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO

GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

REGULAR



Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

Se sugiere cambio de gabinete por uno mas amplio, para una mejor

CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA


Existe Infraestructura Subterránea:

NO

Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50_PROY
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	REGULAR
Requiere Cables:	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad Cable 2x8+8 AWG (ml):	5
Observaciones Cables:	Se recomienda el cambio de la acometida electrica actual
TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	NO
TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
CORAZA	
Existe Coraza:	NO
Requiere Coraza 3/4":	NO
UPS	

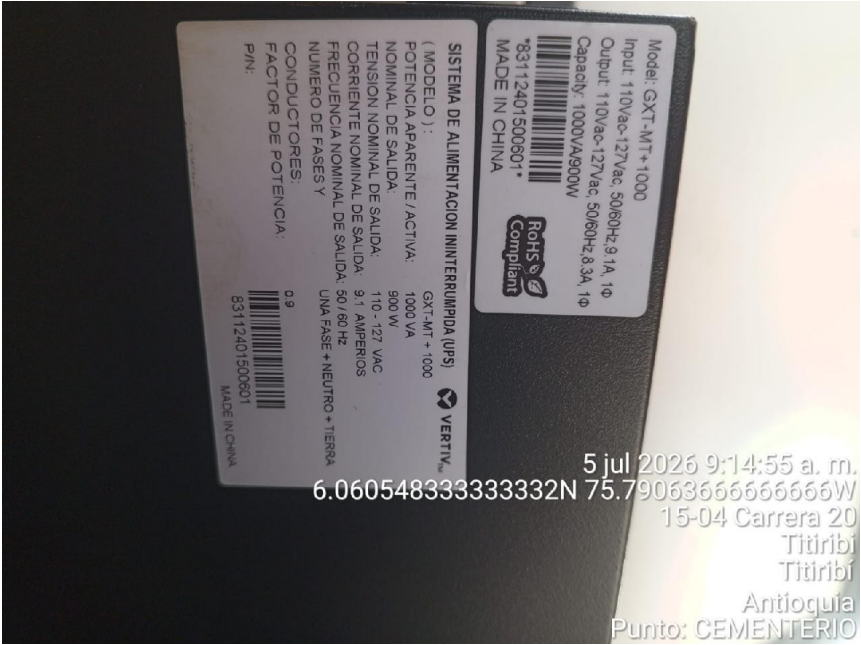Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Foto UPS	
	
Requiere UPS:	NO
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	El punto no cuenta con DPS
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	REGULAR
Requiere Toma 125 V:	NO
Observaciones Toma 125 V:	El punto cuenta con un toma flotante, dado lo estrecho del gabinete este
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



Requiere Fibra Óptica:	NO
🔌 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
	 ENRUTADOR VPN
Existe Enrutador VPN:	NO
	 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	SUM-OE05
Descripción de la actividad	Adquisición gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4, techo inclinado, espacio para ubicación de elementos (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de voltaje)
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se sugiere cambio de gabinete por uno mas amplio, para una mejor distribucion de los elementos
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE-9ee7399c3dc5476a8034121f222b373d.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	INST-OE08
Descripción de la actividad	Instalación gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4, techo inclinado, espacio para ubicación de elementos (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de voltaje)
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se sugiere cambio de gabinete por uno mas amplio, para una mejor distribucion de los elementos
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-8e372e60f2bf4e8887cba4e8d655b1a0.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	INST-OE18
Descripción de la actividad	INSTALACIÓN DE CABLE CONCENTRICO 2X8 +8 AWG, INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LOS DEFINIDOS EN ANEXO TECNICO.
Unidad	ML
Cantidad	5
Justificación	Se recomienda el cambio de la acometida
Archivo APU adjunto	APU INST-OE18 CONCENTRICO-d52771851c024222b1c59aaa844af0a7.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se recomienda el cambio del gabinete, la instalacion de DPS, puesta a tierra y acometida

8. CONTROL DE APROBACIÓN
