



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Titiribí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	16/09/2026
Dirección del punto / sector	Calle 17, Titiribí, Antioquia
Latitud	6.061783165121963
Longitud	-75.79120155038736
Coordenadas formulario	-75.79_6.06

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 2 La Y



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Calle 19 con carrera 20
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO
 4 Jul 2026 2:43:06 p.m. 6.06181013N 75.79113512W # 20-6 Calle 19 Titiribi Titiribi Antioquia PUNTO DE CAMARA LA Y	
Requiere Cambio de anclaje:	NO
GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	REGULAR
 4 Jul 2026 2:46:50 p. m. 6.06181N 75.7911549999999W # 20-16 Calle 19 Titiribi Titiribi Antioquia Punto: LA Y	
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
Observaciones Gabinete:	Se sugiere cambio de gabinete, el actual gabinete no tiene la capacidad para
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:	BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	

Existe Infraestructura Subterránea:	NO
Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50_PROY
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
Observaciones Corona:	EL punto no cuenta con corona
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	MALO
 4 jul 2026 2:47:41 p. m. 6.061823333333333N 75.79117333333333W # 20-6 Calle 19 Titiribí Titiribí Antioquia Punto: LA Y	
Requiere Brazo de Soporte:	SI
Observaciones Brazo:	Se recomienda el cambio del brazo por un brazo tecnico que permita una

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	REGULAR
Requiere Cables:	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad Cable 2x8+8 AWG (ml):	15
Observaciones Cables:	Se recomienda el cambio de la acometida electrica actual, encauchetado de
TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	NO
TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
CORAZA	

Existe Coraza:	NO
Requiere Coraza 3/4":	NO
📍 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Foto UPS	
 4 jul 2026 2:48:09 p. m. 6.0618166666666666N 75.79116333333333W # 20-6 Calle 19 Titiribi Titiribi Antioquia Punto: LA Y	
Requiere UPS:	NO
📍 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO

Foto Protección



Requiere Protección:	NO
	TOMA 125 V
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	REGULAR

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
Observaciones Toma 125 V:	El toma actual esta instalado en una caja plastica flotante, no esta asegurada
	CANAleta PLÁSTICA
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



Requiere Fibra Óptica:	NO
 INYECTOR POE	

Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO
Requiere Inyector PoE:	NO

 PATCH CORD

Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO

 PATCH PANEL

Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO

 ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO


 CONVERTIDOR MONOMODO

Existe Convertidor Monomodo:	SI
Estado Convertidor Monomodo:	BUENO



4 jul 2026 2:50:18 p. m.
6.061855N 75.791183333333W
20-6 Calle 19
Titiribi
Titiribi
Antioquia
Punto: LA Y

Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO

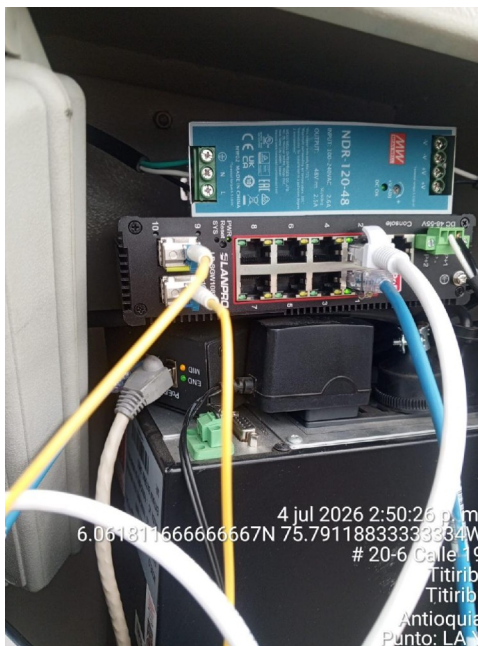

4 jul 2026 2:50:26 p. m.
6.061911566666667N 75.791188333333W
20-6 Calle 19
Titiribi
Titiribi
Antioquia
Punto: LA Y

Requiere Switch:	NO
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	

Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO
 4 jul 2026 2:47:50 p. m. 6.061823333333333N 75.79117333333333W # 20-6 Calle 19 Titiribí Titiribí Antioquia Punto: LA Y	
¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	SUM-OE05
Descripción de la actividad	Adquisición gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4, techo inclinado, espacio para ubicación de elementos (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de voltaje)
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El gabinete actual no tiene el espacio suficiente para albergar los componentes que se tienen
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE-a5b84064d7404790b59980cf9138ec5a.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	INST-OE08
Descripción de la actividad	Instalación gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4, techo inclinado, espacio para ubicación de elementos (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de voltaje)
Unidad	UN
Cantidad	1

Justificación	Se sugiere instalar gabinete nuevo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-e966a7fcfd0744d9b16eeb8f87a39648.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	INST-OE12
Descripción de la actividad	Instalación de brazo para soporte de cámara PTZ en poste, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se sugiere la instalacion de un brazo nuevo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE12 BRAZO-ecbd22c1ebfd47439ab4c84655c08690.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se sugiere el cambio de gabinete, acometida y brazo, la instalacion de caja de 50x50 y STP

8. CONTROL DE APROBACIÓN
