

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Dabeiba
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	22/07/2026
Vereda / sector	EL PITAL
Dirección del punto / sector	Calle 11 10 1-99, Dabeiba, Antioquia
Latitud	7.001227255804777
Longitud	-76.26723502483297
Coordenadas formulario	-76.27_7

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	7.001222, -76.267235

Evidencia ubicación CCM

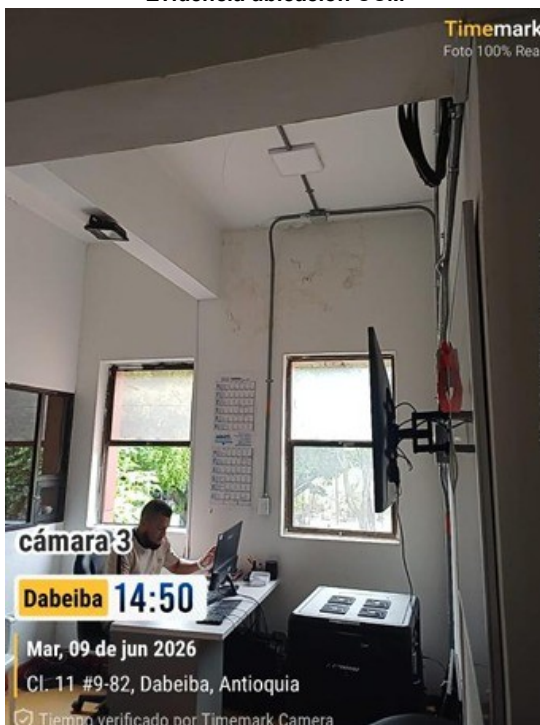

¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Se desconoce

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	N/A
Teléfono del administrador:	N/A
Correo del administrador:	N/A
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1

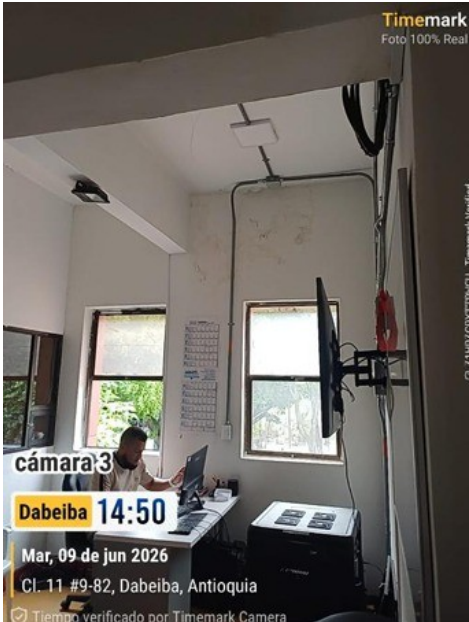


Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
Observaciones UPS:	Se realizaron pruebas en la UPS donde esta mantuvo energizados los equipos conectados de manera continua y estable, sin presentar apagados inesperados ni variaciones de voltaje, esta prueba duro aproximadamente 10 minutos. mantenimiento preventivo.
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	SI
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	REGULAR

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	La PDU se encuentra en su 100% se requiere una nueva PDU para generar mas disponibilidad.
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	SI
Cantidad canaleta plástica (un):	2
Observaciones canaleta plástica:	Se requiere dos metros de canaleta plastica. Durante la inspección se evidenció que el cableado se encuentra expuesto. Por lo anterior, se recomienda la instalación de canaleta para la conducción y protección de los cables.

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto fisico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF

Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

NO

¿Requiere inyector PoE?

NO

PATCH CORD

Existe patch cord:

NO

¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL

Existe patch panel:

SI

Estado patch panel:		BUENO
Foto patch panel 		
¿Requiere patch panel?		NO
¿Requiere toma RJ45?		NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO		
Existe organizador de cableado:		NO
¿Requiere organizador de cableado?		NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO		
Existe convertidor monomodo:		NO
¿Requiere convertidor monomodo?		NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO		
Existe módulo óptico:		NO
¿Requiere módulo óptico?		NO
🔌 SWITCH		
Existe switch:		SI
Estado switch:		BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?	NO
Observaciones switch:	Se cuenta con un switch de 24 puertos, de los cuales 19 se encuentran disponibles, evidenciando una adecuada capacidad de expansión para la incorporación de nuevos dispositivos o servicios en caso de ser requerido.
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	SI
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR?

NO

 LICENCIAS

Existen licencias:

NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR

Existe monitor:

SI


Cantidad monitor existente (un):

1

Estado monitor:

BUENO

Foto monitor

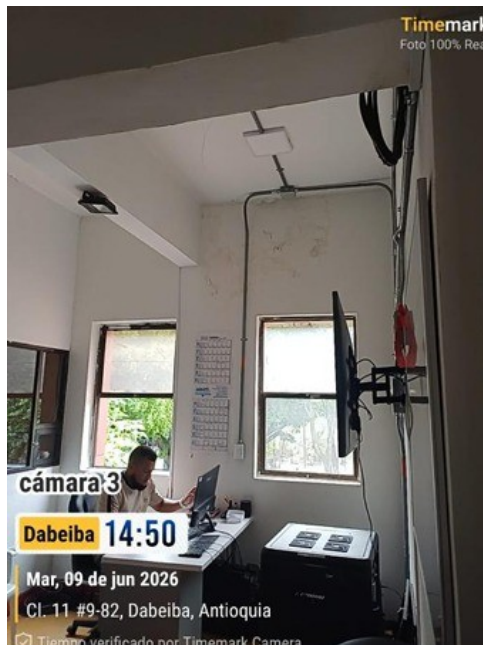

¿Requiere monitor?

NO

Observaciones monitor:

Monitor en buen estado

 ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:

SI

Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO
Foto estación de trabajo 	
¿Requiere estación de trabajo?	NO
Observaciones estación de trabajo:	estación de trabajo en buenas condiciones, no presenta afectaciones.
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	BUENO
Foto cable HDMI 	
¿Requiere cable HDMI?	NO
LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI


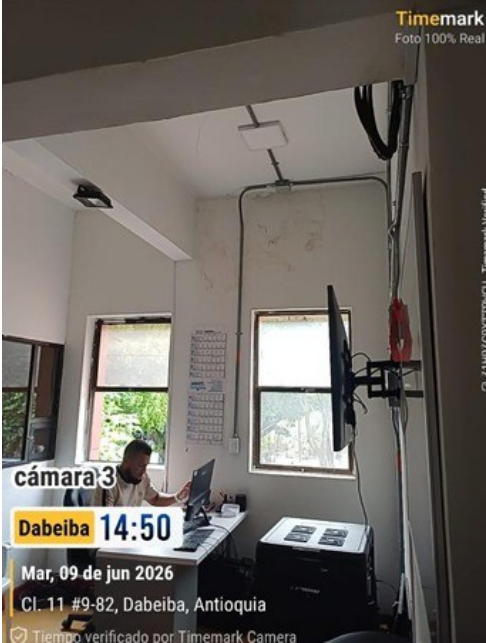
Estado luminarias:		BUENO
Foto luminarias		
		
Observaciones luminarias:	Luminarias en buen estado	
RED CONTRA INCENDIO		
Existe red contra incendio:	NO	
PUERTAS		
Existen puertas:	SI	
Estado puertas:	BUENO	
Foto puertas		
		
VENTANAS		
Existen ventanas:	SI	
Estado ventanas:	BUENO	

Foto ventanas

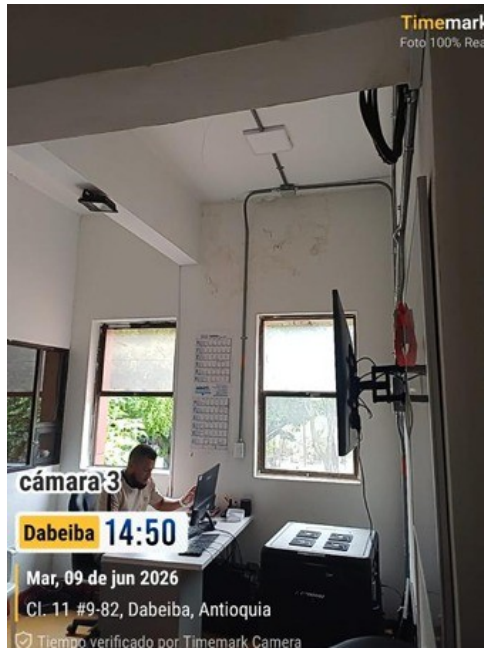

CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso: NO

CERRAMIENTO

Existe cerramiento: NO

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Observaciones generales del diagnóstico:	La inspección técnica realizada al sistema de videovigilancia CCTV del municipio de Dabeiba permitió evidenciar que la infraestructura principal del Centro de Monitoreo y Control (CCM) se encuentra operativa, con equipos como el switch, la UPS y el puesto de monitoreo funcionando adecuadamente. Sin embargo, se identificaron varias oportunidades de mejora y necesidades de mantenimiento correctivo orientadas a fortalecer la confiabilidad, seguridad y continuidad operativa del sistema.

9. CONTROL DE APROBACIÓN
