

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
--	---	---

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Sabanalarga
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	10/07/2026
Vereda / sector	SAN CRISTOBAL PENA
Dirección del punto / sector	Lopez Dominguez Dianeidis Patricia
Latitud	6.850814
Longitud	-75.818469
Coordenadas formulario	-75.82_6.85

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Alcaldía del municipio - 6.850814, -75.818469

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Se desconoce

¿Requiere actualización de conexión?	NO
Administrador del CCM:	N/A
Teléfono del administrador:	N/A
Correo del administrador:	N/A
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1

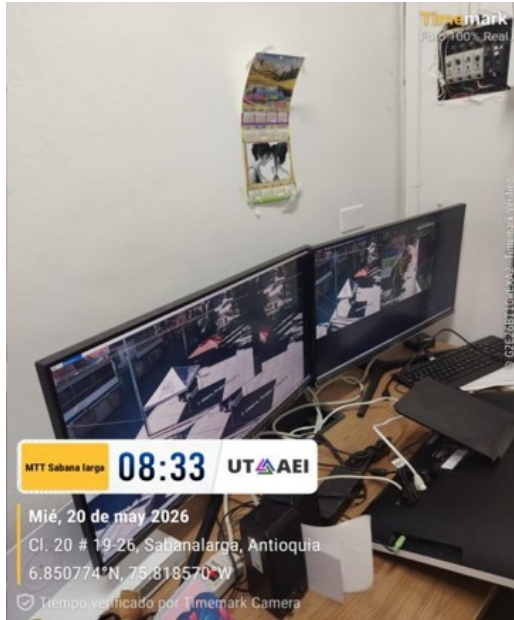


Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones 	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
Foto cables 	
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	MALO

Foto tablero breaker



Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	SI
Tipo de breaker requerido:	BRK_20A
Cantidad breaker (un):	1
Observaciones tablero breaker:	Se requiere nuevo tablero ya que se evidencia en mal estado
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_3_0
Observaciones UPS:	se cuenta con UPS de 1kva, debido al crecimiento de la infraestructura tecnologica, la autonomia actual esta limitada, se recomienda actualizar a UPS 3kva
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	SI
Estado baterías UPS:	BUENO

Foto baterías UPS



¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	SI
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO

¿Requiere protección?	SI
Tipo de protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO
Foto PDU multitoma	
	
¿Requiere PDU multitoma?	NO
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
Foto toma 125 V	
	
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	SI
Estado canaleta plástica:	BUENO

Foto canaleta plástica



¿Requiere canaleta plástica 100x45?

NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA

Existe punto físico de repetición:

NO

¿Requiere mantenimiento?

NO

PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA

Existe planta eléctrica y transferencia:

NO

¿Requiere mantenimiento?

NO

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe fibra óptica:

SI

Estado fibra óptica:

BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica?

NO

🔧 ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO
¿Requiere ODF?	NO
🔧 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	SI
Estado inyector PoE:	BUENO
Foto inyector PoE	
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	NO
¿Requiere patch cord?	NO
🔧 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel



¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	NO
¿Requiere organizador de cableado?	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	NO
¿Requiere módulo óptico?	NO
🔌 SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?

NO

 DISCO DURO

Existe disco duro:

NO

¿Requiere disco duro?

SI

Tipo de disco duro requerido:

MICROTIK

Cantidad disco duro (un):

1

 FIREWALL

Existe firewall:

SI

Estado firewall:

BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?

NO

 ENRUTADOR VPN

Existe enrutador VPN:

NO

 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	SI
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO


5. COMPONENTES DE SOFTWARE

 SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO
Foto servidor NVR 	
¿Requiere servidor NVR?	NO
 LICENCIAS	
Existen licencias:	NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA


☐ MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	3
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor

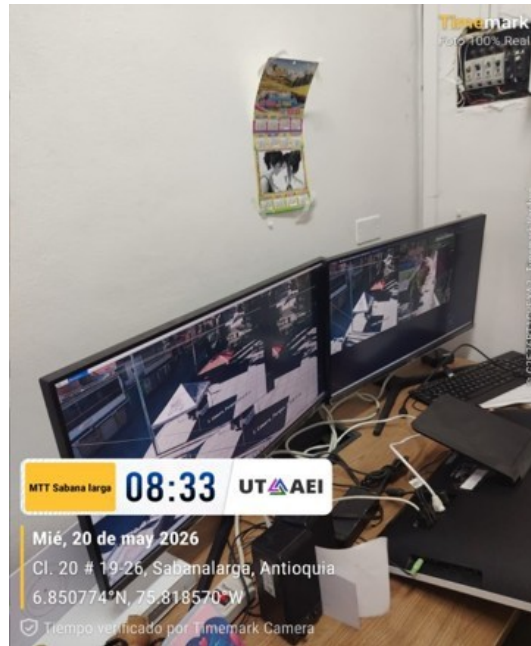


¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo

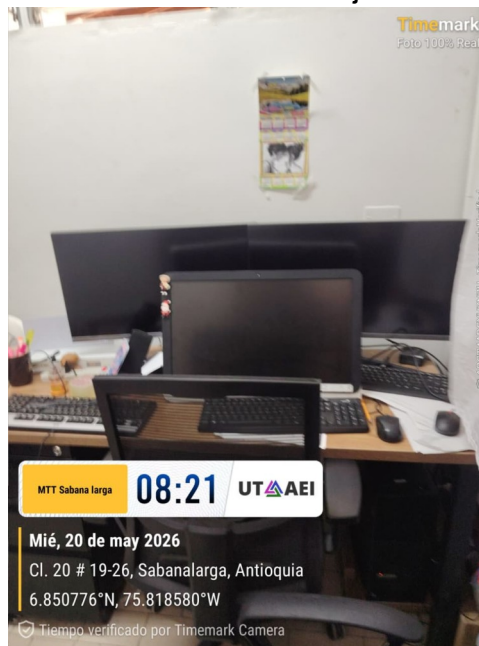

¿Requiere estación de trabajo?	NO
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	SI
Estado joystick de operación:	BUENO

Foto joystick de operación

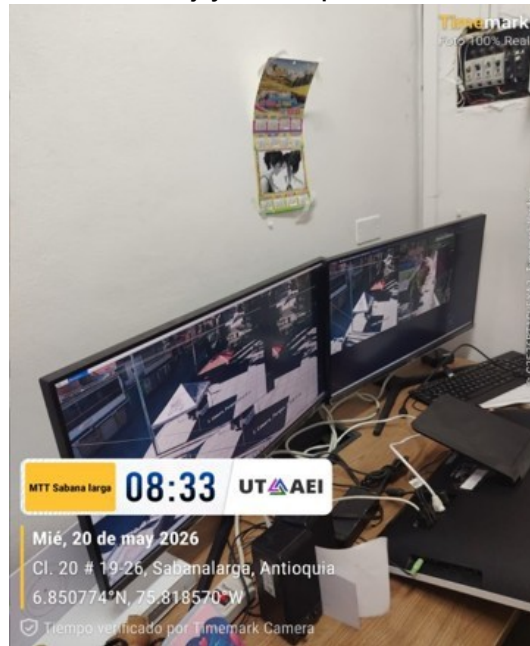

¿Requiere configuración?	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	NO
¿Requiere cable HDMI?	SI
Cantidad requerida (un):	1
LUMINARIAS	
RED CONTRA INCENDIO	
PUERTAS	
VENTANAS	
CONTROL DE ACCESO	
CERRAMIENTO	

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	SE ADQUISICION DE CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 4 SC/LC, IP 65, ENTRADA (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON ESTA EN EL CCM
Unidad	UN
Cantidad	1
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO

Observaciones generales del diagnóstico:

Durante la inspección realizada al sistema CCTV del municipio, se evidenció que la mayoría de los equipos e infraestructura se encuentran en condiciones operativas parciales, requiriendo actividades de mantenimiento correctivo, reubicación e instalación de componentes necesarios además de limpieza, revisión, ajuste y conservación de los componentes existentes para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

9. CONTROL DE APROBACIÓN
