

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Sabanalarga
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	14/07/2026
Vereda / sector	SAN CRISTOBAL PENA
Dirección del punto / sector	Calle 20 19 1-99, Sabanalarga, Antioquia
Latitud	6.85071059647797
Longitud	-75.81842535906485
Coordenadas formulario	-75.82_6.85

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	Frente a parque sabanalarga



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	N/A
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3

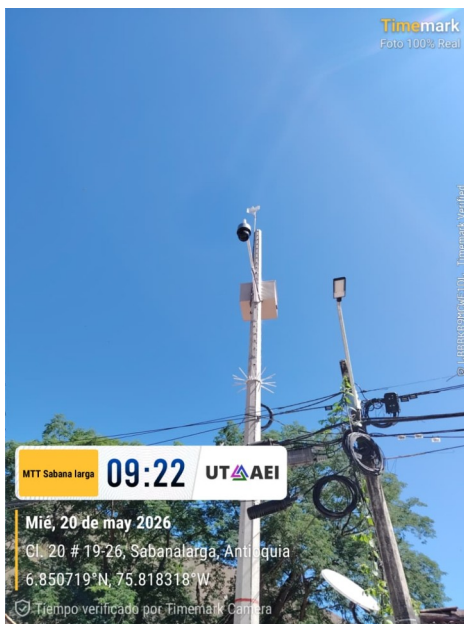


Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	BUENO



Requiere Gabinete Metálico:	NO
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	NO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	NO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
----------------------------------	----

BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	NO
Requiere Cables:	NO
TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:	NO
	TUBERÍA
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
	CORAZA
Existe Coraza:	NO
Requiere Coraza 3/4":	NO
	UPS
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:	NO
---------------	----

BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	SI
Estado Baterías UPS:	BUENO
Foto Baterías UPS	
	
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Foto SPT	
	
Requiere SPT:	NO
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA

TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Foto Toma 125 V	
	
Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



Requiere Fibra Óptica:	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO

📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO
	
Requiere Switch:	NO
📷 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
No se encontraron detalles de cámaras relacionados con este diagnóstico.	
¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Cámara en buen estado y funcionando con normalidad, se requiere la instalación de un DPS, Este es requerido para salvaguardar los equipos de videovigilancia frente a sobretensiones transitorias generadas por descargas.

8. CONTROL DE APROBACIÓN
