



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Betulia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	06/08/2026
Vereda / sector	LA SUCIA
Dirección del punto / sector	Carrera 19 22 2-100, Betulia, Antioquia
Latitud	6.11453286428708
Longitud	-75.98346602163012
Coordenadas formulario	-75.98_6.11

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 4 Barrio tolima



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 19 con Calle 23
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
 8 jul 2026 7:33:40 p.m. 6°6'52.146"N 75°59'0.458" W Betulia barrio tolima		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
 GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		BUENO
 8 jul 2026 7:54:20 p.m. 6°6'52.534" N 75°58'59.898" W Betulia barrio tolima		
Requiere Gabinete Metálico:		NO
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:		BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		

Existe Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
 8 jul 2026 8:02:42 p.m. 6°6'52.162"N 75°59'0.369"W Betulia barrio tolima	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO

Foto Cables

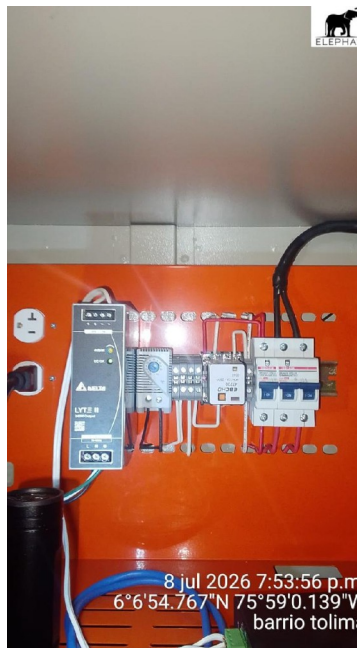

Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
💡 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:	NO
🔧 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO

Requiere Tubería:	NO
	 CORAZA
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO

Foto Coraza



Requiere Coraza 3/4":	NO
	 UPS
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:	NO
	 BATERÍAS UPS
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)

Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO

Foto SPT



Requiere SPT:	NO
---------------	----

PROTECCIÓN

Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	El Gabinete no cuenta con DPS para la protección de los Equipos

TOMA 125 V

Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
⚡ PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔄 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
	ENRUTADOR VPN
Existe Enrutador VPN:	NO
	EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	El punto se encuentra operativo pero no cuenta con DPS para la protección de los equipos, y organización de los cables internos

8. CONTROL DE APROBACIÓN
