

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Valparaiso
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	26/08/2026
Vereda / sector	MACHONTA
Dirección del punto / sector	Carrera 8 10 1-99, Valparaíso, Antioquia
Latitud	5.616767978551205
Longitud	-75.62338255017579
Coordenadas formulario	-75.62_5.62

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estación de Policía

Evidencia ubicación CCM

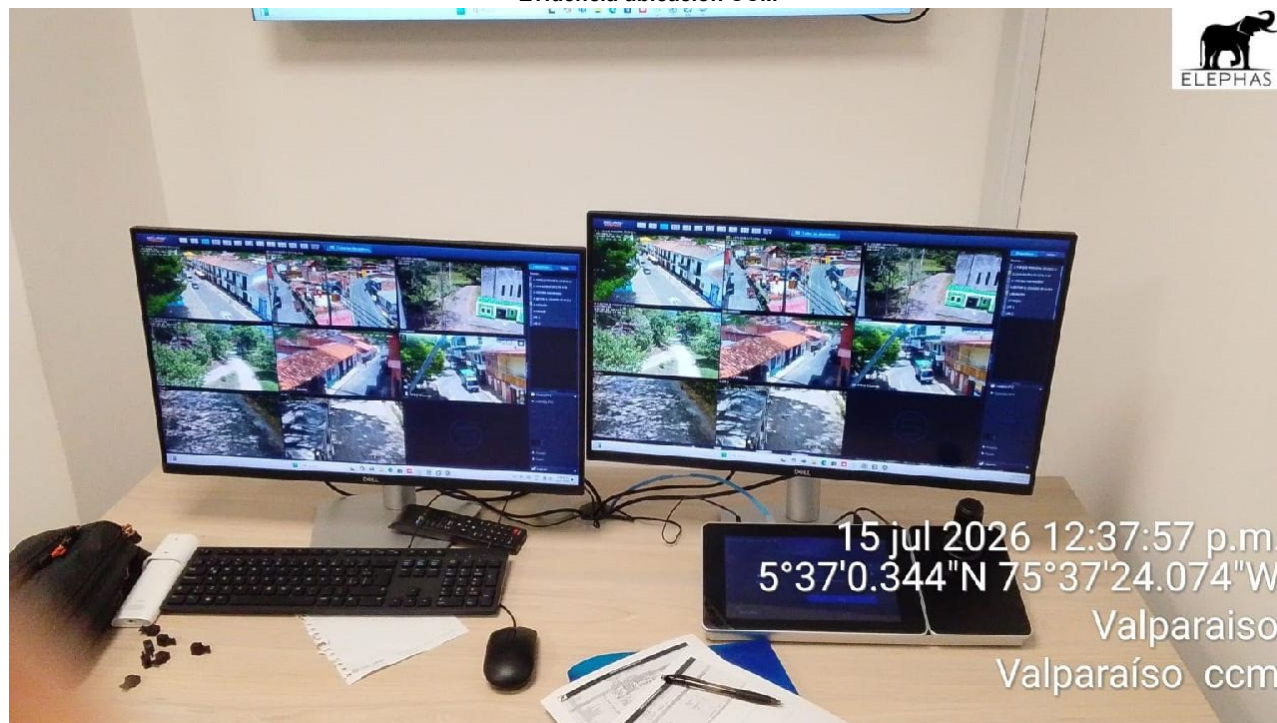

¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Comandante de estación de Policía
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2

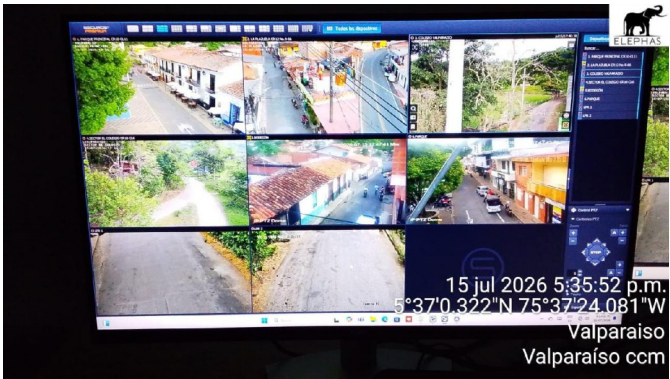


Foto 3

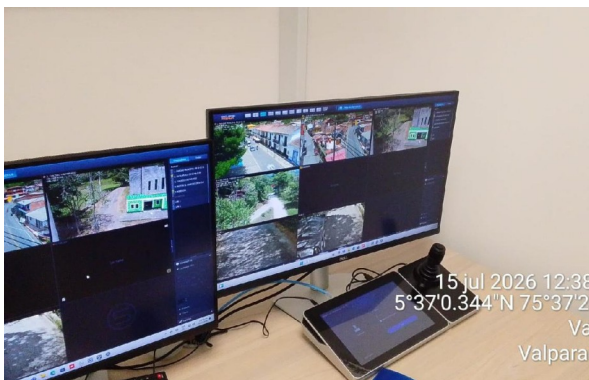


Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  15 jul 2026 12:33:25 p.m. 5°37'0.327"N 75°37'24.06"W Valparaíso Valparaíso ccm	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker  15 jul 2026 12:39:12 p.m. 5°37'0.338"N 75°37'24.087"W Valparaíso Valparaíso ccm	
Existe breaker:	SI

Estado breaker:	BUENO
Foto breaker	
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se requiere de 1 PDU para poder cubrir los elementos que están instalados en el rack
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel




¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado: SI
Estado organizador de cableado: BUENO

Foto organizador de cableado

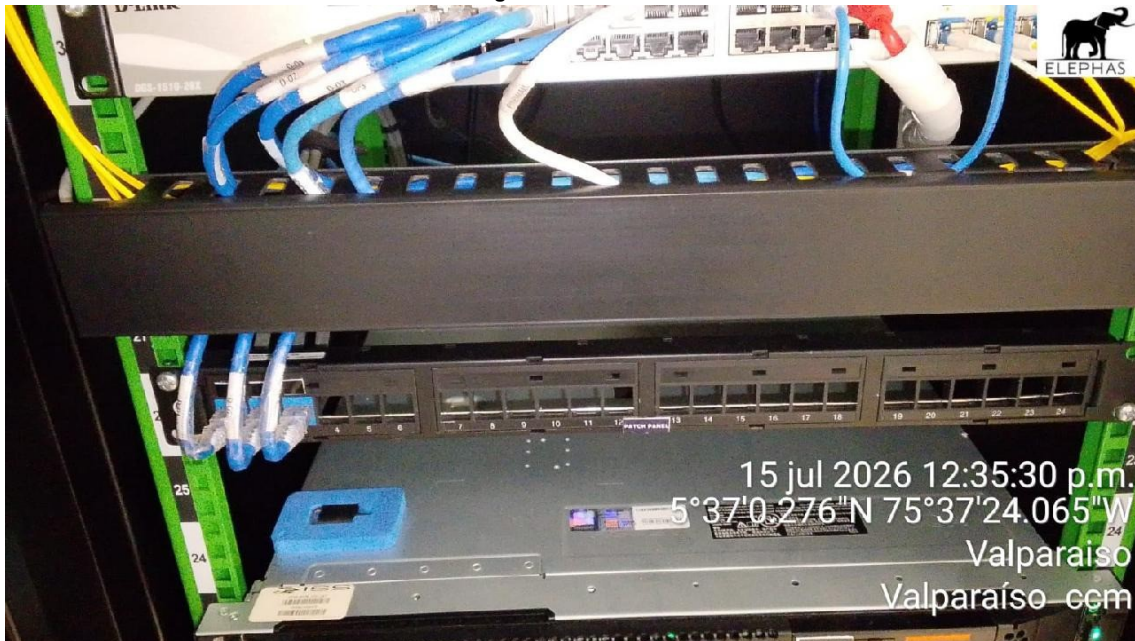

¿Requiere organizador de cableado? NO

CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo: NO
¿Requiere convertidor monomodo? NO

MÓDULO TRANCEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico: SI
Estado módulo óptico: BUENO
¿Requiere módulo óptico? NO

SWITCH

Existe switch: SI
Estado switch: BUENO

Foto switch



¿Requiere switch?	NO
 DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
 FIREWALL	
Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?	NO
 ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO

Foto enrutador VPN



 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	SI
Estado equipo A/C mini split:	BUENO
Foto equipo A/C mini split	
 15 jul 2026 12:39:54 p.m. 5°37'0.304"N 75°37'24.08"W Valparaíso Valparaíso ccm	
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
Observaciones equipo A/C mini split:	Se requiere de mantenimiento preventivo en A/C
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO
Foto servidor NVR	
 15 jul 2026 12:35:07 p.m. 5°37'0.476"N 75°37'24.032"W Valparaíso Valparaíso ccm	
¿Requiere servidor NVR?	NO

LICENCIAS

Existen licencias:

SI

Foto licencias

15 jul 2026 5:35:52 p.m.
5°37'0.322"N 75°37'24.081"W
Valparaíso
Valparaíso ccm

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

MONITOR

Existe monitor:

SI

Cantidad monitor existente (un):

1

Estado monitor:

BUENO

Foto monitor

15 jul 2026 12:24:59 p.m.
5°37'0.304"N 75°37'24.072"W
Valparaíso
Valparaíso ccm

¿Requiere monitor?

NO

ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:

SI


Cantidad existente (un):

1

Estado estación de trabajo:

BUENO

Foto estación de trabajo

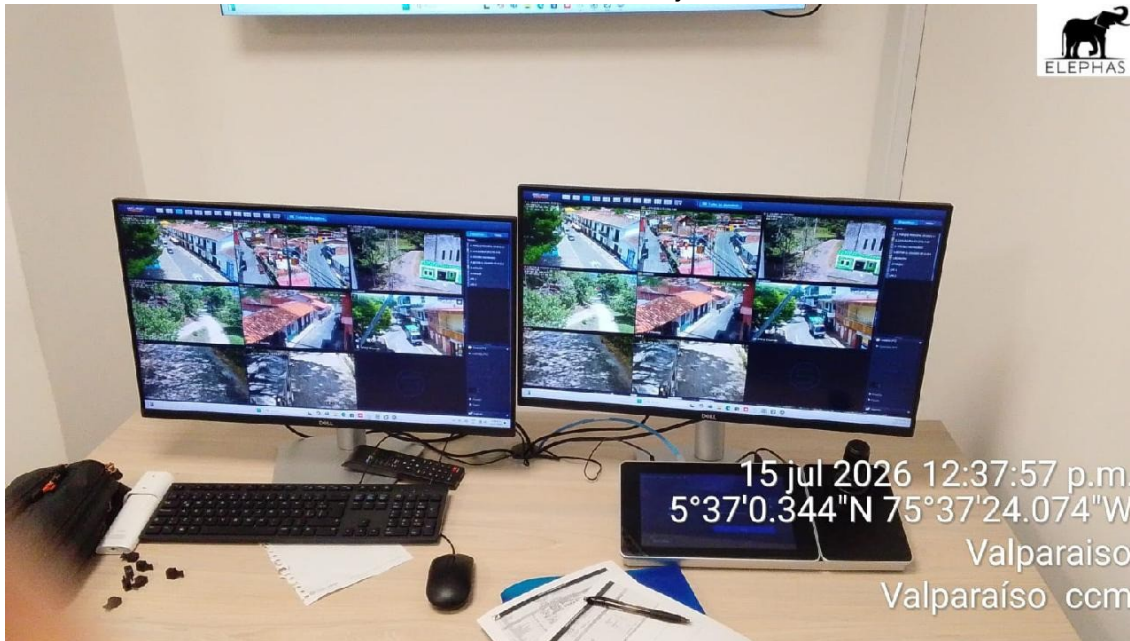

¿Requiere estación de trabajo?

NO

JOYSTICK DE OPERACIÓN


Existe joystick de operación:

SI

Estado joystick de operación:

BUENO

Foto joystick de operación

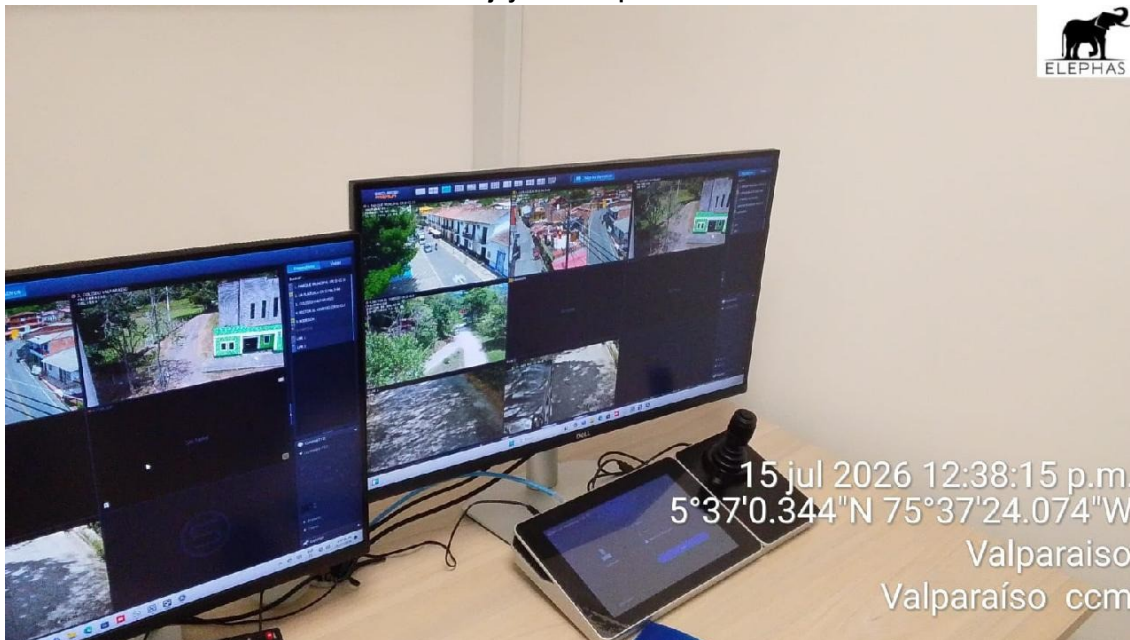

¿Requiere configuración?

NO

CABLE HDMI

Existe cable HDMI:

SI

Cantidad existente (un):

1

Estado cable HDMI:

BUENO

¿Requiere cable HDMI?

NO

LUMINARIAS


Existen luminarias:

SI

Estado luminarias:

BUENO

Foto luminarias

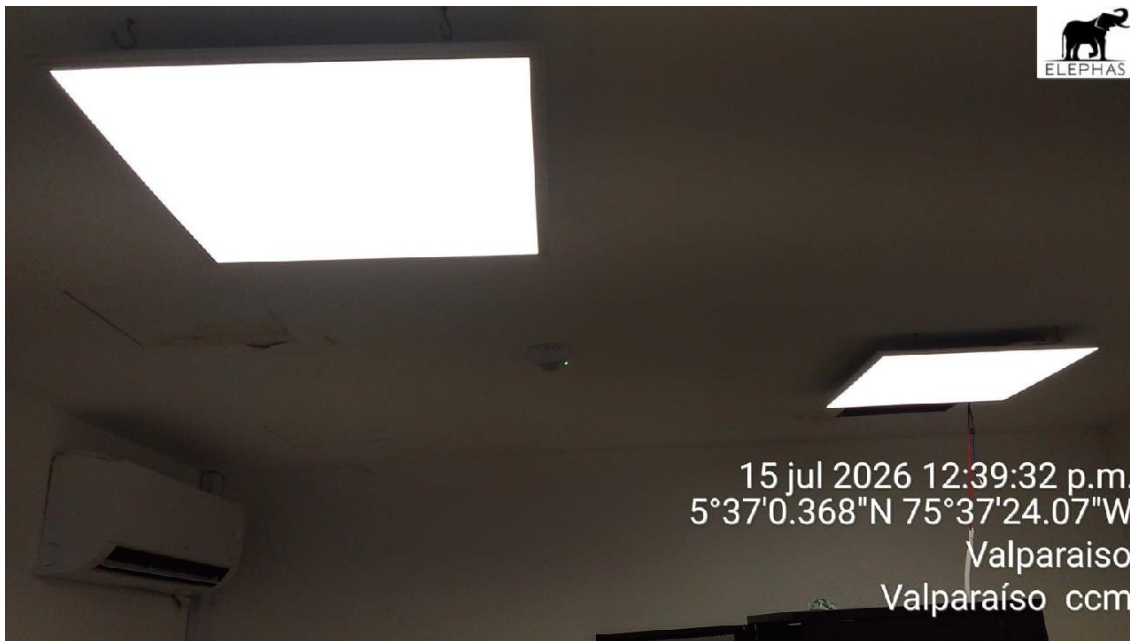

 RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:	NO
 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	BUENO

Foto puertas



 VENTANAS

Existen ventanas:	NO
 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	BUENO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE10
Descripción de la actividad	Instalacion de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15R polo aislado a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere de 1 PDU para poder cubrir los elementos que están instalados en el rack
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU-4fd0b49f53c444328dac8f197f6e627b.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se requiere mantenimiento preventivo completo en el CCM, para optimizar la debida operación de los equipos del CCM

9. CONTROL DE APROBACIÓN
