



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Fredonia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	21/08/2026
Vereda / sector	BUENOS AIRES
Dirección del punto / sector	Versalles - Amaga, Fredonia, Antioquia
Latitud	5.9372333583904355
Longitud	-75.68625123922598
Coordenadas formulario	-75.69_5.94

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 1 Antonio Roldan




9 may 2026 4:06:10 p.m.
5.93727414N 75.68609492W
70-36 Fredonia-Camilo C
Fredonia
Antioquia
ANTONIO ROLDAN

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES


ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Ingreso al municipio por Camilo C
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

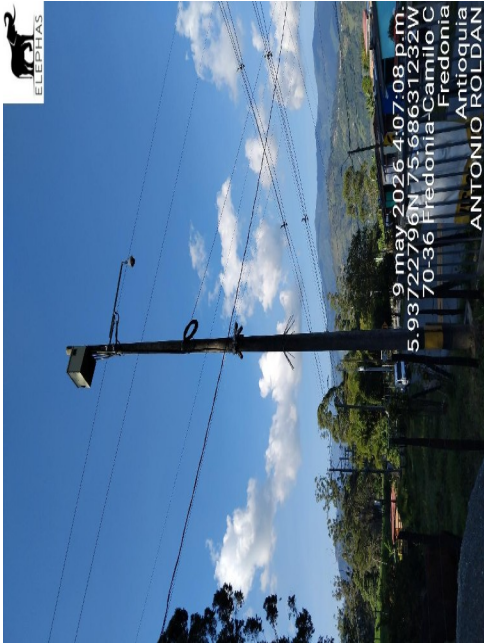Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO
	
Requiere Cambio de anclaje:	NO
 GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	BUENO
	
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:	BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:	SI
Observaciones Caja Distribución Vertical:	Se requiere de 1 caja de fibra optica para reparar la red que se daño
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	

Existe Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO

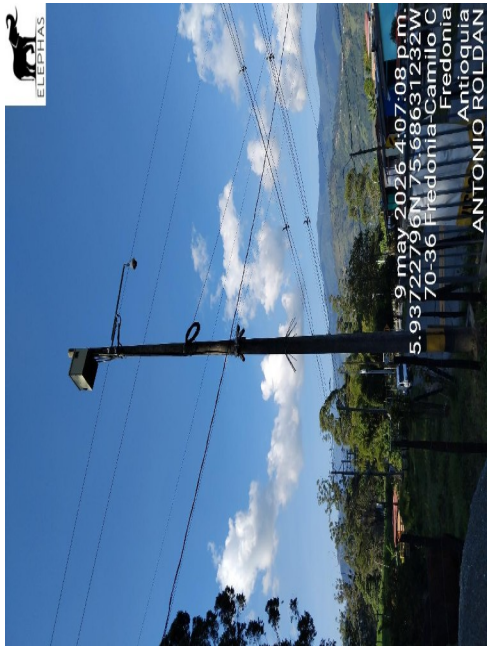


Requiere Brazo de Soporte:	NO
----------------------------	----

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Foto Cables	
	
Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
🔧 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor

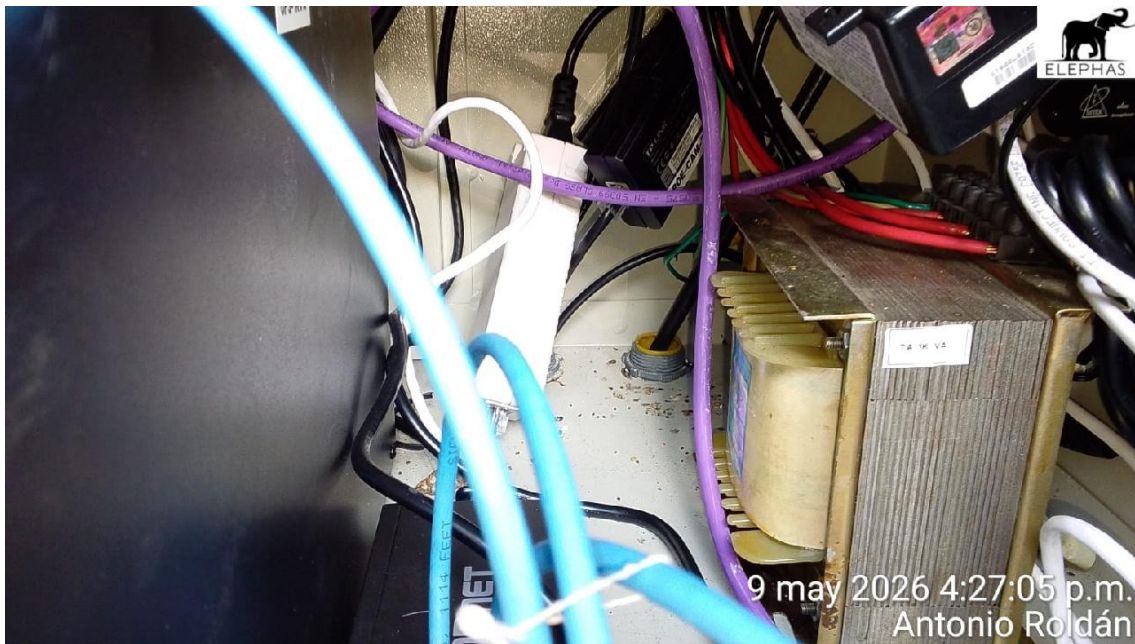

Requiere Transformador Reductor:	NO
	 TUBERÍA
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
	 CORAZA
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO

Foto Coraza



Requiere Coraza 3/4":	NO
	 UPS
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:	NO
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Requiere SPT:	NO
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO

Foto Protección



Requiere Protección:	NO
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Foto Toma 125 V	
	
Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	SI
Observaciones Fibra Óptica:	Se requiere de 250 metros de FO para repar el daño que se tiene en la red de
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



9 may 2026 4:26:30 p.m.
Antonio Roldán

Requiere Inyector PoE:	NO
	⚡ PATCH CORD
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
	🔌 PATCH PANEL
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
	📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
	🔄 CONVERTIDOR MONOMODO
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
	📡 MÓDULO TRANSEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
	🔌 SWITCH
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	5
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



	CÁMARA EXISTENTE 2
Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO



CÁMARA EXISTENTE 3

Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO



CÁMARA EXISTENTE 4

Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO



CÁMARA EXISTENTE 5

Tipo de cámara

FIJA

Estado de la cámara

BUENO



¿Requiere Cámara?

NO

Requiere Burbuja Domo PTZ:

NO

 ENRUTADOR VPN

Existe Enrutador VPN:

NO

 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe Equipo TX/RX:

NO

Requiere Equipo TX/RX:

NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento

FUERA_SERVICIO

Requiere mantenimiento:

SI

Seleccione el tipo de mantenimiento:

CORRECTIVO

Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	El punto se encuentra por fuera por una falla en la FO
---	--

8. CONTROL DE APROBACIÓN
