

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
--	---	---

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Jardín
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	23/08/2026
Vereda / sector	SERRANIAS
Dirección del punto / sector	Calle 9 2 2-34, Jardín, Antioquia
Latitud	5.60067257168083
Longitud	-75.81894331441518
Coordenadas formulario	-75.82_5.6

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de policia

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	Comandante de estación de Policía
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3


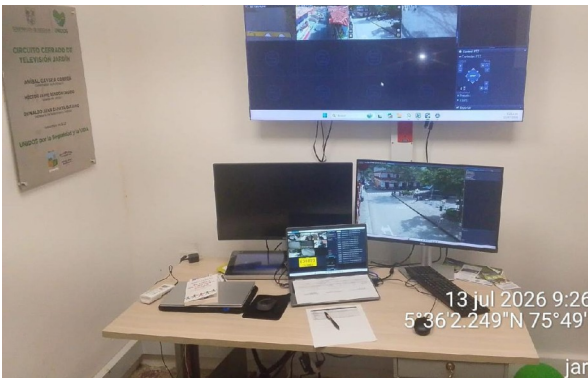


Foto 4

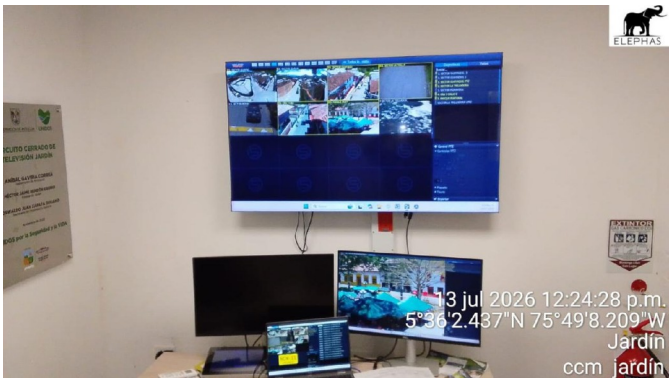

3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker	
Existe breaker:	SI

Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	SI
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	MALO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
Observaciones UPS:	La UPS no se encuentra en el CCM, se debe validar si fue retirada por el aliado que la instalo
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	La actual PDU no supe las necesidades de la cantidad de equipos instalados en el rack
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	SI
Estado toma 125 V:	BUENO

Foto toma 125 V



¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto fisico de repetición:	NO


¿Requiere mantenimiento?	NO
⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica?	NO
🔧 ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO


Foto ODF

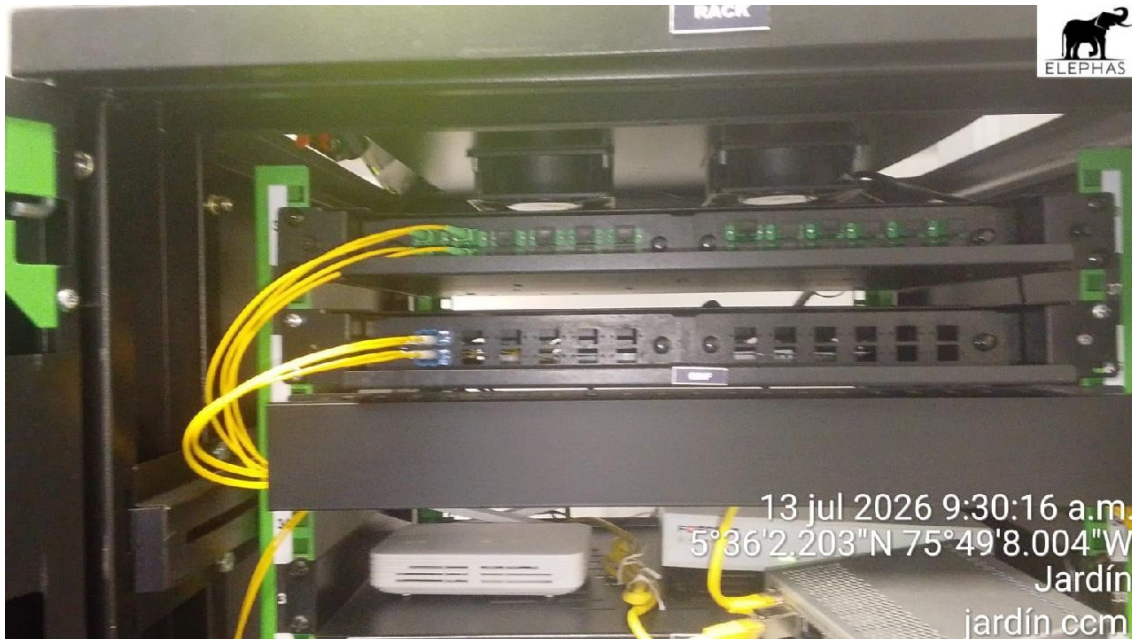

¿Requiere ODF?	NO
🔌 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO

¿Requiere inyector PoE?	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe patch cord:	SI
Estado patch cord:	BUENO
¿Requiere patch cord?	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	SI
Estado patch panel:	BUENO

Foto patch panel

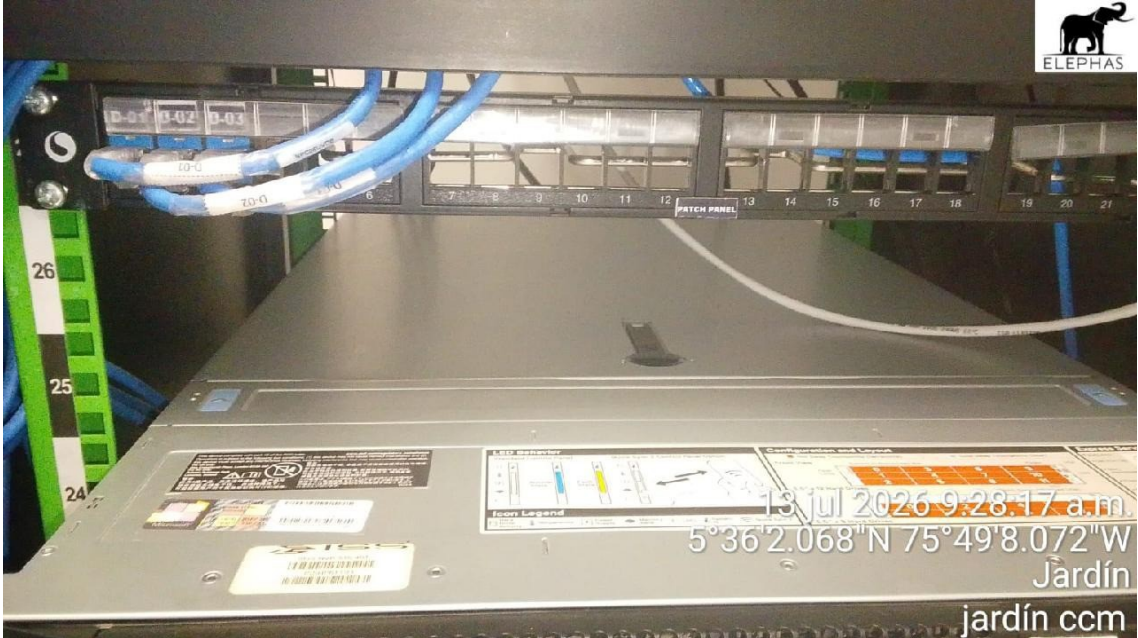

¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
📂 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	SI
Estado organizador de cableado:	BUENO

Foto organizador de cableado



¿Requiere organizador de cableado?	NO
------------------------------------	----

🔌 CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO


📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO
¿Requiere módulo óptico?	NO

🔌 SWITCH

Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch

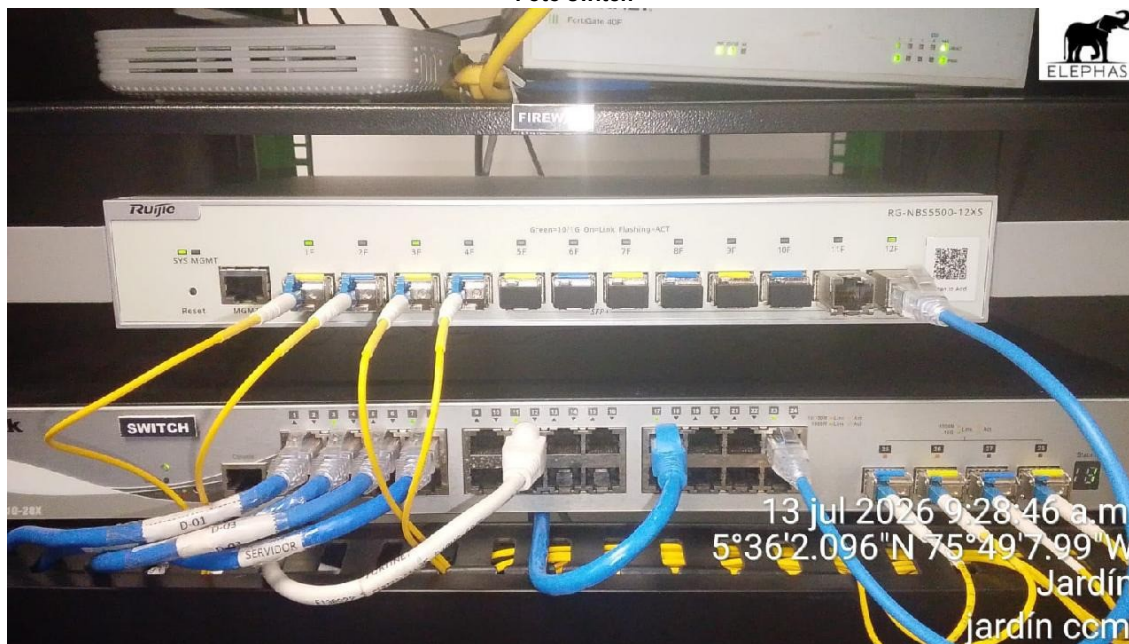

¿Requiere switch?	NO
-------------------	----

💿 DISCO DURO

Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO

🛡️ FIREWALL

Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?

NO

ENRUTADOR VPN

Existe enrutador VPN:

SI

Estado enrutador VPN:

BUENO

Foto enrutador VPN



EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:

NO

¿Requiere equipo TX/RX?

NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:

SI

Estado equipo A/C mini split:

BUENO

Foto equipo A/C mini split



13 jul 2026 9:31:19 a.m.
5°36'2.248"N 75°49'8.052"W
Jardín
jardín ccm

¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
Observaciones equipo A/C mini split:	se requiere mantenimiento del Aire
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVERIDOR NVR

Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



13 jul 2026 9:28:06 a.m.
5°36'2.068"N 75°49'8.072"W
Jardín
jardín ccm

¿Requiere servidor NVR?	NO
LICENCIAS	
Existen licencias:	SI

Foto licencias




6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR

Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO

Foto monitor

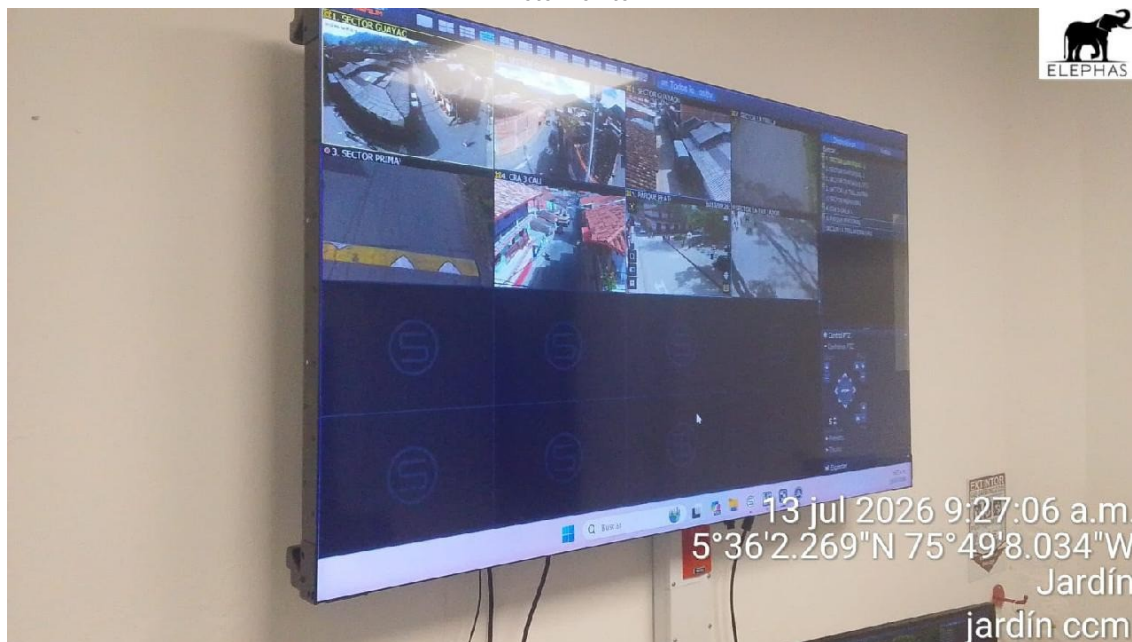


¿Requiere monitor?

NO

☒ ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado estación de trabajo:	BUENO

Foto estación de trabajo

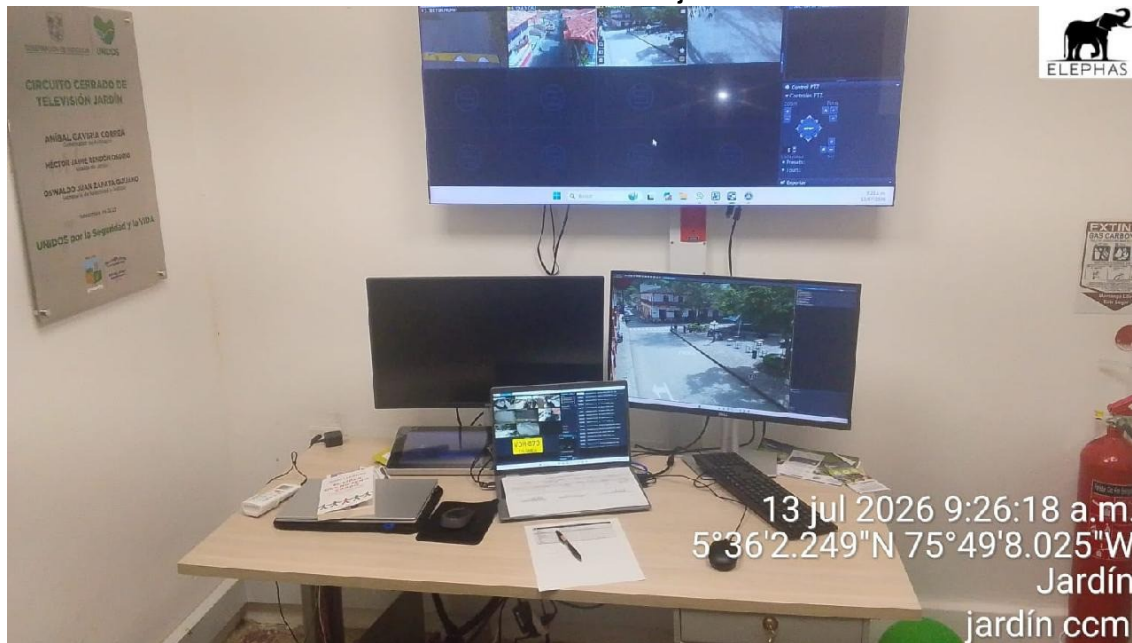

¿Requiere estación de trabajo?

NO

 JOYSTICK DE OPERACIÓN


Existe joystick de operación:

SI

Estado joystick de operación:

BUENO

Foto joystick de operación

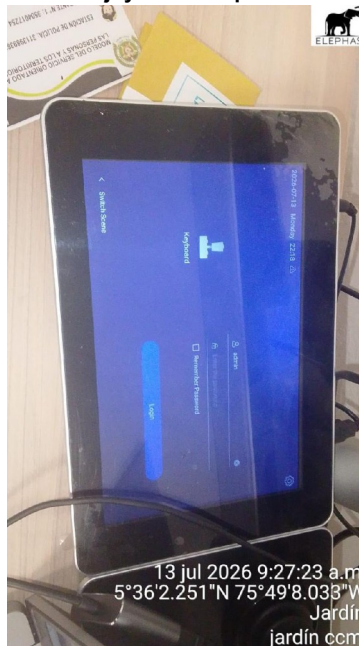

¿Requiere configuración?

NO

 CABLE HDMI

Existe cable HDMI:

SI

Cantidad existente (un):

1

Estado cable HDMI:

BUENO

¿Requiere cable HDMI?

NO

 LUMINARIAS


Existen luminarias:

SI

Estado luminarias:

BUENO

Foto luminarias

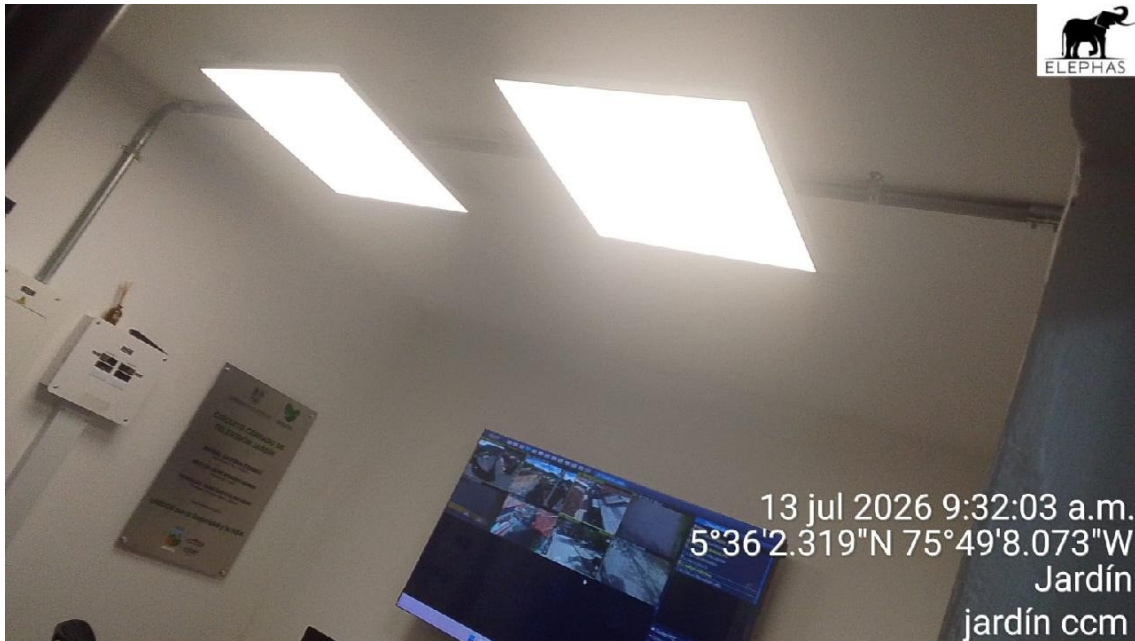

 RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:

NO

 PUERTAS

Existen puertas:

SI

Estado puertas:

BUENO

Foto puertas



 VENTANAS

Existen ventanas:

NO

 CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso:

NO

 CERRAMIENTO


Existe cerramiento:

SI

Estado cerramiento:

BUENO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

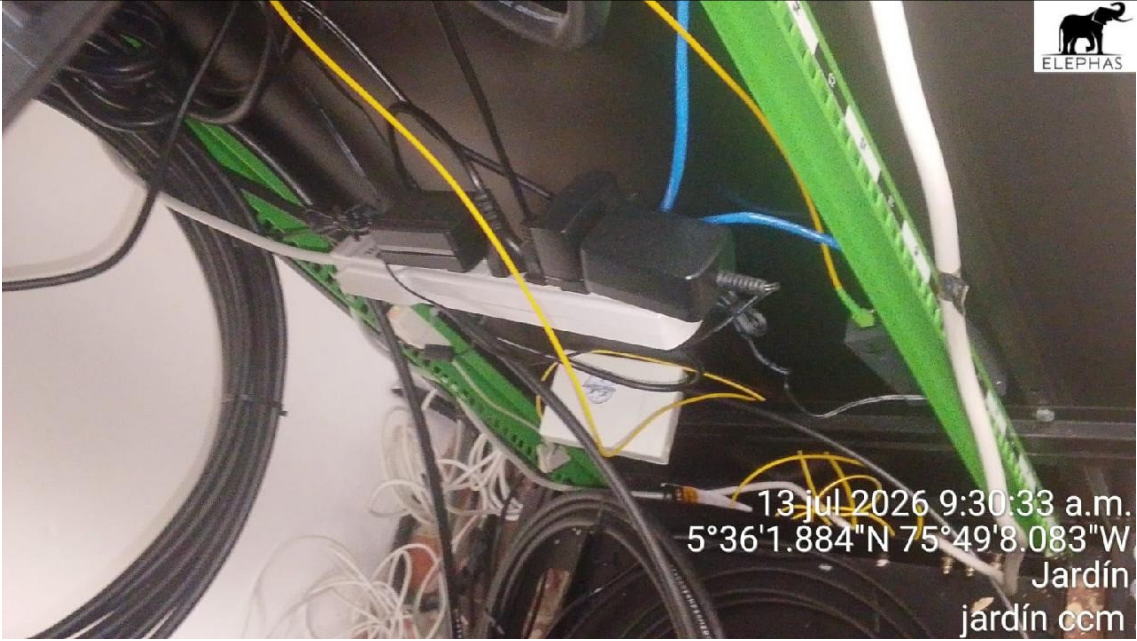ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	INST-OE10 Instalacion de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15R polo aislado a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalacion de 1 PDU para alimentar todo los equipos actualmente instalados
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU-c93f529580ef42debbfb058cee7134e3.xlsx
	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Descripción de la actividad	MANT-OE1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere de mantenimiento preventivo al A/C
Archivo APU adjunto	APU MAN-OE1 PREVENTIVO AIRES-4c6870b3318a464492004454016e75e9.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se debe validar si la UPS efectivamente se encuentra en garantias, se recomienda el suministro y la intalacion de 1 DPU

9. CONTROL DE APROBACIÓN
