

|  |                                                                                         |                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO<br/>MANTENIMIENTO</b><br><b>Proyecto Tasa de Seguridad</b> | <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Operador            | UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA |
| Contrato disponible | 173_2026                        |
| Técnico responsable | Uriel Ospina                    |
| Cédula del técnico  | 93134724                        |

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Municipio                    | Zaragoza                    |
| Departamento                 | Antioquia                   |
| Fecha diagnóstico            | 20/08/2026                  |
| Vereda / sector              | QUEBRADA UNO                |
| Dirección del punto / sector | 052448, Zaragoza, Antioquia |
| Latitud                      | 7.4847405814468395          |
| Longitud                     | -74.85846421364353          |
| Coordenadas formulario       | -74.86_-7.48                |

2. INFORMACIÓN GENERAL

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| El mantenimiento tiene relacion con cual componente: | CCTV                          |
| Información Ubicación CCTV                           | CAMARA #02 LPR SALIDA SEGOVIA |

Google Earth - Editar Marca de posición

Nombre:

Latitud:

Longitud:

Descripción

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| ¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?      | NO          |
| Seleccione el propietario del punto:               | MUNICIPIO   |
| Seleccione un proveedor de energía del punto:      | EPM         |
| Seleccione el medio de comunicación del punto:     | FO          |
| Especifique el proveedor de la conexión del punto: | Gobernación |
| ¿Requiere actualización de conexión?               | NO          |

Foto 1

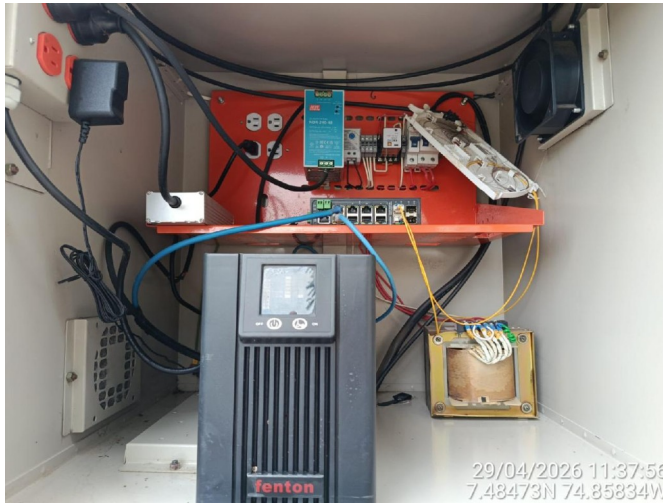


Foto 2



Foto 3



Foto 4



### 3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

| ANCLAJE                                   |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de anclaje:                          | POSTE                    |
| Tipo de poste                             | POSTE_CONCRE             |
| Altura del poste (m)                      | 14MTS                    |
| Dirección de referencia del anclaje       | 7°29'4.59"N 74°51'29.54" |
| Estado en el que se encuentra el anclaje: | BUENO                    |





Requiere Cambio de anclaje:

NO

 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO



29/04/2026 12:33:13  
7.48501N 74.85909W  
EMP/PC # 02

|                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Requiere Caja Distribución Vertical:                 | NO                               |
| <b>INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA</b>                   |                                  |
| Existe Infraestructura Subterránea:                  | SI                               |
| Infraestructura Subterránea y Obras complementarias: | CANALIZACION                     |
| Estado Canalización:                                 | REGULAR                          |
| Estado Tubería:                                      | BUENO                            |
| Requiere Infraestructura Subterránea:                | NO                               |
| Observaciones Infraestructura Subterránea:           | Las cajas se encuentran soldadas |
| <b>CORONA ANTIESCALATORIA</b>                        |                                  |
| Existe Corona Antiescalatoria:                       | SI                               |
| Existe Corona Antiescalatoria:                       | BUENO                            |
| Requiere Corona Antiescalatoria:                     | NO                               |
| <b>BRAZO DE SOPORTE</b>                              |                                  |
| Existe Brazo de Soporte:                             | NO                               |
| Requiere Brazo de Soporte:                           | NO                               |

#### 4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| <b>ACOMETIDA ELÉCTRICA</b> |       |
| Existen Cables:            | SI    |
| Estado Cables:             | BUENO |
| Requiere Cables:           | NO    |
| <b>TABLERO BREAKER</b>     |       |
| Existe Tablero Breaker:    | SI    |
| Estado Tablero Breaker:    | BUENO |
| Existe Breaker:            | SI    |
| Estado Breaker:            | BUENO |

Foto Breaker



Requiere Breaker:

NO

TRANSFORMADOR REDUCTOR


Existe Transformador Reductor:

SI

Estado Transformador Reductor:

BUENO

Foto Transformador Reductor

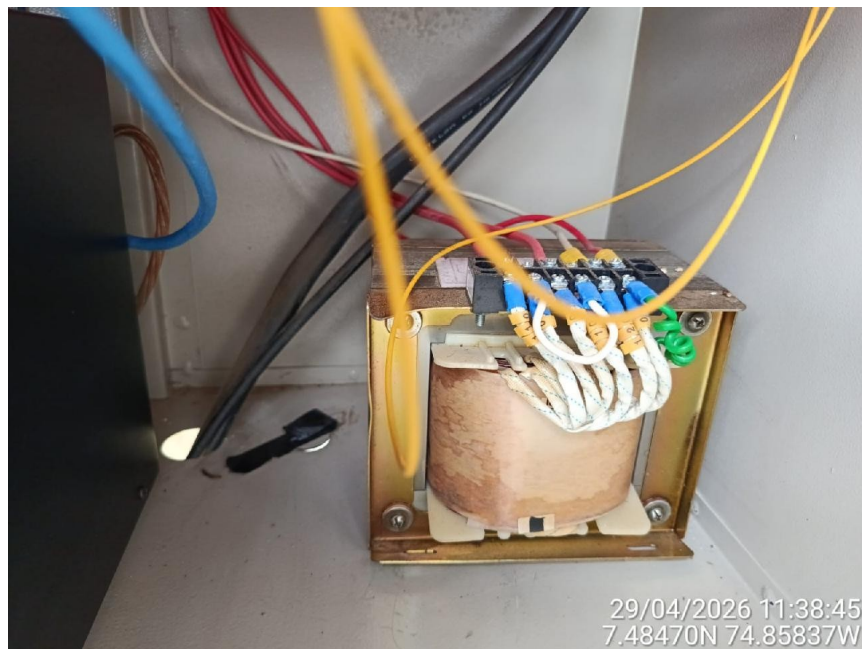

Requiere Transformador Reductor:

NO

TUBERÍA

Existe Tubería:

SI

Estado Tubería:

BUENO

Requiere Tubería:

NO

CORAZA

Existe Coraza:

SI

Estado Coraza:

BUENO

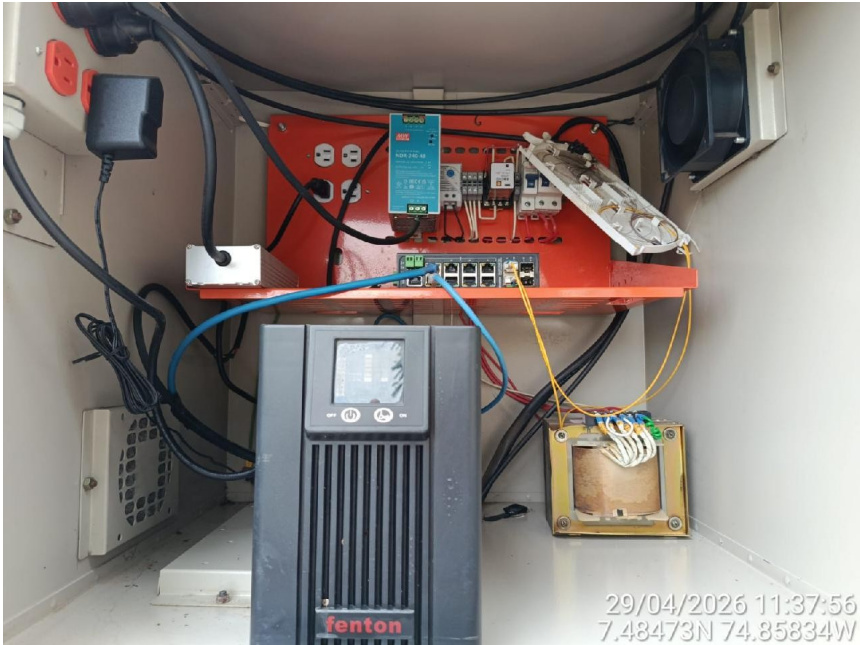
|                                                                                    |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Requiere Coraza 3/4":                                                              | NO                                                                          |
| 🔧 UPS                                                                              |                                                                             |
| Existe UPS:                                                                        | SI                                                                          |
| Estado UPS:                                                                        | MALO                                                                        |
| Foto UPS                                                                           |                                                                             |
|  |                                                                             |
| Requiere UPS:                                                                      | SI                                                                          |
| Tipo de UPS requerida:                                                             | UPS_1_5                                                                     |
| Observaciones UPS:                                                                 | UPS en mal estado, se encuentra alarmada.                                   |
| 🔧 BATERÍAS UPS                                                                     |                                                                             |
| Existen Baterías UPS:                                                              | NO                                                                          |
| Requiere Baterías UPS:                                                             | NO                                                                          |
| 🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)                                                 |                                                                             |
| Existe SPT:                                                                        | SI                                                                          |
| Estado SPT:                                                                        | REGULAR                                                                     |
| Requiere SPT:                                                                      | NO                                                                          |
| Observaciones SPT:                                                                 | No es posible realizar la validación del SPT, la caja se encuentra soldada. |
| 🛡️ PROTECCIÓN                                                                      |                                                                             |
| Existe Protección:                                                                 | NO                                                                          |
| Requiere Protección:                                                               | SI                                                                          |
| Tipo de Protección requerida:                                                      | PROTECCION_POTENCIA                                                         |
| Protección de potencia, video y datos en cámaras (un):                             | 1                                                                           |
| Observaciones Protección:                                                          | Se requiere protección IP para la cámara.                                   |
| 🔧 TOMA 125 V                                                                       |                                                                             |
| Existe Toma 125 V:                                                                 | SI                                                                          |
| Estado Toma 125 V:                                                                 | BUENO                                                                       |



Foto Toma 125 V



|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Requiere Toma 125 V:               | NO |
| CANALETA PLÁSTICA                  |    |
| Existe Canaleta Plástica:          | NO |
| Requiere Canaleta Plástica 100x45: | NO |

## 5. COMPONENTES DE EQUIPOS

| FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS       |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Existe Fibra Óptica:                 | SI                                                                           |
| Estado Fibra Óptica:                 | BUENO                                                                        |
| Requiere Fibra Óptica:               | NO                                                                           |
| Observaciones Fibra Óptica:          | Se evidencia que la terminación de la fibra óptica se encuentra fusionada en |
| INYECTOR POE                         |                                                                              |
| Existe Inyector PoE:                 | NO                                                                           |
| Requiere Inyector PoE:               | NO                                                                           |
| PATCH CORD                           |                                                                              |
| Existe Patch Cord:                   | SI                                                                           |
| Estado Patch Cord:                   | BUENO                                                                        |
| Requiere Patch Cord:                 | NO                                                                           |
| PATCH PANEL                          |                                                                              |
| Existe Patch Panel:                  | NO                                                                           |
| Requiere Patch Panel:                | NO                                                                           |
| Requiere Toma RJ45:                  | NO                                                                           |
| ORGANIZADOR DE CABLEADO              |                                                                              |
| Existe Organizador de Cableado:      | NO                                                                           |
| Requiere Organizador de Cableado:    | NO                                                                           |
| CONVERTIDOR MONOMODO                 |                                                                              |
| Existe Convertidor Monomodo:         | NO                                                                           |
| Requiere Convertidor Monomodo:       | NO                                                                           |
| MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO |                                                                              |
| Existe Módulo Óptico:                | SI                                                                           |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Estado Módulo Óptico:   | BUENO |
| Requiere Módulo Óptico: | NO    |
| SWITCH                  |       |
| Existe Switch:          | SI    |
| Estado Switch:          | BUENO |



|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Requiere Switch:                | NO                                                |
| CÁMARA                          |                                                   |
| Existe Cámara:                  | NO                                                |
| ¿Requiere Cámara?               | SI                                                |
| Tipo de Cámara requerida:       | LPR                                               |
| Cantidad de cámaras requeridas: | 1                                                 |
| Requiere Burbuja Domo PTZ:      | NO                                                |
| Cantidad Burbuja Domo PTZ (un): | 0                                                 |
| Observaciones Cámara:           | Punto de Cámara Vandalizado, pendiente cámara LPR |
| ENRUTADOR VPN                   |                                                   |
| Existe Enrutador VPN:           | NO                                                |
| EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS      |                                                   |
| Existe Equipo TX/RX:            | NO                                                |
| Requiere Equipo TX/RX:          | NO                                                |

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

|                                                               |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDAD EXTRA                                               |                                                                                                                                                                                           |
| ¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto? | SI                                                                                                                                                                                        |
| ACTIVIDAD EXTRA 1                                             |                                                                                                                                                                                           |
| Descripción de la actividad                                   | ADQUISICION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 8 SC/LC, IP 65, ENTRADA 2 x (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. |
| Unidad                                                        | UN                                                                                                                                                                                        |
| Cantidad                                                      | 1                                                                                                                                                                                         |
| Justificación                                                 | Se requiere la instalación de una Caja de Distribución Óptica (OB), con el fin                                                                                                            |



de brindar mayor seguridad, organización y protección a los pigtails que realizan la conexión hacia el switch.



7. CONCLUSIONES GENERALES

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado general de funcionamiento                                                      | FUERA_SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Requiere mantenimiento:                                                               | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seleccione el tipo de manteniemento:                                                  | CORRECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico | Se requiere realizar mantenimiento correctivo en el punto de cámara, que incluye la instalación de la protección IP, el reemplazo de la UPS defectuosa, la instalación y configuración de la cámara LPR y la limpieza general de todos los componentes asociados al sistema, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa. |

8. CONTROL DE APROBACIÓN
