



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Betania
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	29/07/2026
Vereda / sector	TRAVIESAS
Dirección del punto / sector	Carrera 7 15 1-99, Betania, Antioquia
Latitud	5.745795363233797
Longitud	-75.97835552231471
Coordenadas formulario	-75.98_5.75

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 5 San Vicente



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	SI
Nombre del funcionario	Julio Marin
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

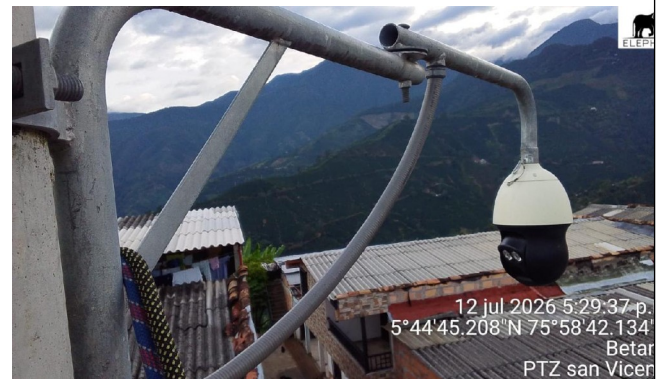

3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 7 con calle 23
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		BUENO
		
Requiere Gabinete Metálico:		No
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:		BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		

Existe Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO

 CORONA ANTIESCALATORIA


Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
----------------------------------	----

 BRAZO DE SOPORTE

Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO

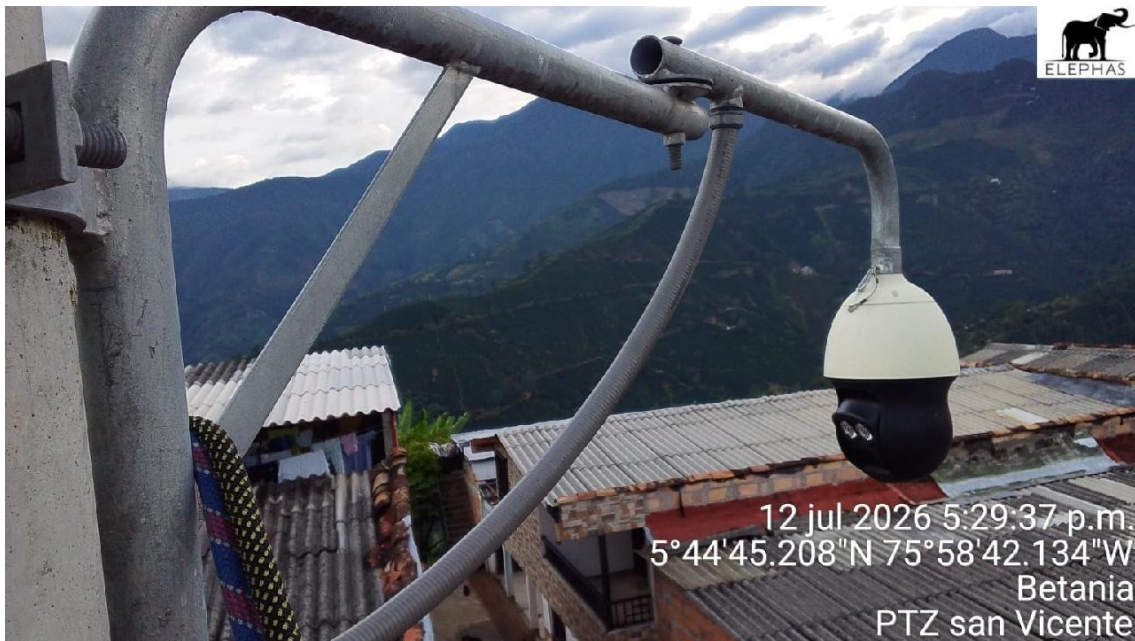

Requiere Brazo de Soporte:	SI
Observaciones Brazo:	Desde la secretaria de gobierno y el comandante de la estacion de policia

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Foto Cables	
 12 jul 2026 5:27:40 p.m. 5°44'45.125"N 75°58'41.63"W Betania PTZ san Vicente	
Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:

NO

 TUBERÍA

Existe Tubería:

NO

Requiere Tubería:

NO

 CORAZA

Existe Coraza:

SI

Estado Coraza:

BUENO

Foto Coraza



Requiere Coraza 3/4":

NO

 UPS

Existe UPS:

SI

Estado UPS:

BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:

NO

BATERÍAS UPS

Existen Baterías UPS:

NO

Requiere Baterías UPS:

NO

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)


Existe SPT:

SI

Estado SPT:

BUENO

Foto SPT

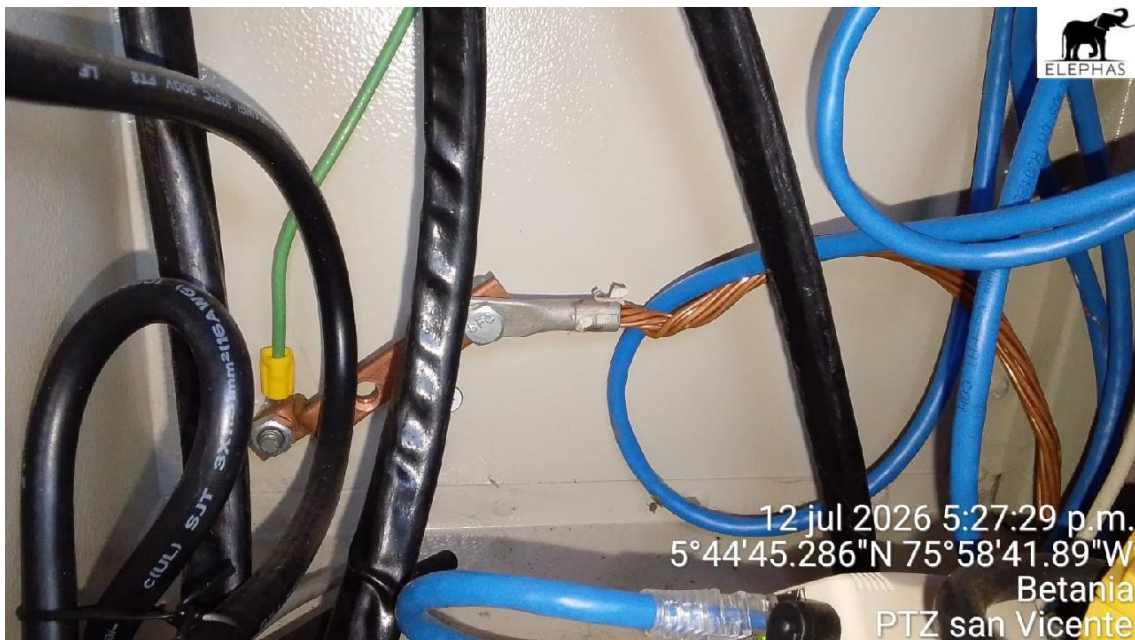

Requiere SPT:

NO

PROTECCIÓN

Existe Protección:

NO

Requiere Protección:


SI

Tipo de Protección requerida:

PROTECCION_ELECTRICA

Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	Se requiere DPS
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V

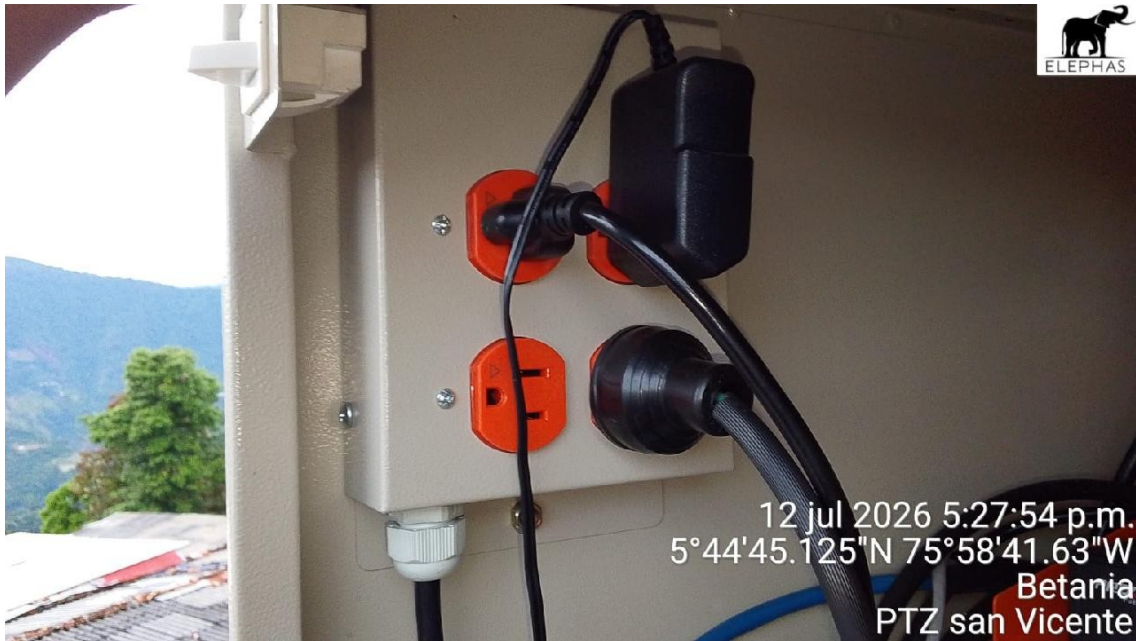

Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS


FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSEPTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO

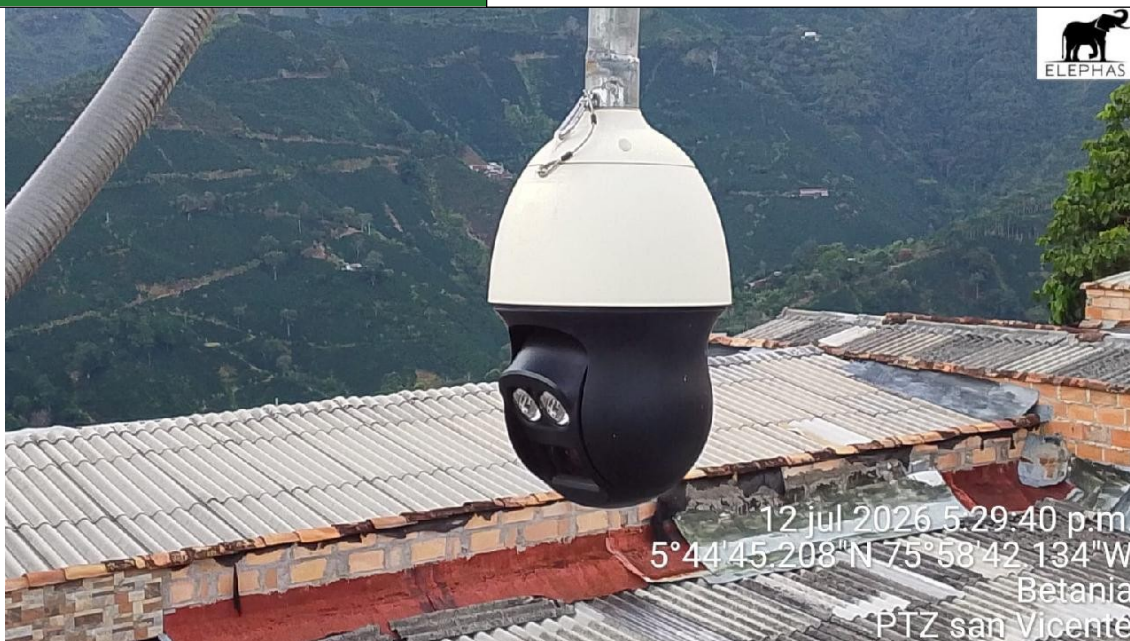

¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
	 ENRUTADOR VPN
Existe Enrutador VPN:	NO
	 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS
Existe Equipo TX/RX:	NO

Requiere Equipo TX/RX:	NO
------------------------	----

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Desde la secretaria de gobierno y el comandante de la estacion de policia solicitan el cambio de brazo por uno con una longitud mayor, para mejorar el angulo de vista dado que se realizaron construcciones que obstruyen la vista actual

8. CONTROL DE APROBACIÓN
