



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Jericó
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	12/08/2026
Dirección del punto / sector	Parque Principal
Latitud	5.791017392464236
Longitud	-75.78631372694394
Coordenadas formulario	-75.79_5.79

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 9 Alcaldía



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	RADIO_ENLACE
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	SI
Seleccione el medio de comunicación a actualizar para	FO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

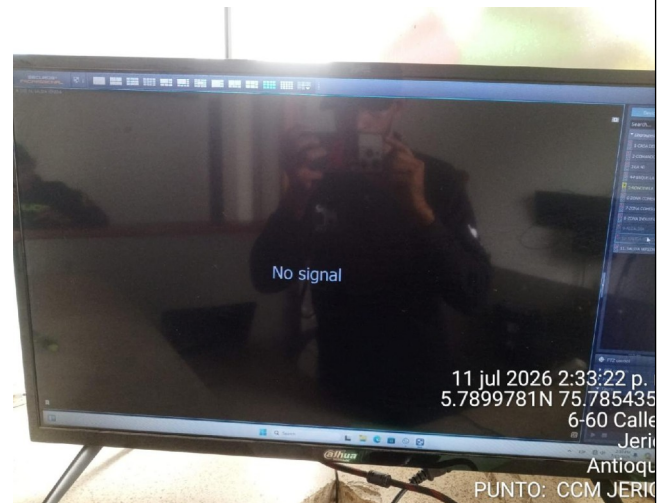

3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 5 con calle 7
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO
 12 jul 2026 8:44:10 a.m. 5.79094051N 75.78620994W 7-03 Carrera 5 Jericó Antioquia ALCALDIA	
Requiere Cambio de anclaje:	NO
 GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	BUENO
 12 jul 2026 8:49:06 a.m. PUNTO: ALCALDIA	
Requiere Gabinete Metálico:	No
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	NO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	NO

Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Observaciones Infraestructura Subterránea:	Se necesita caja de 50x50 para la instalacion de SPT
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO

Foto Cables



Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
💡 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	NO
🔧 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
💧 CORAZA	
Existe Coraza:	NO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:	NO
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	NO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



12 jul 2026 8:50:31 a. m.
5.790998333333333N 75.78628166666667W
7-03 Carrera 5
Jericó
Antioquia
PUNTO: ALCALDÍA

Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANCEPTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	NO
📷 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	SI
Estado Equipo TX/RX:	MALO
Requiere Equipo TX/RX:	NO
Observaciones Equipo TX/RX:	EL punto sera migrado a FO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUERA_SERVICIO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se debe construir caja de 50x50, suministrar e instalar Corona, DPS y SPT

8. CONTROL DE APROBACIÓN
