



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Caramanta
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	07/08/2026
Dirección del punto / sector	Calle 20 20 2-40, Caramanta, Antioquia
Latitud	5.549220882153232
Longitud	-75.6442819404197
Coordenadas formulario	-75.64_5.55

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 3 Fachada Parque



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	RADIO_ENLACE
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2

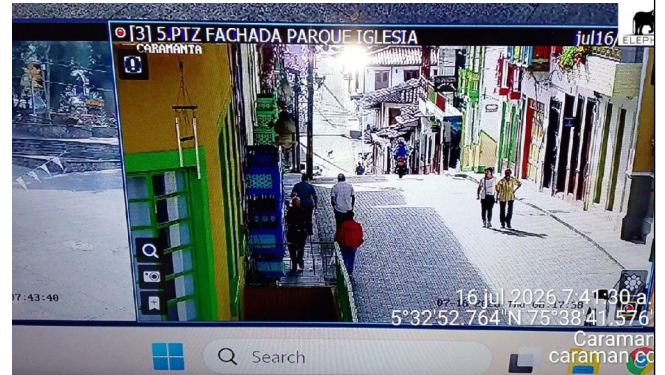


Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	FACHADA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 20 con Calle 20
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO

 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

MALO



Requiere Gabinete Metálico:

No

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

El punto requiere de cambio de gabinete

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

NO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

NO

Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	SI
Observaciones Transformador:	El gabinete no cuenta con espacio ni tiene transformador
TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Foto Coraza  16 jul 2026 9:07:34 a.m. 5°32'57.207"N 75°38'39.184"W Caramanta caraman fachada parque iglesia	
Requiere Coraza 3/4":	NO
UPS	
Existe UPS:	NO

Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	El punto actualmente no cuenta con respaldo de energia
🔌 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	NO
🔒 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	El Gabinete no cuenta con DPS para la protección de los Equipos
🔌 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	REGULAR

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
🔌 CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	NO
Requiere Fibra Óptica:	NO
🔌 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	NO
📷 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	SI
Estado Equipo TX/RX:	BUENO



Requiere Equipo TX/RX:	NO
------------------------	----

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA

¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	OE5
Descripción de la actividad	ADQUISICION GABINETES DE POSTE/FACHADA, min 11U, NEMA 4, TECHO INCLINADO, ESPACIO PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS (BARRAJE DE COBRE, CABLEADO, TRANSFORMADOR, TRANSMISOR DE VIDEO, ESTABILIZADOR O REGULADORES DE VOLTAJE), INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO P
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El gabinete actual no cumple con las normas técnicas
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	OE8
Descripción de la actividad	INSTALACION GABINETES DE POSTE/FACHADA, min 11U, NEMA 4, TECHO INCLINADO, ESPACIO PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS (BARRAJE DE COBRE, CABLEADO, TRANSFORMADOR, TRANSMISOR DE VIDEO, ESTABILIZADOR O REGULADORES DE VOLTAJE), INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO P
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere le cambio de Gabinete
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	EL punto requiere de mantenimiento correctivo, cambio de gabinete, suministro de UPS, Transformador de voltage y proteccion DPS, para mejorar la seguridad de los equipos

8. CONTROL DE APROBACIÓN
