


Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Fredonia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	21/08/2026
Dirección del punto / sector	Calle 50 50 2-100, Fredonia, Antioquia
Latitud	5.927150973279468
Longitud	-75.6722007690669
Coordenadas formulario	-75.67_5.93

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 8 Parque 1

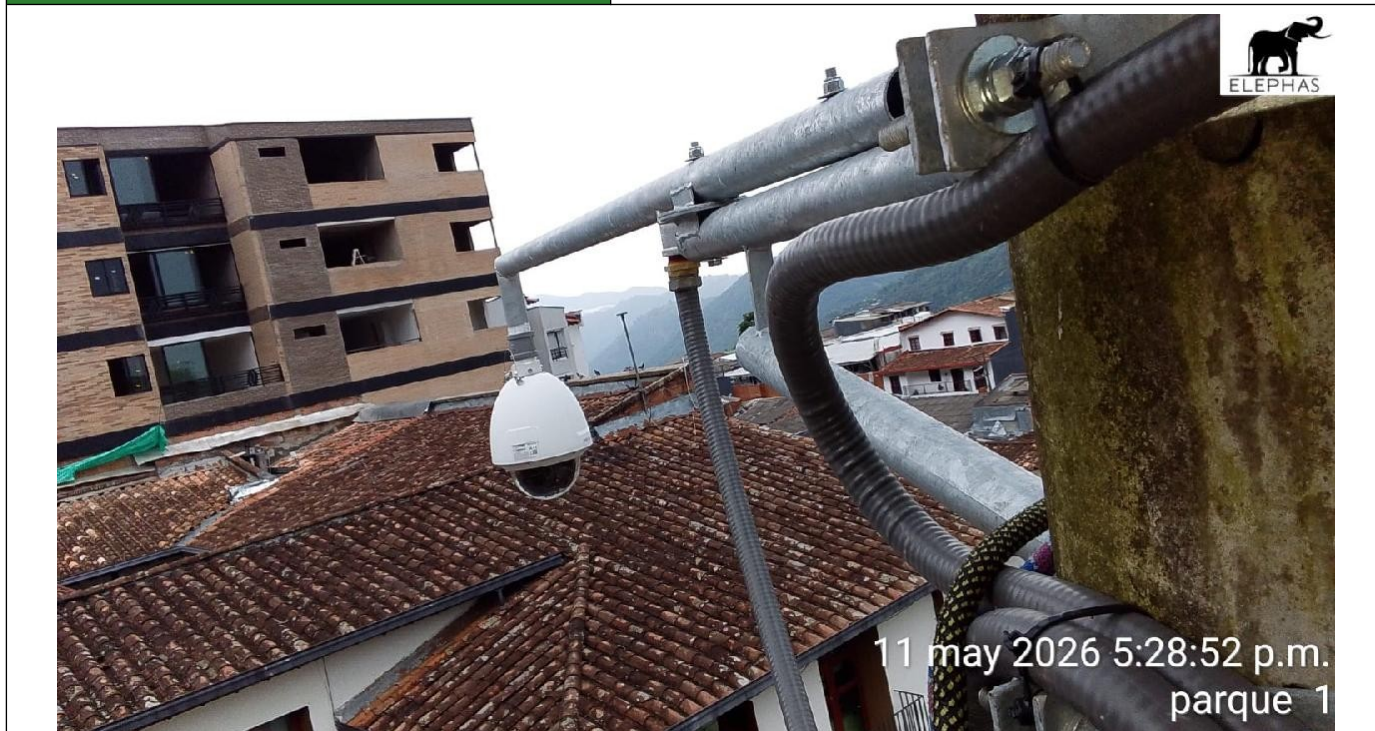

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2

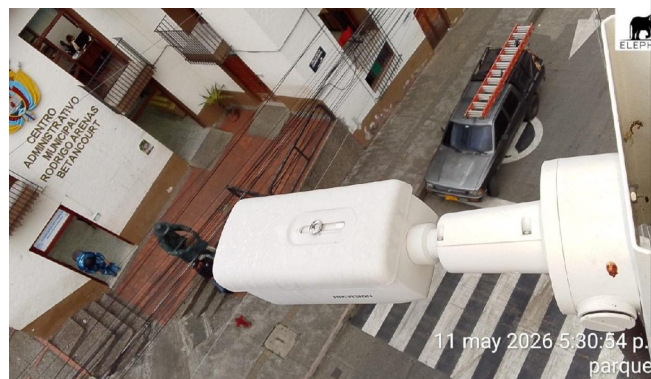


Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	ENERGIA
Dirección de referencia del anclaje	Calle 50 con Carrera 51
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO


 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO

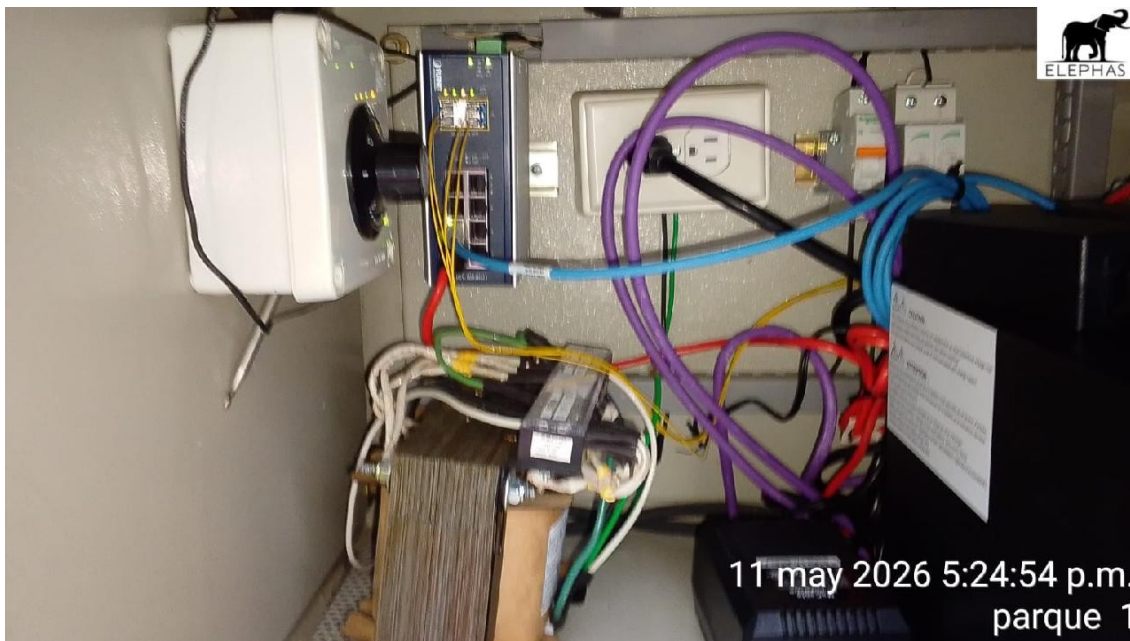

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:

CAJA_50X50

Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO



Requiere Brazo de Soporte:	NO
----------------------------	----

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO


Foto Cables



11 may 2026 5:24:49 p.m.
parque 1

Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor

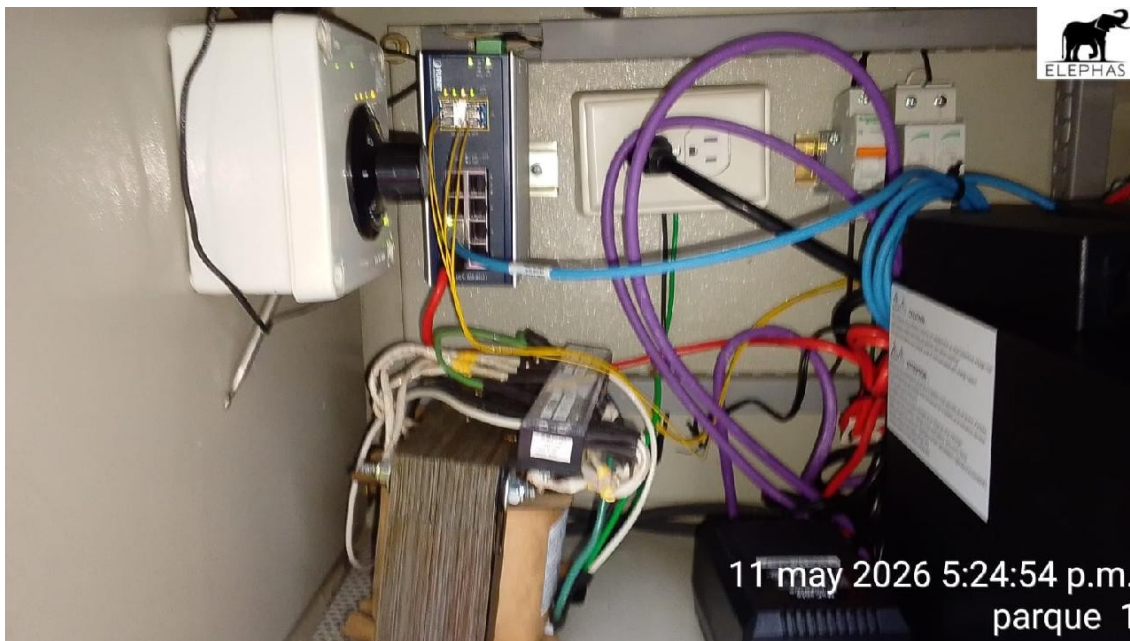

11 may 2026 5:24:54 p.m.
parque 1

Requiere Transformador Reductor:	NO
🔌 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO

Requiere Tubería:	NO
	 CORAZA
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
	 UPS
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS




Requiere UPS:	NO
	 BATERÍAS UPS
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
	 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Requiere SPT:	NO
	 PROTECCIÓN
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	NO
	 TOMA 125 V
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
	 CANALETA PLÁSTICA
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

	 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO

Requiere Fibra Óptica:	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO

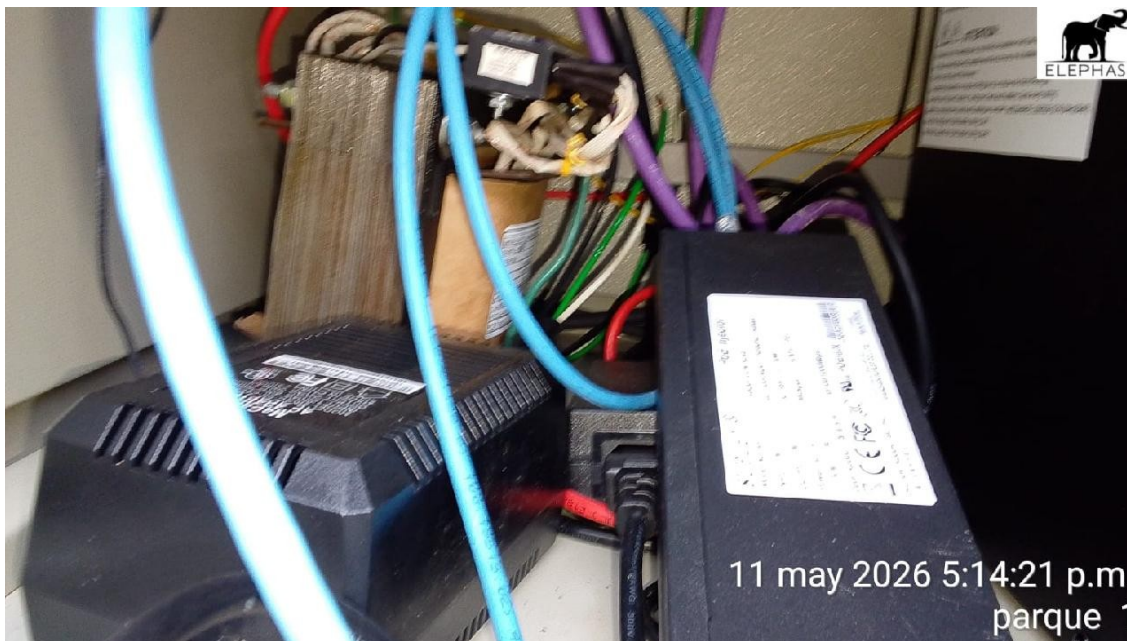

Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	2
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



	CÁMARA EXISTENTE 2
Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	el punto se encuentra operativo, requiere mantenimiento preventivo

8. CONTROL DE APROBACIÓN
