

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	La Pintada
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	12/08/2026
Vereda / sector	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección del punto / sector	Via 25, La Pintada, Antioquia
Latitud	5.741551096219552
Longitud	-75.60716754641318
Coordenadas formulario	-75.61_5.74

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Guardia de Estacion de Policia

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernacion de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	SI
Medio de comunicación a actualizar:	FO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	SI
Otro uso del espacio del CCM:	La Guardia de la estacion
Administrador del CCM:	Comandante de estacion
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  4 jul 2026 12:10:44 5.7416N 75.6072W # 30-140 Calle 30A LA PINTADA CCM	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	NO
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Foto tablero breaker  4 jul 2026 07:19:10 5.7415N 75.6072W # 30-140 Calle 30A LA PINTADA CCM	
Existe breaker:	NO


¿Requiere breaker?	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	NO
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma

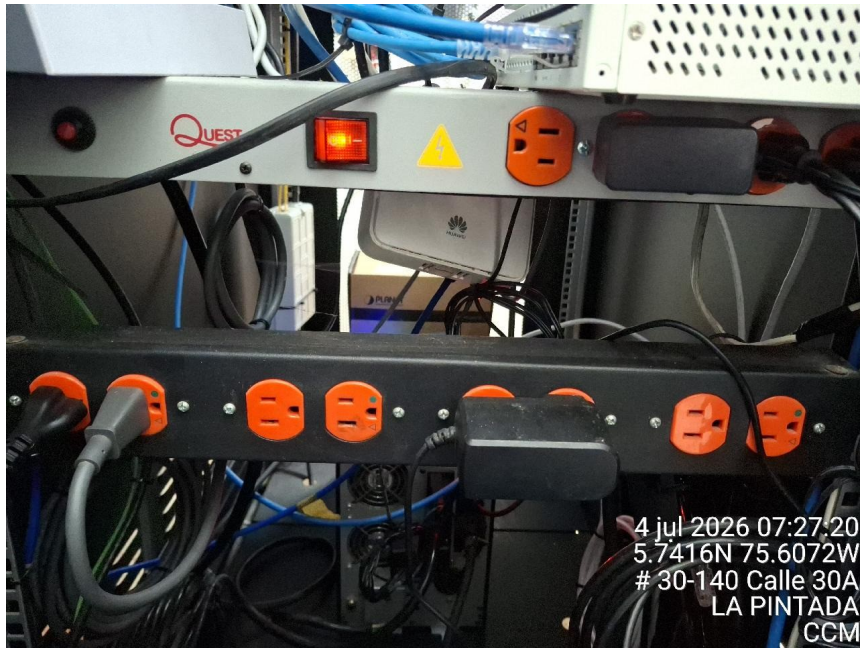


¿Requiere PDU multitoma?	NO
⚡ TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
🔧 CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

📶 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	SI
Estado punto físico de repetición:	BUENO
¿Requiere mantenimiento?	NO
⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica

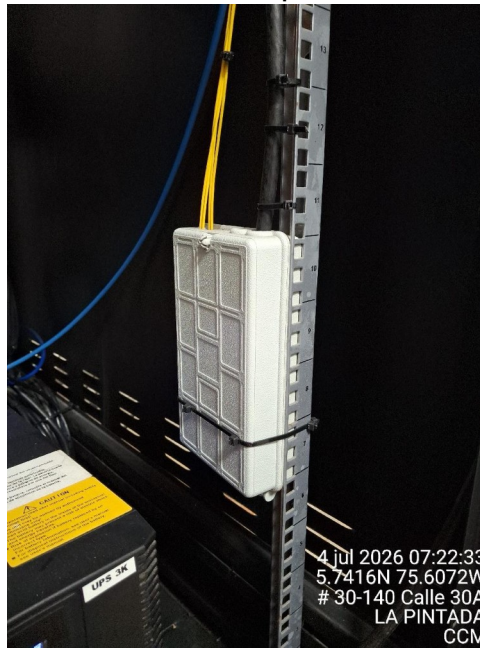

4 jul 2026 07:22:33
5.7416N 75.6072W
30-140 Calle 30A
LA PINTADA
CCM

¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF

Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



4 jul 2026 07:22:52
5.7416N 75.6072W
30-140 Calle 30A
LA PINTADA
CCM

¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

NO

¿Requiere inyector PoE?

NO

PATCH CORD


Existe patch cord:

SI

Estado patch cord:

BUENO

Foto patch cord

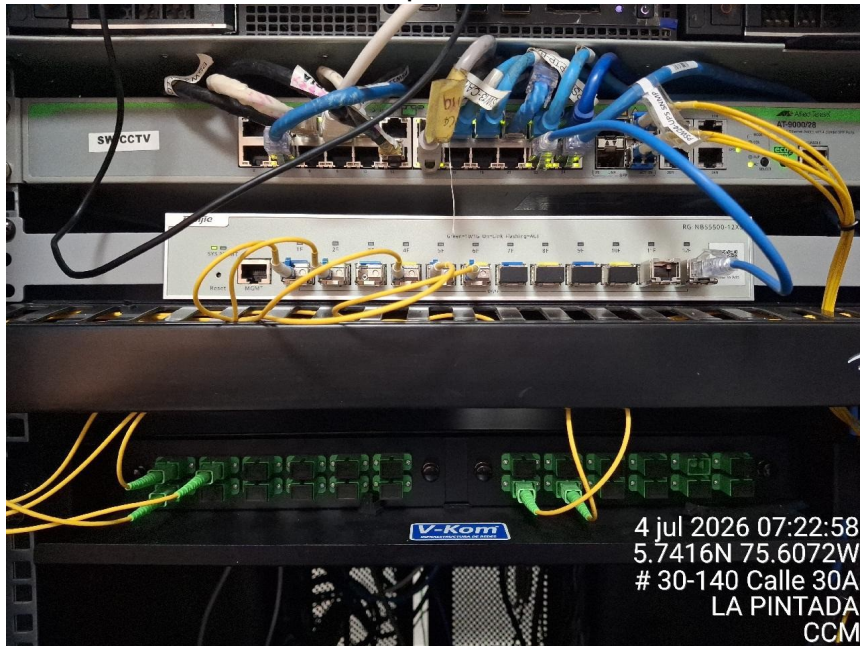

¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL

Existe patch panel:

NO

¿Requiere patch panel?

NO

¿Requiere toma RJ45?

NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO


Existe organizador de cableado:

SI

Estado organizador de cableado:

BUENO

Foto organizador de cableado

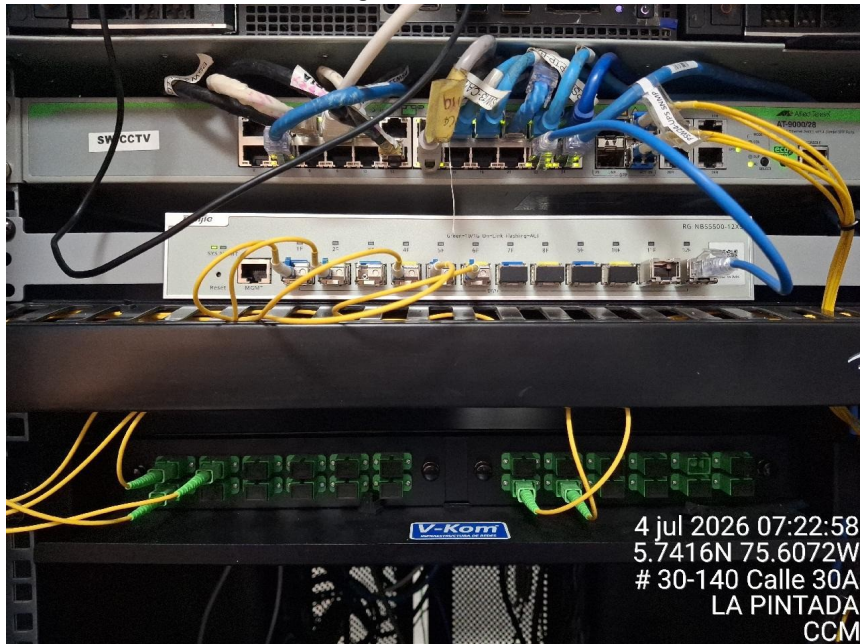

¿Requiere organizador de cableado?

SI

Cantidad organizador de cableado (un):

2

Observaciones organizador de cableado:

se requiere de 2 Organizadores, para mejorar la visual de los cables en el rack


CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO

MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico:	SI
Estado módulo óptico:	BUENO

Foto módulo óptico

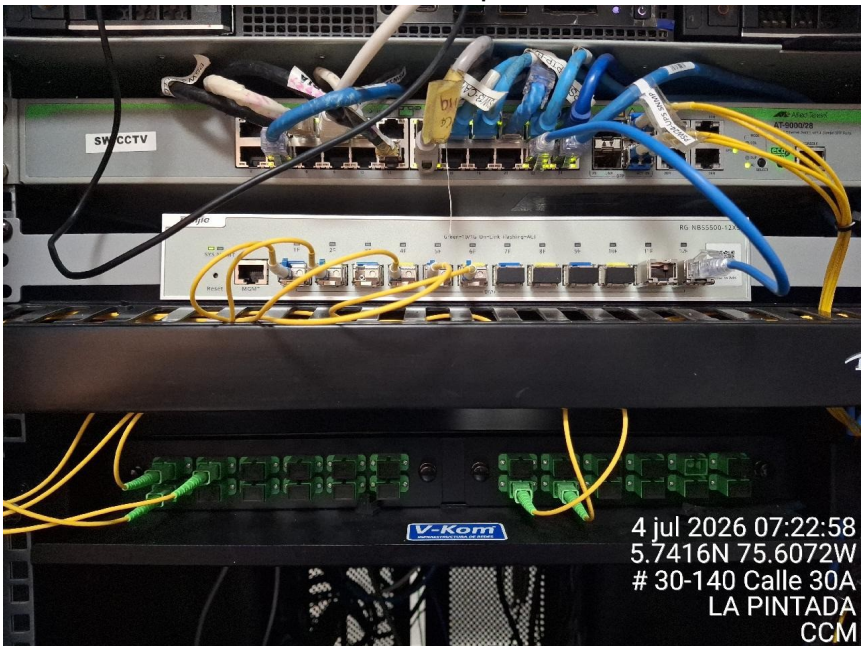


¿Requiere módulo óptico?	NO
--------------------------	----

SWITCH

Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO

Foto switch

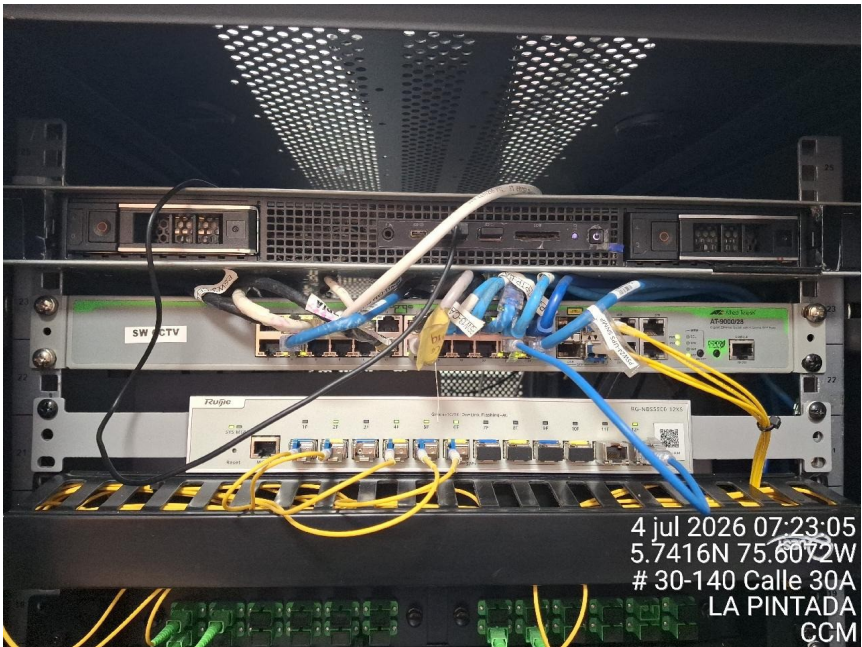

¿Requiere switch?	NO
-------------------	----

DISCO DURO

Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO

FIREWALL

Existe firewall:	SI
Estado firewall:	BUENO

Foto firewall



¿Requiere instalación de firewall?	NO
------------------------------------	----

ENRUTADOR VPN

Existe enrutador VPN:	SI
Estado enrutador VPN:	BUENO

Foto enrutador VPN



EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe equipo TX/RX:	SI
Estado equipo TX/RX:	BUENO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO

EQUIPO A/C MINI SPLIT

Existe equipo A/C mini split:	SI
-------------------------------	----

Estado equipo A/C mini split:		REGULAR
Foto equipo A/C mini split		
		
4 jul 2026 07:19:28 5.7416N 75.6072W # 30-131 Calle 30A LA PINTADA CCM		
¿Requiere equipo A/C mini split?		NO
Observaciones equipo A/C mini split:		El aire presenta fuga, requiere de mantenimiento correctivo
ELECTROIMÁN 600 LB		
Existe electroimán 600 lb:		NO
¿Requiere electroimán 600 lb?		NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR		
Existe servidor NVR:	SI	
Estado servidor NVR:	BUENO	
Foto servidor NVR		
		
4 jul 2026 07:24:11 5.7416N 75.6072W # 30-140 Calle 30A LA PINTADA CCM		
¿Requiere servidor NVR?		Si
Cantidad servidor NVR (un):		1

LICENCIAS	
Existen licencias:	SI
Foto licencias	

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

MONITOR	
Existe monitor:	SI
Cantidad monitor existente (un):	1
Estado monitor:	BUENO
Foto monitor	
¿Requiere monitor?	NO
ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	NO
¿Requiere estación de trabajo?	SI
Cantidad requerida (un):	1

Observaciones estación de trabajo:	Se requiere de una estacion de trabajo
🎮 JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
🔌 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	BUENO
¿Requiere cable HDMI?	NO
💡 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	BUENO
Foto luminarias	
	
4 jul 2026 07:21:01 5.7415N 75.6073W 29-44 Carrera 32 LA PINTADA CCM	
🔥 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
🚪 PUERTAS	
Existen puertas:	SI
Estado puertas:	MALO

Foto puertas



Observaciones puertas:	La puerta se encuentra colgada
VENTANAS	
Existen ventanas:	SI
Estado ventanas:	BUENO
CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	SI
Estado cerramiento:	REGULAR
Observaciones cerramiento:	requiere pintura

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	MAN-OE1MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe de realizar mantenimiento correctivo al aire acondicionado ya que presenta fuga
Archivo APU adjunto	APU MAN-OE1 CORRECTIVO AIRES-168e03abd80a4e3abb42dd5980d44b35.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	OE11
Descripción de la actividad	INST-OE11Instalacion de organizador de cableado en rack, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. .
Unidad	UN
Cantidad	2
Justificación	Se necesita la instalacion de 2 organizadores
Archivo APU adjunto	APU INST-OE11 ORGANIZADOR-219bdd3e8e824070865245de985d0717.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	Se sugiere la instalacion de una estacion de trabajo, 2 organizadores de cableado,

9. CONTROL DE APROBACIÓN
