



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	La Pintada
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	12/08/2026
Dirección del punto / sector	Calle 33, La Pintada, Antioquia
Latitud	5.747239188101283
Longitud	-75.6081240883379
Coordenadas formulario	-75.61_5.75

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 16 Tablaza



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2

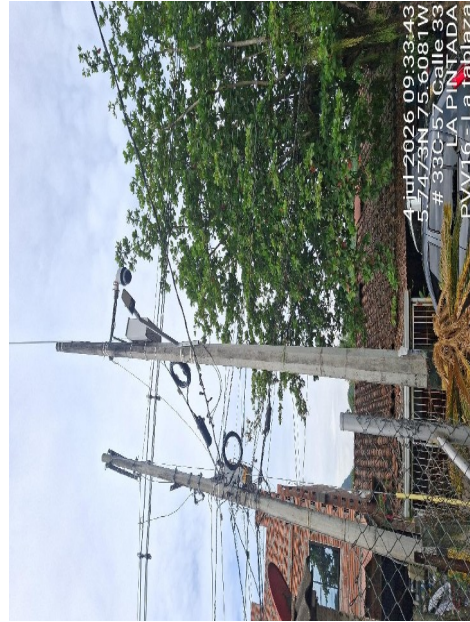


Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 32 N° 29-20
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
 GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		BUENO
		
Requiere Gabinete Metálico:		No
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:		BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		

Existe Infraestructura Subterránea:	NO
Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50_PROY
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO

Foto Cables



Requiere Cables:

NO

⚡ TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:

NO

Existe Breaker:

SI

Estado Breaker:

BUENO

Foto Breaker



Requiere Breaker:

NO

⚡ TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor:

NO

Requiere Transformador Reductor:

SI

🔧 TUBERÍA

Existe Tubería:

NO

Requiere Tubería:

NO

 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
 UPS	
Existe UPS:	NO
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI
 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	NO
 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
 CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
 PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
 MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO

SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO
Requiere Switch:	NO
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO
	
¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	SI
Estado Equipo TX/RX:	BUENO
Requiere Equipo TX/RX:	NO
Observaciones Equipo TX/RX:	Se debe desmontar el radio, ya fue migrado a FO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	OE05
Descripción de la actividad	SUM-OE05 ADQUISICION GABINETES DE POSTE/FACHADA, min 11U
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El Gabinete actual no cumple con el espacio suficiente para montar los equipos de manera funcional y organizada
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE.xlsx

Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	OE08
Descripción de la actividad	INST-OE08 INSTALACIÓN GABINETES DE POSTE/FACHADA, min 11U
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El Gabinete actual no cumple con el espacio suficiente para montar los equipos de manera funcional y organizada
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-b62a6f759c4c4a0aa291e8f669a5172f.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	OE13
Descripción de la actividad	INST-OE13 Instalación de corona antiescalatoria
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El punto no cuenta con corona antiescalatoria
Archivo APU adjunto	APU INST-OE13 CORONA-c6afcf28cfe54f97b36c71d18aab5e25.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	El Gabinete actual no cumple con el espacio suficiente para montar los equipos de manera funcional y organizada

8. CONTROL DE APROBACIÓN
