



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Pueblorrico
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	27/08/2026
Dirección del punto / sector	Calle 31, Pueblorrico, Antioquia
Latitud	5.793069131182429
Longitud	-75.83788050668133
Coordenadas formulario	-75.84_5.79

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 10 Cuatro Esquinas



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Calle 31 con carrera 25
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO
 13 jul 2026 2:40:35 p.m. 5.79307822N 75.83781395W # 25-4 Calle 31 Pueblorrico Antioquia 4 ESQUINAS	
Requiere Cambio de anclaje:	NO
 GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	BUENO
 13 jul 2026 1:26:37 p. m. 5.793093333333333N 75.83786833333333W # 25-71 Calle 31 Pueblorrico Antioquia 4 ESQUINAS	
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:	BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	BUENO
 13 jul 2026 2:41:04 p.m. 5.79305586N 75.83790571W # 26-3 Calle 31 Pueblorrico Antioquia 4 ESQUINAS	
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
Observaciones Corona:	Se requiere de corona
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
 13 jul 2026 1:26:41 p. m. 5.793091666666667N 75.837855W # 25-71 Calle 31 Pueblorrico Antioquia 4 ESQUINAS	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO

⚡ TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO

Foto Breaker



Requiere Breaker:	NO
-------------------	----

🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR

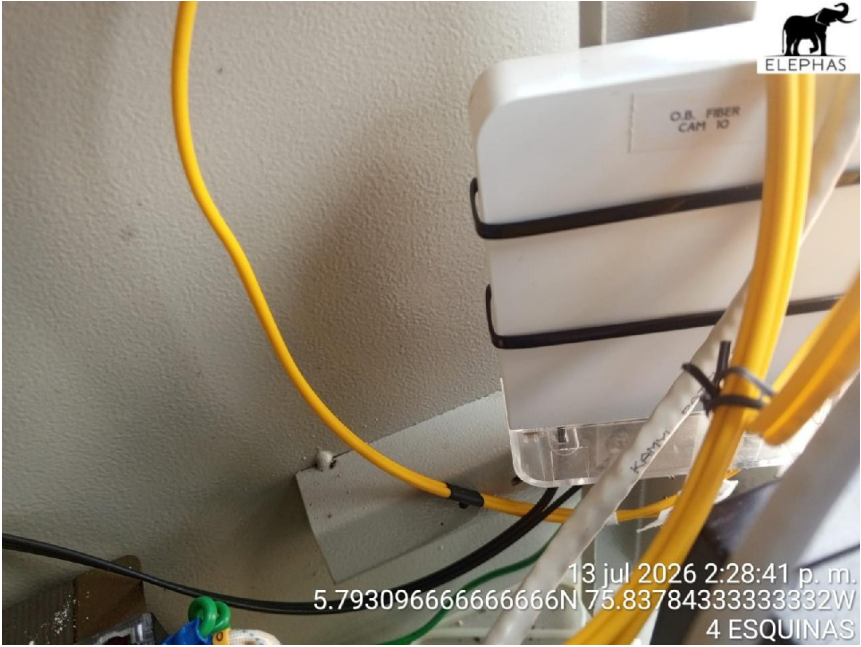
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:	NO
✂ TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
💧 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	REGULAR
Foto UPS	
	
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	El punto no cuenta con UPS, solo se tiene un regulador de voltaje de 750 VA
🔌 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Requiere SPT:	NO
🛡 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	NO
🔌 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
🔧 CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
	
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO
	
Requiere Inyector PoE:	NO
PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO

Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	SI
Estado Patch Panel:	BUENO



Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	3
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



	CÁMARA EXISTENTE 2
Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO



13 jul 2026 2:40:53 p.m.
5.79297179N 75.83790083W
26-3 Calle 31
Pueblorrico
Antioquia
4 ESQUINAS

CÁMARA EXISTENTE 3

Tipo de cámara

FIJA

Estado de la cámara

BUENO



13 jul 2026 2:40:35 p.m.
5.79307822N 75.83781395W
25-4 Calle 31
Pueblorrico
Antioquia
4 ESQUINAS

¿Requiere Cámara?

NO

Requiere Burbuja Domo PTZ:

NO

ENRUTADOR VPN

Existe Enrutador VPN:

NO

EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe Equipo TX/RX:

NO

Requiere Equipo TX/RX:

NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE13
Descripción de la actividad	Instalacion de corona antiescalatoria
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se recomienda la Instalacion de corona antiescalatoria
Archivo APU adjunto	APU INST-OE13 CORONA-0e2fb20ccc154a609c3ff752a9a814b7.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de manteniemento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se recomienda la instalacion de 1 UPS y una corona

8. CONTROL DE APROBACIÓN
