



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Pueblorrico
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	27/08/2026
Dirección del punto / sector	Calle 30, Pueblorrico, Antioquia
Latitud	5.791463550790717
Longitud	-75.83799283489128
Coordenadas formulario	-75.84_5.79

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 11 Galeria



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Calle 30 con carrera 25
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO


Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO
 13 jul 2026 2:45:35 p.m. 5.7915259N 75.8380516W # 25-136 Calle 30 Pueblorrico Antioquia GALLERA	
Requiere Cambio de anclaje:	NO
 GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	BUENO
 13 jul 2026 2:52:43 p.m. GALLERA	
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:	BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	NO

Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
Observaciones Corona:	El punto no cuenta con corona
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO

Foto Breaker

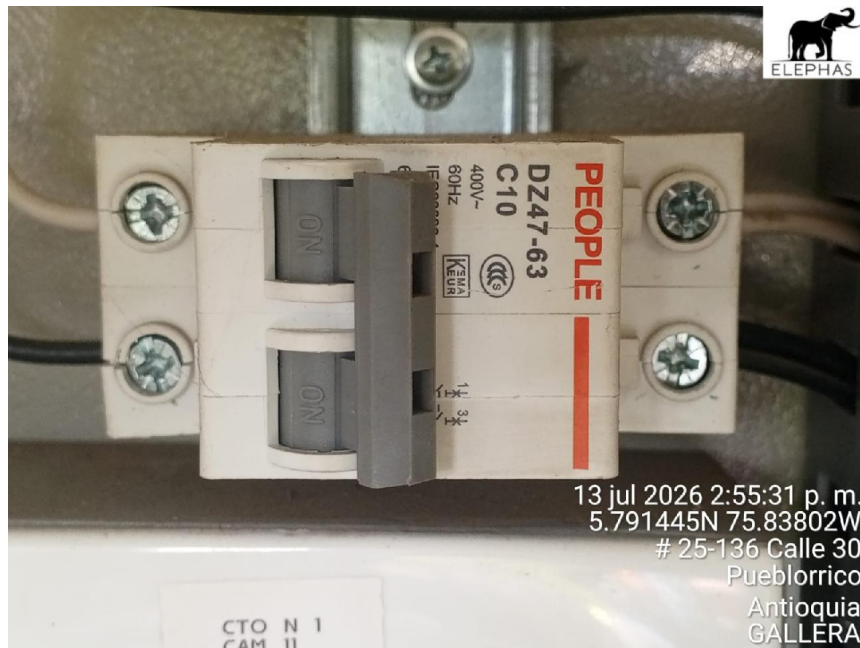

Requiere Breaker: NO

TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor: SI

Estado Transformador Reductor: BUENO

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor: NO

TUBERÍA

Existe Tubería: NO

Requiere Tubería: NO

CORAZA

Existe Coraza: SI

Estado Coraza: BUENO

Requiere Coraza 3/4": NO

📍 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	REGULAR
Foto UPS	
 13 jul 2026 2:55:53 p. m. 5.791445N-75.83802W # 25-136 Calle 30 Pueblorrico Antioquia GALLERA	
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	El punto no cuenta con UPS, tiene un regulador de 750 VA
📍 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Requiere SPT:	NO
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO

Foto Protección



Requiere Protección:	NO
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



Requiere Fibra Óptica:	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	SI
Estado Convertidor Monomodo:	BUENO



13 jul 2026 2:55:02 p.m.
5.79145333333334N 75.837995W
26-5 Calle 30'
Pueblorrico
Antioquia
GALLERA

Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	NO
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE13
Descripción de la actividad	Instalacion de corona antiescalatoria
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se propone la Instalacion de corona antiescalatoria
Archivo APU adjunto	APU INST-OE13 CORONA-887cb7902b8b4f6594714bdf5babdbbd.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se propone la instalaion de corona y UPS

8. CONTROL DE APROBACIÓN
