



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO


Municipio	Pueblorrico
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	27/08/2026
Dirección del punto / sector	056440, Pueblorrico, Antioquia
Latitud	5.790029629845724
Longitud	-75.83594822618815
Coordenadas formulario	-75.84_5.79

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 12 La Piscina



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

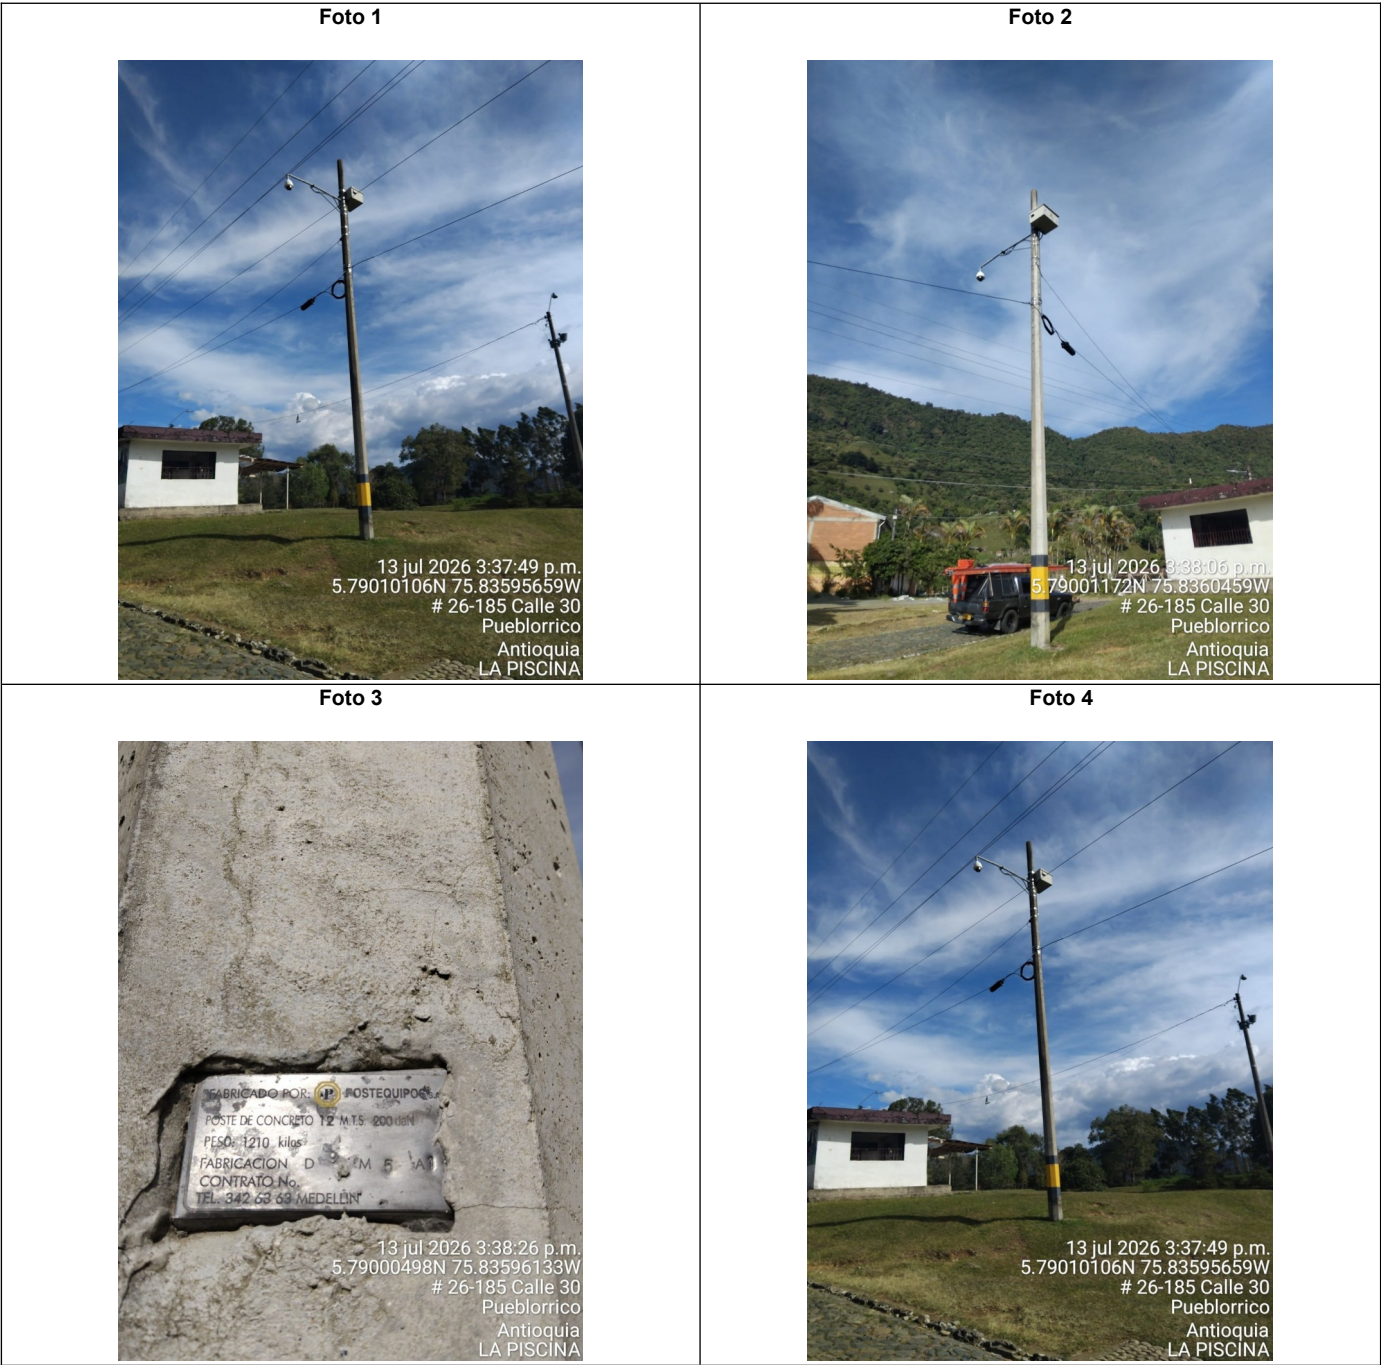

3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Calle 30 Con carrera 26
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO
 13 jul 2026 3:38:06 p.m. 5.79001172N 75.8360459W # 26-185 Calle 30 Pueblorrico Antioquia LA PISCINA	
Requiere Cambio de anclaje:	NO
 GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	BUENO
 13 jul 2026 3:23:12 p. m. 5.790054999999999N 75.83579W # 25-16 Calle 31 Pueblorrico Antioquia LA PISCINA	
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:	BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	BUENO
 13 jul 2026 3:38:21 p.m. 5.79001085N 75.83597348W # 26-185 Calle 30 Pueblorrico Antioquia LA PISCINA	
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
Observaciones Corona:	El punto no cuenta con corona
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
 13 jul 2026 3:23:15 p. m. 5.790058333333335N 75.83582500000001W # 25-16 Calle 31 Pueblorrico Antioquia LA PISCINA	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO

⚡ TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO

Foto Breaker



Requiere Breaker:	NO
-------------------	----

🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:	NO
✂ TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
🔵 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	REGULAR
Foto UPS	
	
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	El punto no cuenta con UPS, tiene un regulador de voltage
🔌 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO

Foto SPT



Requiere SPT:	NO
	 PROTECCIÓN
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO

Foto Protección



Requiere Protección:	NO
	 TOMA 125 V
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
	 CANAleta PLÁSTICA
Existe Canaleta Plástica:	NO

Requiere Canaleta Plástica 100x45:

NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:

SI

Estado Fibra Óptica:

BUENO



Requiere Fibra Óptica:

NO

INYECTOR POE

Existe Inyector PoE:

NO

Requiere Inyector PoE:

NO

PATCH CORD

Existe Patch Cord:

SI

Estado Patch Cord:

BUENO

Requiere Patch Cord:

NO

PATCH PANEL

Existe Patch Panel:

NO

Requiere Patch Panel:

NO

Requiere Toma RJ45:

NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe Organizador de Cableado:

NO

Requiere Organizador de Cableado:

NO

CONVERTIDOR MONOMODO

Existe Convertidor Monomodo:

SI

Estado Convertidor Monomodo:

BUENO



Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	NO
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE13
Descripción de la actividad	Instalacion de corona antiescalatoria
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se sugiere la Instalacion de corona antiescalatoria
Archivo APU adjunto	APU INST-OE13 CORONA-a2d0891186844e52afc6c9131c8da6de.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se sugiere la Instalacion de corona antiescalatoria y UPS

8. CONTROL DE APROBACIÓN
