



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Pueblorrico
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	27/08/2026
Dirección del punto / sector	Calle 32 27 1-99, Pueblorrico, Antioquia
Latitud	5.79254831013162
Longitud	-75.84069178907109
Coordenadas formulario	-75.84_5.79

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 7 Parque Educativo



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Calle 32 con carrera 27
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO
 13 jul 2026 10:32:41 a.m. 5.79258013N 75.8407724W # 28-2 Calle 32 Pueblorrico Antioquia PARQUE EDUCATIVO	
Requiere Cambio de anclaje:	NO
GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	BUENO
 13 jul 2026 10:41:34 a.m. 5.792636666666667N 75.84070333333334W # 28-2 Calle 32 Pueblorrico Antioquia PARQUE EDUCATIVO	
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:	BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	BUENO
 13 jul 2026 10:32:20 a.m. 5.7925486N 75.84071662W # 27-27 Calle 32 Pueblorrico Antioquia PARQUE EDUCATIVO	
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
Observaciones Corona:	el punto no cuenta con corona
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
 13 jul 2026 10:41:40 a. m. 5.792619999999999N 75.84065333333334W # 28-2 Calle 32 Pueblorrico Antioquia PARQUE EDUCATIVO	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO

⚡ TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO

Foto Breaker




Requiere Breaker:	NO
-------------------	----

🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor

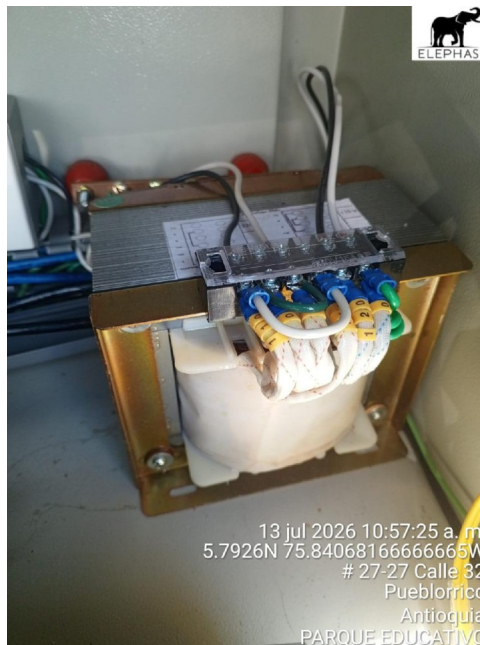

Requiere Transformador Reductor:	NO
✂ TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
💧 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	REGULAR
Foto UPS	
 13 jul 2026 10:57:07 a. m. 5.792601666666667N 75.84067499999999W # 27-27 Calle 32 Pueblorrico Antioquia PARQUE EDUCATIVO	
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	El puntot no cuenta con UPS cuenta es con un regulador de 750 VA
🔌 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Requiere SPT:	NO
🛡 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO

Foto Protección



Requiere Protección:	NO
	TOMA 125 V
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
	CANAleta PLÁSTICA
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



Requiere Fibra Óptica:	NO
 INYECTOR POE	

Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



Requiere Inyector PoE:	NO
 PATCH CORD	

Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO

PATCH PANEL

Existe Patch Panel:	SI
Estado Patch Panel:	BUENO



Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO

CONVERTIDOR MONOMODO

Existe Convertidor Monomodo:	SI
Estado Convertidor Monomodo:	BUENO



Requiere Convertidor Monomodo:	NO
--------------------------------	----

MÓDULO TRANCEPTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO

Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	2
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



CÁMARA EXISTENTE 2

Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE13
Descripción de la actividad	Instalacion de corona antiescalatoria
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se sugiere la Instalacion de corona antiescalatoria
Archivo APU adjunto	APU INST-OE13 CORONA-c30e5930f43f4e94a1e8f220786a150c.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de manteniemento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se propone la instalaion de 1 UPS y la corona

8. CONTROL DE APROBACIÓN
