



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Salgar
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	25/08/2026
Vereda / sector	MONTEBELLO ABAJO
Dirección del punto / sector	Calle 30 29 2-100, Salgar, Antioquia
Latitud	5.962499212437574
Longitud	-75.9782573990725
Coordenadas formulario	-75.98_5.96

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 2 DANUBIO



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

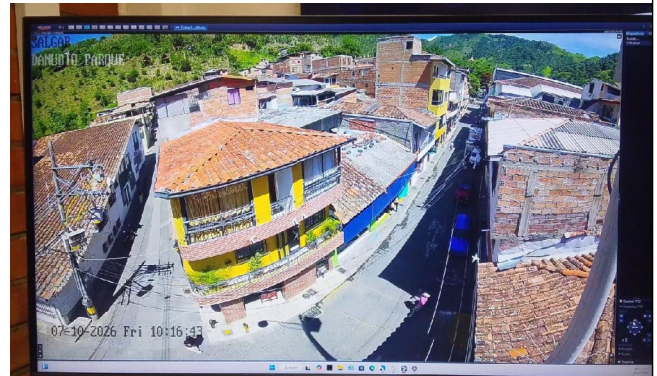

3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 29 con Calle30
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
 10 jul 2026 1:37:37 p.m. 5°57'44.793"N 75°58'41.648"W Salgar multi sensor Danubio la cita		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
 GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		BUENO
 10 jul 2026 1:52:52 p.m. 5°57'44.954"N 75°58'42.191"W Salgar multi sensor Danubio la cita		
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:		BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		
Existe Infraestructura Subterránea:		SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	BUENO
 10 jul 2026 1:38:14 p.m. 5°57'44.949"N 75°58'41.732"W Salgar multi sensor Danubio la cita	
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
 10 jul 2026 1:52:40 p.m. 5°57'45.116"N 75°58'42.114"W Salgar multi sensor Danubio la cita	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO

Foto Cables



Requiere Cables:	NO
------------------	----


⚡ TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO

🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor

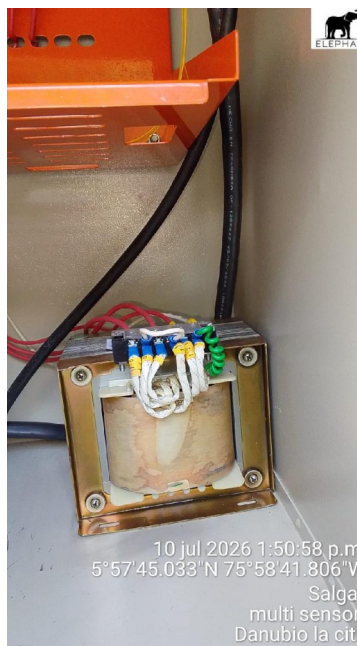

Requiere Transformador Reductor:	NO
✂ TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
🔵 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Foto Coraza	
 10 jul 2026 1:52:44 p.m. 5°57'45.116"N 75°58'42.114"W Salgar multi sensor Danubio la cita	
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Foto UPS	
 10 jul 2026 1:50:50 p.m. 5°57'45.033"N 75°58'41.806"W Salgar multi sensor Danubio la cita	
Requiere UPS:	NO

BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	SI
Estado Baterías UPS:	BUENO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Foto SPT	
 10 jul 2026 1:51:45 p.m. 5°57'44.995"N 75°58'42.559"W Salgar multi sensor Danubio la cita	
Requiere SPT:	NO
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	El Gabinete no cuenta con DPS para la protección de los Equipos
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	

Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



10 jul 2026 1:51:28 p.m.
5°57'46.641"N 75°58'42.969"W
Salgar
multi sensor
Danubio la cita

Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSCHEPTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	MULTI
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
	 ENRUTADOR VPN
Existe Enrutador VPN:	NO
	 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	El punto se encuentra operativo pero no cuenta con DPS para la protección de los equipos, y organización de los cables internos

8. CONTROL DE APROBACIÓN

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	07/09/2026
Aprobado por	JANIER_PIEDRAHITA
Observaciones aprobación	Se aprueba correctivo mas el DPS
