



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Valparaiso
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	26/08/2026
Vereda / sector	MACHONTA
Dirección del punto / sector	Carrera 9 9 1-99, Valparaiso, Antioquia
Latitud	5.616253531795027
Longitud	-75.62400851400109
Coordenadas formulario	-75.62_5.62

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 6 Parque



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	RADIO_ENLACE
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1

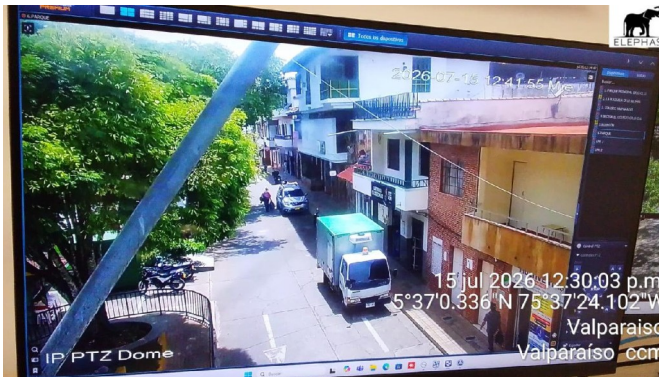


Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Calle 10 con Carrera 9
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_TELEFONIA

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
 15 jul 2026 4:17:12 p.m. 5°36'58.699" N 75°37'26.362" W Valparaíso Valparaíso parque		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		MALO
 15 jul 2026 4:29:16 p.m. 5°36'59.018" N 75°37'26.432" W Valparaíso Valparaíso parque		
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
Observaciones Gabinete:		Se propone el cambio del gabinete
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		NO
Requiere Caja Distribución Vertical:		SI
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		
Existe Infraestructura Subterránea:		NO

Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50_PROY
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
Observaciones Corona:	el punto no cuenta con corona
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
	
Requiere Brazo de Soporte:	NO
Observaciones Brazo:	se recomienda el cambio del brazo

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	REGULAR

Foto Cables



Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
💡 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	SI
Observaciones Transformador:	el punto no cuenta con transformador
🔧 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
💧 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	MALO
Requiere Coraza 3/4":	SI
Cantidad Coraza 3/4" (ml):	12
Observaciones Coraza:	se recomienda el cambio de la coraza ya que estan cristalizadas
💡 UPS	
Existe UPS:	NO
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	el punto no cuenta con UPS
💡 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO

Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	El Gabinete no cuenta con DPS para la protección de los Equipos
 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
 CANAleta PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	NO
Requiere Fibra Óptica:	SI
Observaciones Fibra Óptica:	Se necesita la FO para migrar el punto de radio enlace a FO
 INYEctor POE	
Existe Inyeector PoE:	NO
Requiere Inyeector PoE:	NO
 PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
 SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	SI
Tipo de Switch requerido:	SW_8P
Cantidad Switch (un):	1
Observaciones Switch:	Se necesita para la integracion de la FO
 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	SUM-OE05
Descripción de la actividad	Adquisición gabinetes de poste/fachada, min 11U
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se recomienda el cambio de gabinete
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE-2f07a4969ab64548b405457a65dc3005.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	INST-OE08
Descripción de la actividad	Instalación gabinetes de poste/fachada, min 11U
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se recomienda la instalacion de un gabinete
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-ec73c1eb31944fe58414b3c52014d3a2.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	INST-OE13
Descripción de la actividad	Instalacion de corona antiescalatoria
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se propone la instalacion de una corona

Archivo APU adjunto	APU INST-OE13 CORONA-a93d13b7382d46b08817ae3226d8df20.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se propone la migracion del punto de radio a FO

8. CONTROL DE APROBACIÓN
