



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad




Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	La Pintada
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	12/08/2026
Dirección del punto / sector	Ruta Nacional 25 11-15, La Pintada, Antioquia
Latitud	5.754180770639939
Longitud	-75.61031662342093
Coordenadas formulario	-75.61_5.75

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 17 Salida santa Barbara

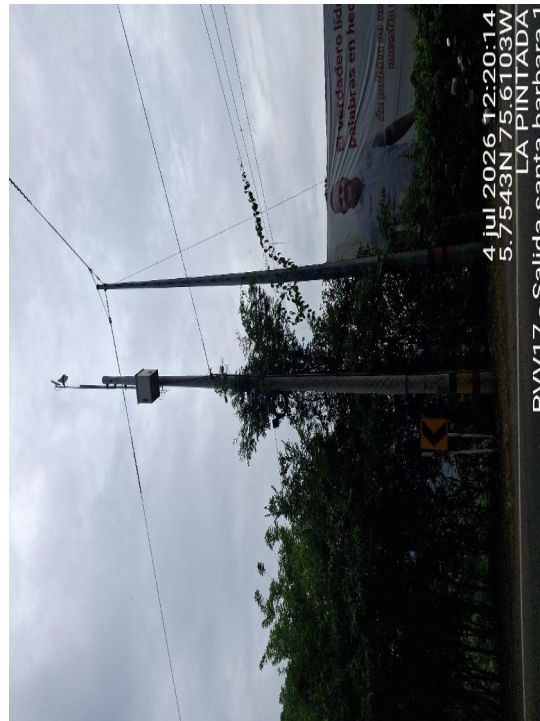

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	RADIO_ENLACE
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	SI
Seleccione el medio de comunicación a actualizar para	FO

Foto 1



Foto 2

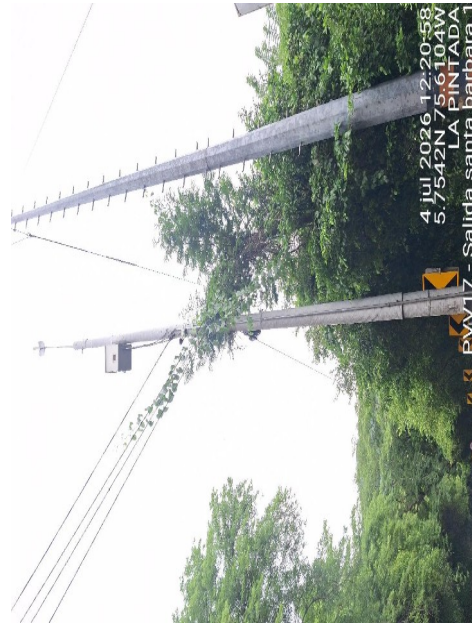


Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Via a Santa Barbara
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
 4 jul 2026 12:20:14 5.7543N 75.6103W LA PINTADA PVV17 - Salida santa barbara 1		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
 GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		BUENO
 4 jul 2026 12:21:47 5.7543N 75.6103W LA PINTADA PVV17 - Salida santa barbara 1		
Requiere Gabinete Metálico:		No
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:		BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		

Existe Infraestructura Subterránea:	NO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
 CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
 BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	NO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

 ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
 TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	SI
Estado Tablero Breaker:	BUENO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO
Requiere Transformador Reductor:	NO
 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Requiere UPS:	NO
 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	NO
 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	NO
 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
 CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO

Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO
------------------------------------	----

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
 PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
 SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	NO
 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	2
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO



CÁMARA EXISTENTE 2

Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	SI
Estado Equipo TX/RX:	BUENO
Requiere Equipo TX/RX:	NO
Observaciones Equipo TX/RX:	se debe retirar, ya el punto fue migrado a FO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	No se pudo acceder al punto debido a riesgo biologico, se tiene un nido de abejas en el poste, se solicita al municipio para que lo intervenga

8. CONTROL DE APROBACIÓN
