



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	La Pintada
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	12/08/2026
Vereda / sector	RAFAEL URIBE URIBE
Dirección del punto / sector	Ruta Nacional 25, La Pintada, Antioquia
Latitud	5.741417913786379
Longitud	-75.60706017684667
Coordenadas formulario	-75.61_5.74

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 3 Comando



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	CABLE_DATOS
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2

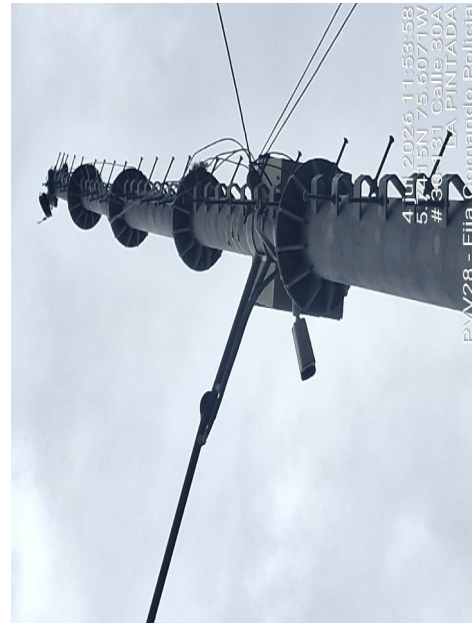


Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_META
Altura del poste (m)	16MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Calle 30 A N° 30-131
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
 28/05/2025 11:42:04 a. m. 5.741520000000001N 75.60708166666667W 178° S # 30-131 Calle 30A La Pintada Antioquia Altitud: 618.6msnm Velocidad: 0.0km/h Campo de visión, de policía		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		BUENO
 4 Jul 2026 11:54:24 5.741414N 75.6071W 30-131 Calle 30A LA PINTADA P.V.28 - Fija Comando Policía		
Requiere Gabinete Metálico:		No
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		NO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		
Existe Infraestructura Subterránea:		SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO

Foto Cables



Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO


Foto Transformador Reductor



Requiere Transformador Reductor:	NO
🔌 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO

Requiere Tubería:	NO
	 CORAZA
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
	 UPS
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS

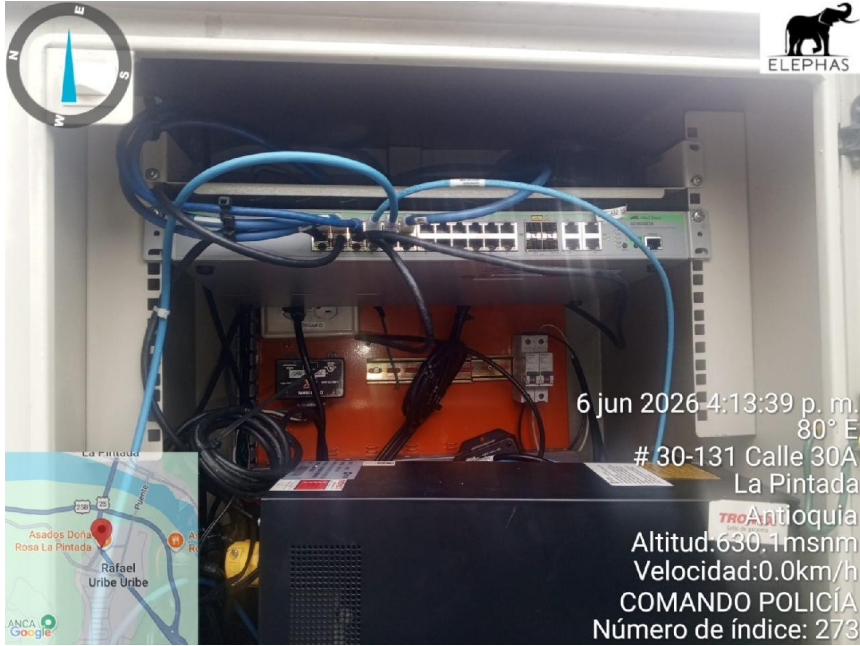

Requiere UPS:	NO
	 BATERÍAS UPS
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
	 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Requiere SPT:	NO
	 PROTECCIÓN
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	NO
	 TOMA 125 V
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Requiere Toma 125 V:	NO
	 CANALETA PLÁSTICA
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

	 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS
Existe Fibra Óptica:	NO


Requiere Fibra Óptica:	NO
🔗 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO
 28 may 2026 11:55:44 a. m. 5.741453333333334N 75.60712166666667W 72° E # 30-140 Calle 30A La Pintada Antioquia Altitud:621.1msnm Velocidad:0.7km/h camara 3 estación de policía Número de índice: 5	
Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANCEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	MALO



Requiere Switch:	NO
Observaciones Switch:	Se instalo un switch entregado por la alcaldia para reemplazar el siwtch
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	2
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



CÁMARA EXISTENTE 2	
Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO

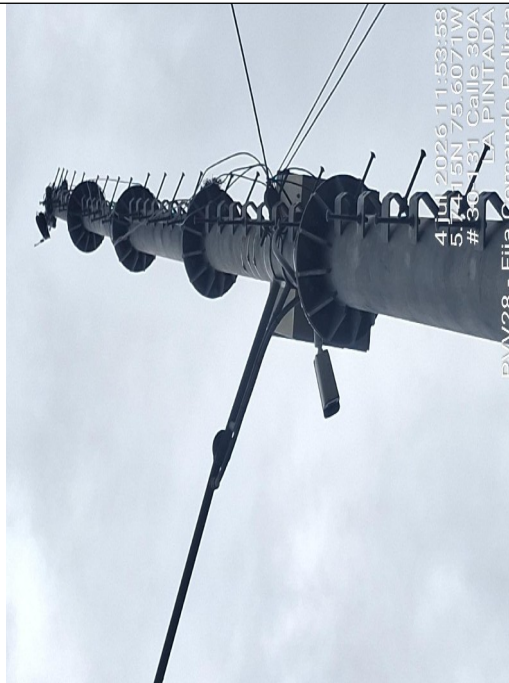

¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	SI
Estado Equipo TX/RX:	BUENO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	se debio cambiar el switch averiado, se debe realizar limpieza y retirar equipos que ya no estan en uso

8. CONTROL DE APROBACIÓN
