

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Angelópolis
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	20/08/2026
Vereda / sector	LA CLARA
Dirección del punto / sector	Multiservicios Meladel S A En Liquidacion
Latitud	6.111191195907033
Longitud	-75.71005752227863
Coordenadas formulario	-75.71_6.11

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de policia

Evidencia ubicación CCM



28 abr 2026 12:52:42 p.m.
6.11112333N 75.7100781W
9-19 Carrera 10
Angelópolis
Antioquia
#ESTACION DE POLICIA CCM

¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernacion de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	SI
Otro uso del espacio del CCM:	Guardia
Administrador del CCM:	Comandante de estacion
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

🔌 RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones  28 abr 2026 2:38:52 p.m. 6.1112422N 75.7100522W # 9-19 Carrera 10 Angelópolis Antioquia #ESTACION DE POLICIA CCM	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	SI
Estado de los cables:	BUENO
¿Requiere cables?	SI
Tipo de cable requerido:	2N_12+1AGW
Observaciones cables:	por solicitud de la secretaria de gobierno y del comandante de extacion se solicita el traslado del CCM para la sala SIES
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	SI
Estado tablero breaker:	BUENO
Existe breaker:	SI
Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	SI
Tipo de breaker requerido:	BRK_20A
Cantidad breaker (un):	1
Observaciones tablero breaker:	se requiere 1 breker de 20A para el circuito del rack
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
⚡ TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	SI
Tipo de tubería requerida:	EMT_3_4
Cantidad tubería EMT 3/4 (ml):	50
Observaciones tubería:	se requiere la tuberia EMT para el traslado del CCM
🔌 CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	NO

¿Requiere UPS?	NO
BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	BUENO

Foto PDU multitoma



28 abr 2026 2:41:24 p.m.
6.1713234N 75.71006748W
9-19 Carrera 10
Angelópolis
Antioquia
ESTACION DE POLICIA CCM

¿Requiere PDU multitoma?	NO
TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO
¿Requiere fibra óptica?	NO
ODF	
Existe ODF:	SI
Estado ODF:	BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?

NO

 INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

SI

Estado inyector PoE:

BUENO

Foto inyector PoE



¿Requiere inyector PoE?

NO

 PATCH CORD

Existe patch cord:

SI

Estado patch cord:

BUENO

¿Requiere patch cord?

NO

 PATCH PANEL

Existe patch panel:

SI

Estado patch panel:

BUENO

Foto patch panel



28 abr 2026 1:20:54 p.m.
6.11122262N 75.71010279W
#9-61 Carrera 10
Angelópolis
Antioquia
#ESTACION DE POLICIA CCM

¿Requiere patch panel?

NO

¿Requiere toma RJ45?

NO

ORGANIZADOR DE CABLEADO

Existe organizador de cableado:

SI

Estado organizador de cableado:

BUENO

Foto organizador de cableado



28 abr 2026 1:20:54 p.m.
6.11122262N 75.71010279W
#9-61 Carrera 10
Angelópolis
Antioquia
#ESTACION DE POLICIA CCM

¿Requiere organizador de cableado?

NO

CONVERTIDOR MONOMODO

Existe convertidor monomodo:

NO

¿Requiere convertidor monomodo?

NO

MÓDULO TRANCEPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO

Existe módulo óptico:

SI

Estado módulo óptico:

BUENO

¿Requiere módulo óptico?

NO

SWITCH	
Existe switch:	SI
Estado switch:	BUENO
Foto switch	
	
¿Requiere switch?	NO
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



28 abr 2026 1:20:49 p.m.
6.11122531N, 75.71010331W
9-61 Carrera 10
Angelópolis
Antioquia
#ESTACION DE POLICIA CCM

¿Requiere servidor NVR?

NO

LICENCIAS

Existen licencias:

SI

Foto licencias



29 abr 2026 4:53:30 p.m.
6.11125396N 75.71009648W
9-19 Carrera 10
Angelópolis
Antioquia
#CMC

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

MONITOR

Existe monitor:

NO

¿Requiere monitor?

SI

Tipo de monitor requerido:

MONITOR_55

Cantidad monitor 55" (un):

1

Observaciones monitor:

El monitor que se ve actualmente es un monitor prestado, el del CCM se quemó

ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo:	NO
¿Requiere estación de trabajo?	SI
Cantidad requerida (un):	1
Observaciones estación de trabajo:	el CCM no cuenta con extacion de trabajo, actualmente se trabaja directamente sobre el servidor
 JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	NO
¿Requiere cable HDMI?	SI
Cantidad requerida (un):	1
Observaciones cable HDMI:	Se requiere cable HDMI para conectar la estacion de trabajo con el monitor
 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	NO
 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
 PUERTAS	
Existen puertas:	NO
 VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	NO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	SUM-OE01 SUMINISTRO DE MESA DE TRABAJO PARA ESTACION DE TRABAJO EN EL CCM DE ATENCION CRITICA 7X24, 1,20 X 0,60 X 2,5, SISTEMA DE ARCHIVADOR 2 GAB Y BASE SIS
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere mesa para la instalacion de la estacion de trabajo
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE01 MESA DE TRABAJO-8354402870fc4312a3679880788e1f08.xlsx



28 abr 2026 3:52:18 p.m.
6.11118838N 75.71013673W
9-19 Carrera 10
Angelópolis
Antioquia
#ESTACION DE POLICIA


ACTIVIDAD EXTRA 2

Descripción de la actividad	SUM-OE02 SUMINISTRO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA ATENCIÓN CRITICA 7X24
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la silla de operador para el nuevo puesto de trabajo
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE02 SILLA-ec0ea65d09b9479688a5edb1a3d191ec.xlsx

Sin evidencia fotográfica

ACTIVIDAD EXTRA 3

Descripción de la actividad	SUM-OE03 SUMINISTRO DE MONITOR DE OPERADOR 27". INCLUYE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS .
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere 1 monitor para la nueva estacion de trabajo
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE03 MONITOR 27-b11c9b0f2dc24aa19c0758f6260fa52e.xlsx

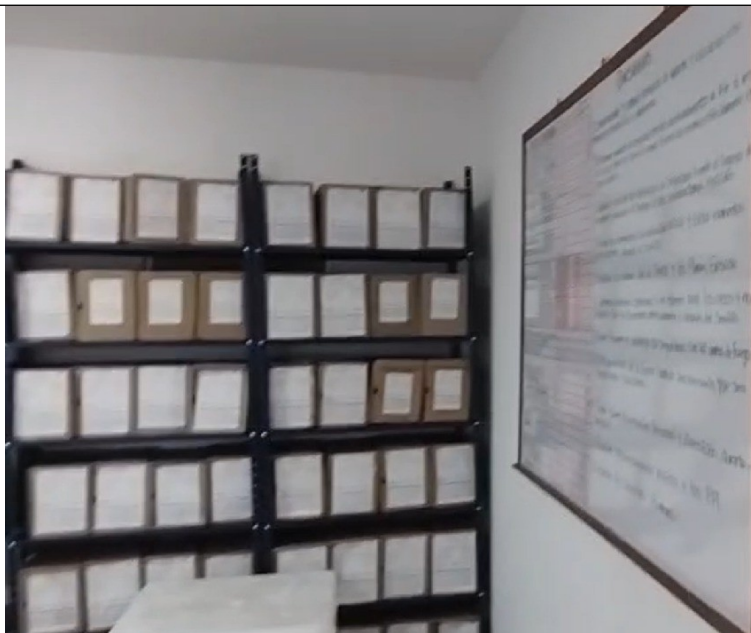

28 abr 2026 3:41:04 p.m.
6.11120713N 75.71009021W
9-61 Carrera 10
Angelópolis
Antioquia
#ESTACION DE POLICÍA

ACTIVIDAD EXTRA 4

Descripción de la actividad	INST-OE01 INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO EN CABLE 2N°12 + 1 N°12 AWG, THHN INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	ML
Cantidad	30
Justificación	se requiere la instalacion del circuito para alimentar el rack del CCM
Archivo APU adjunto	APU INST-OE01 CIRCUITO ELECTRICO-24b9970146eb4e4faf36cd72c3bcb5ce.xlsx



28 abr 2026 3:45:06 p.m.
6.11123863N 75.71000435W
9-61 Calle 10
Angelópolis
Antioquia
#ESTACION DE POLICÍA

ACTIVIDAD EXTRA 5

Descripción de la actividad	INST-OE02 INSTALACIÓN DE BREAKER DE 15 - 30A ENCHUFABLE
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalacion de 1 breaker de 20A
Archivo APU adjunto	APU INST-OE02 BREAKER-88c981204cb34c62b3853ee6409961ba.xlsx

Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 6	
Descripción de la actividad	INST-OE03 INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	ML
Cantidad	120
Justificación	Se requiere el suministro y la instalacion del cable UTP, para realizar la extension de las camaras analogas
Archivo APU adjunto	APU INST-OE03 CABLE UTP CAT 6A-b6db03200eb841a89c4cfb5f162e8ce7.xlsx
 28 abr 2026 3:45:32 p.m. 6.11124413N 75.71002528W 9-61 Calle 10 Argeopolis Antioquia #ESTACION DE POLICÍA	
ACTIVIDAD EXTRA 7	
Descripción de la actividad	INST-OE04 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, CONDULETAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Unidad	ML
Cantidad	50
Justificación	se requiere la instalaicon de la tuberia EMT para llevar la FO, la acometida y el UTP para la nueva ubicacion del CCM
Archivo APU adjunto	APU INST-OE04 TUBERÍA EMT 3-4-f170c5f5bb274886b3f86349903d9149.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 8	
Descripción de la actividad	INST-OE05 Instalación de mesa de trabajo para estacion de trabajo en el CCM de atencion critica 7X24, 1,20 X 0,60 X 2,5, sistema de archivador 2 GAB Y base SIS
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	se requier la instalacion de la mesa de trabajo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE05 MESA DE TRABAJO-81fb609325fa4ea883f23a14d07fc213.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 9	
Descripción de la actividad	INST-OE06 Instalación de sillas ergonómicas para atención critica 7X24
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalacion de la silla para el nuevo puesto de trabajo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE06 SILLA-419a1080f56249d592dda872c6037ab1.xlsx

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	PREVENTIVO
Tipo de mantenimiento preventivo:	COMPLETO
Observaciones generales del diagnóstico:	INST-03 se requiere 1 unidad "Instalación y puesta a punto de monitor para estación de trabajo en brazo de puesto de trabajo de operador CCTV en CCM" SUM-43 se requiere de 120 ML "suministro de cable utp cat 6a incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion. " La secretaria de gobierno y el comandante de estacion solicitan el cambio de ubicacion del CCM, para la sala SIES dado que la ubicacion actual esta a la vista de los transeuntes

9. CONTROL DE APROBACIÓN
