

Operador	UNION TEMPORAL ANTIOQUIA SEGURA
Contrato disponible	173_2026
Técnico responsable	Juan Pablo Serna Hernandez
Cédula del técnico	1037627002

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Nechí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	25/08/2026
Vereda / sector	CAÑO PESCADO
Dirección del punto / sector	052420, Nechí, Antioquia
Latitud	8.083932
Longitud	-74.77668192
Coordenadas formulario	-74.78_8.08

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	8° 5'2.16" -74°46'36.05"



17 de mayo de 2026 13:37
8.084126666666666N 74.77655W
Nechí
LPR #01

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_META
Altura del poste (m)	12MTS
Dirección de referencia del anclaje	LPR 1 BASE EJERCITO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO


 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO

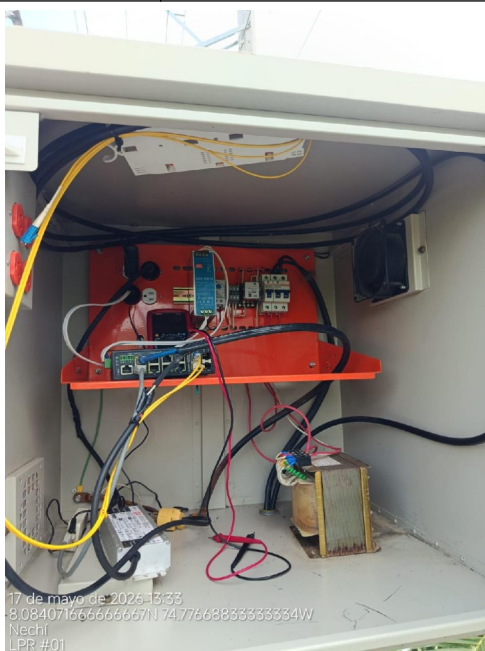

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

Gabinete se encuentra en buen estado.

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

SI

Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Tubería:	BUENO
	
Estado Caja 50x50:	BUENO
	
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
Observaciones Infraestructura Subterránea:	CAJA INSPECCION OBSTRUIDA CON TIERRA
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
Observaciones Corona:	Corona Se Encuentra En Buen Estado
🔧 BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	NO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	SI
Estado Tablero Breaker:	BUENO

Foto Tablero Breaker




17 de mayo de 2026 13:22
8.084111N 74.77669333333333W
Nechí
LPR #01

Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO

TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor

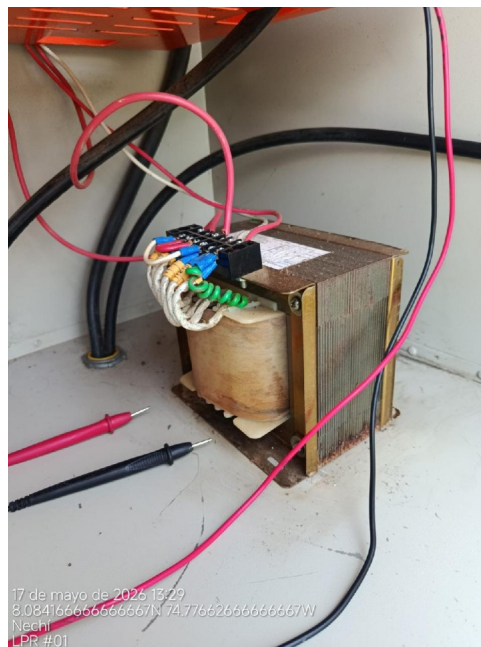

17 de mayo de 2026 13:23
8.084166666666667N 74.77662666666667W
Nechí
LPR #01

Requiere Transformador Reductor:	NO
----------------------------------	----

TUBERÍA

Existe Tubería:	SI
Estado Tubería:	BUENO

Foto Tubería



Requiere Tubería:	NO
	 CORAZA
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO

Foto Coraza




Requiere Coraza 3/4":	NO
	 UPS
Existe UPS:	NO
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	El punto de cámara se encuentra sin UPS
	 BATERÍAS UPS
Existen Baterías UPS:	NO

Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	REGULAR
Requiere SPT:	NO
Observaciones SPT:	No es posible realizar la validación del SPT, debido a que la caja se encuentra
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_POTENCIA
Protección de potencia, video y datos en cámaras (un):	1
Observaciones Protección:	Se requiere protección IP para la cámara.
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO
Foto Toma 125 V	
	
Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI

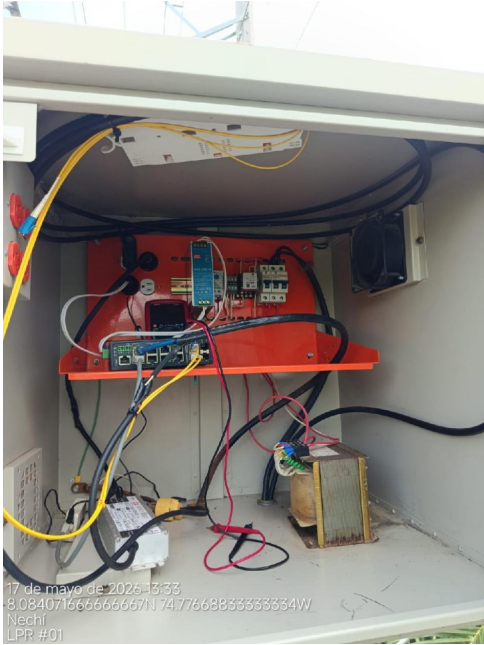Estado Patch Cord:	BUENO
	
Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



17 de mayo de 2026 13:30
8.08408N 74.77664W
Nechí
LPR #01

Requiere Switch:	NO
	 CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	LPR
Estado de la cámara	BUENO



17 de mayo de 2026 13:33
8.08410766666667N 74.77664W
Nechí
LPR #01

¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
	 ENRUTADOR VPN
Existe Enrutador VPN:	NO
	 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	ADQUISICION CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 8 SC/LC, IP 65, ENTRADA 2 x (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere la instalación de una Caja de Distribución Óptica (OB), con el fin de brindar mayor seguridad, organización y protección a los pigtails que realizan la conexión hacia el switch.
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se requiere realizar mantenimiento correctivo en el punto de cámara, que incluye la instalación de la protección IP, UPS y caja OB, además limpieza general de todos los componentes asociados al sistema, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y continuidad operativa.

8. CONTROL DE APROBACIÓN
