

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--

Operador	UNION TEMPORAL VMAS SEGURIDAD 2024
Contrato disponible	170_2026
Técnico responsable	Santiago Carvajal Castaño
Cédula del técnico	1035229268

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Yondó
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	12/05/2026
Dirección del punto / sector	Puentes Galvis Hernan Dario
Latitud	7.007605555555555
Longitud	-73.90941111111111
Coordenadas formulario	-73.91_7.01

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV Parque Principal



05/12/2026
7°0'27.708"N 73°54'34.206"W
YONDO
DIAGNÓSTICO
PARQUE PRINCIPAL
ANTIOQUIA
CONTRATO 170

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3


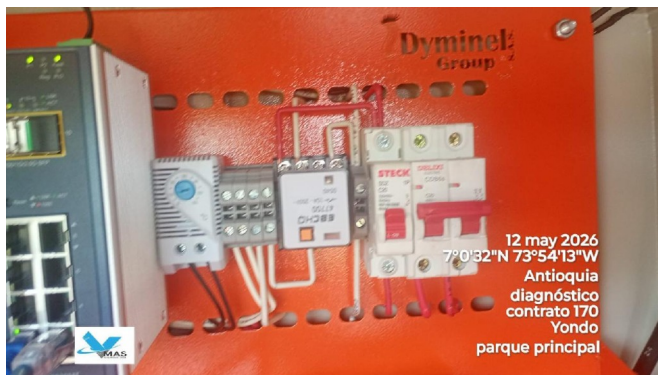


Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	ENERGIA
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO

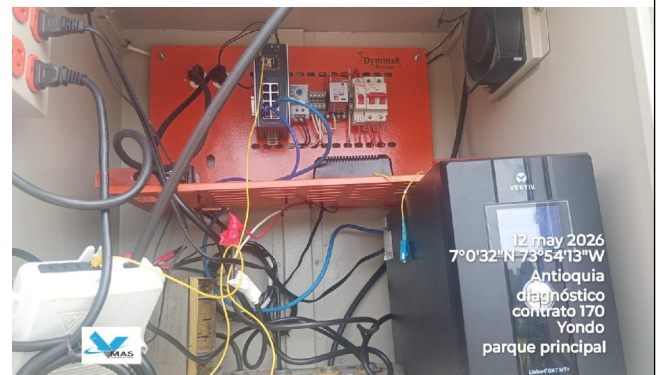

Requiere Cambio de anclaje:	NO
 GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	REGULAR
Requiere Gabinete Metálico:	NO
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:	REGULAR
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	ANDEN,CAJA_50X50
Estado Tubería:	REGULAR
Estado Anden:	BUENO
Estado Caja 50x50:	REGULAR
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
 CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
 BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	REGULAR
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS


 ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	REGULAR
Requiere Cables:	NO
 TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO

Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO
Requiere Transformador Reductor:	NO
 TUBERÍA	
Existe Tubería:	SI
Estado Tubería:	REGULAR
Requiere Tubería:	NO
 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	REGULAR
Requiere Coraza 3/4":	NO
 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	REGULAR
Requiere UPS:	NO
 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	SI
Estado Baterías UPS:	REGULAR
Requiere Baterías UPS:	NO
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	REGULAR
Requiere SPT:	NO
 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	REGULAR
Requiere Protección:	NO
 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	REGULAR
Requiere Toma 125 V:	NO
 CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	MALO
Requiere Fibra Óptica:	NO
 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	REGULAR
Requiere Inyector PoE:	NO
 PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	REGULAR
Requiere Patch Cord:	NO

PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	REGULAR
Requiere Módulo Óptico:	NO
SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO

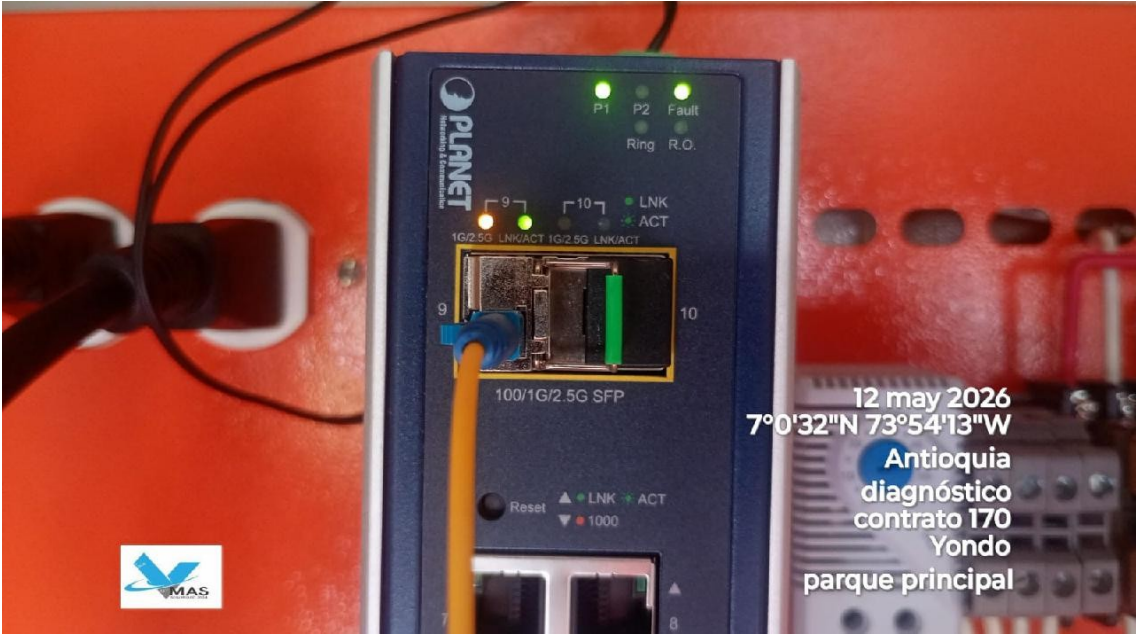

Requiere Switch:	NO
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	REGULAR



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	Mantenimiento correctivo
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El punto requiere mantenimiento correctivo debido a daño de fibra optica la cual presenta atenuacion
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUERA_SERVICIO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO

8. CONTROL DE APROBACIÓN
