



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Titiribí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	17/09/2026
Dirección del punto / sector	Calle 20, Titiribí, Antioquia
Latitud	6.064341190294171
Longitud	-75.79230121361778
Coordenadas formulario	-75.79_6.06

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 13 EL Hueco



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	ENERGIA
Dirección de referencia del anclaje	Calle 20 COn carrera 18
Propietario del poste	EPM
Tipo tension	MEDIA
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



5 jul 2026 10:22:12 a.m.
6.06440777N 75.79228533W
18-4 Calle 20
Titiribí
Titiribí
Antioquia
PUNTO DE CAMARA SECTOR EL HUECO

Requiere Cambio de anclaje:

NO

 GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

REGULAR



5 jul 2026 10:27:17 a. m.
6.0643633333333336N 75.79228333333333W
19-96 Carrera 18
Titiribí
Titiribí
Antioquia
Punto: SECTOR EL HUECO

Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

Se sugiere cambio de gabinete por uno mas amplio, para una mejor

 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

NO

Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50_PROY
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
 5 jul 2026 10:27:27 a.m. 6.06435333333334N 75.79230833333332W Punto: SECTOR EL HUECO	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	REGULAR
Requiere Cables:	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad Cable 2x8+8 AWG (ml):	5
Observaciones Cables:	Se sugiere cambio de acometida electrica
TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	NO
TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
CORAZA	
Existe Coraza:	NO
Requiere Coraza 3/4":	NO
UPS	

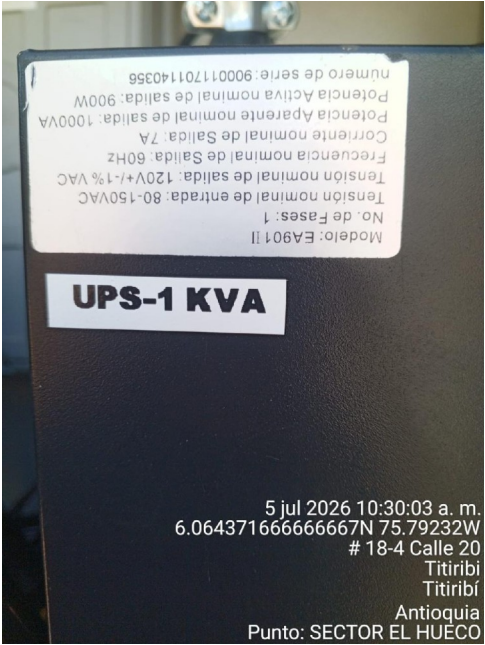
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Foto UPS	
	
Requiere UPS:	NO
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	El punto no cuenta con DPS
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
Observaciones Toma 125 V:	El punto cuenta con un toma flotante montado en una caja plastica
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	SI
Estado Convertidor Monomodo:	BUENO



5 jul 2026 10:30:23 a. m.
6.064325N 75.7923283333334W
18-4 Calle 20
Titiribi
Titiribi
Antioquia
Punto: SECTOR EL HUECO

Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSCPTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



5 jul 2026 10:29:56 a. m.
6.064371666666667N 75.79232W
18-4 Calle 20
Titiribi
Titiribi
Antioquia
Punto: SECTOR EL HUECO

Requiere Switch:	NO
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	

Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO
	
¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	SUM-OE05
Descripción de la actividad	Adquisición gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4, techo inclinado, espacio para ubicación de elementos (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de voltaje)
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se sugiere cambio de gabinete por uno mas amplio, para una mejor distribucion de los elementos
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE-c394f18786c64cbebc0a002258bae093.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	INST-OE08
Descripción de la actividad	Instalación gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4, techo inclinado, espacio para ubicación de elementos (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de voltaje)
Unidad	UN
Cantidad	1

Justificación	Se sugiere cambio de gabinete por uno mas amplio, para una mejor distribucion de los elementos
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-b583afb164784aebaed04da314f65569.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	INST-OE18
Descripción de la actividad	INSTALACIÓN DE CABLE CONCENTRICO 2X8 +8 AWG, INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LOS DEFINIDOS EN ANEXO TECNICO.
Unidad	ML
Cantidad	5
Justificación	Se sugiere el cambio de la acometida electrica
Archivo APU adjunto	APU INST-OE18 CONCENTRICO-8edcc3367c7a4bceb83f2c1d373e91e6.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se sugiere el cambio de gabinete , la instalacion de DPS, SPT y caja

8. CONTROL DE APROBACIÓN
