



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad




Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Titiribí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	16/09/2026
Dirección del punto / sector	Carrera 20, Titiribí, Antioquia
Latitud	6.063385885232085
Longitud	-75.79326258587066
Coordenadas formulario	-75.79_6.06

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 1 Parque 1

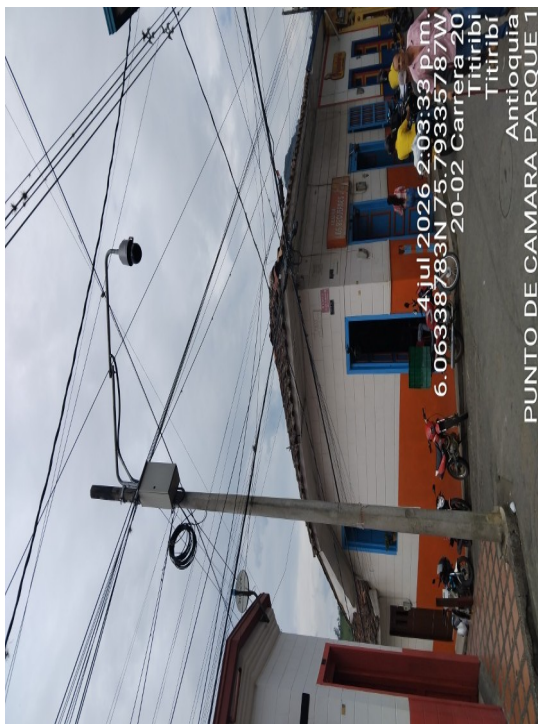

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2

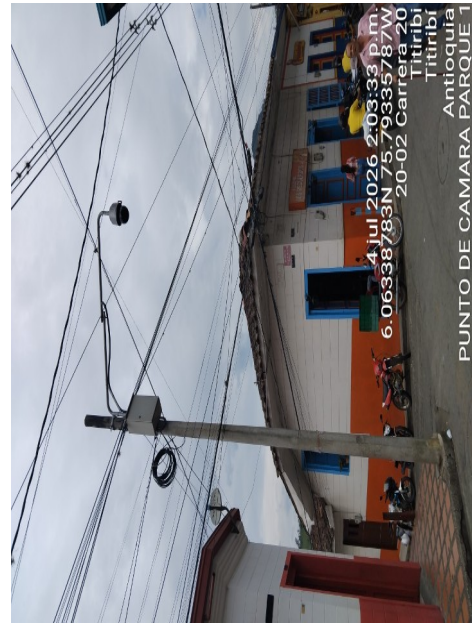


Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 20 D con calle 20
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		REGULAR
		
Requiere Cambio de anclaje:		SI
Tipo de anclaje requerido:		POSTE_14_CONCRETO
 GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		REGULAR
		
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:		BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA		

Existe Infraestructura Subterránea:	NO
Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50_PROY
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
Observaciones Corona:	EL punto no cuenta con corona
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
 4 Jul 2026 2:19:14 p. m. 6.063431666666665N 75.793245W 19-82 Carrera 20 Titiribí Titiribí Antioquia Punto: PARQUE 1	
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	REGULAR

Foto Cables



4 jul 2026 2:22:47 p. m.
 6.06338666666665N 75.79325W
 19-82 Carrera 20
 Titiribi
 Titiribí
 Antioquia
 Punto: PARQUE 1

Requiere Cables:	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad Cable 2x8+8 AWG (ml):	12
Observaciones Cables:	Se aconseja el cambio de la acometida electrica, actualmente tiene un
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	NO
⚡ TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
🛡️ CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



4 jul 2026 2:21:59 p. m.
6.063483333333333N 75.79324666666666W
20-02 Carrera 20
Titiribí
Titiribí
Antioquia
Punto: PARQUE 1

Requiere UPS:	NO
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO

Foto Protección



4 jul 2026 2:17:51 p. m.
6.063383333333333N 75.79325000000001W
20-02 Carrera 20
Titiribí
Titiribí
Antioquia
Punto: PARQUE 1

Requiere Protección:	NO
----------------------	----

Observaciones Protección:	El punto cuenta con DPS
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
Observaciones Toma 125 V:	EL punto cuenta con 1 toma doble el cual no esta tecnicamente instalado
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



4 jul 2026 2:22:47 p. m.
6.063386666666665N 75.79325W
19-82 Carrera 20
Titiribi
Titiribí
Antioquia
Punto: PARQUE 1

Requiere Fibra Óptica:	NO
🔌 INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	SI
Estado Convertidor Monomodo:	BUENO



Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSCÉPTOR/TRANSCÉIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	SI
Tipo de Switch requerido:	SW_8P
Cantidad Switch (un):	1
Observaciones Switch:	Se recomienda la instalacion de 1 switch para poder conectar la UPS y
CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	SUM-OE05
Descripción de la actividad	Adquisición gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4, techo inclinado, espacio para ubicación de elementos (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de voltaje)
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se recomienda el cambio de gabinete para instalar técnicamente, acometida, protecciones, transformador, UPS y demas elementos
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE-cf9b24ab9f9d48589f7db318c0d82b7b.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	INST-OE08
Descripción de la actividad	Instalación gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4, techo inclinado, espacio para ubicación de elementos (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de voltaje)
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se recomienda el cambio de gabinete para instalar técnicamente, acometida, protecciones, transformador, UPS y demas elementos
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-65e43ad11ded43e0a77e50b92adf1f9f.xlsx

Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	INST-OE18
Descripción de la actividad	INSTALACIÓN DE CABLE CONCENTRICO 2X8 +8 AWG, INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LOS DEFINIDOS EN ANEXO TECNICO.
Unidad	ML
Cantidad	12
Justificación	Se recomienda el cambio de la acometida electrica
Archivo APU adjunto	APU INST-OE18 CONCENTRICO-ac5db1f2a5a84a64b6ebc946666e1e32.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de manteniemento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se recomienda el cambio del poste por averias del actual poste, cambio de gabinete, instalacion de SPT

8. CONTROL DE APROBACIÓN
