

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO


Municipio	Titiribí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	16/09/2026
Dirección del punto / sector	Carrera 21, Titiribí, Antioquia
Latitud	6.063347392292319
Longitud	-75.79424895920164
Coordenadas formulario	-75.79_6.06

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 6 Parque 2 Iglesia



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

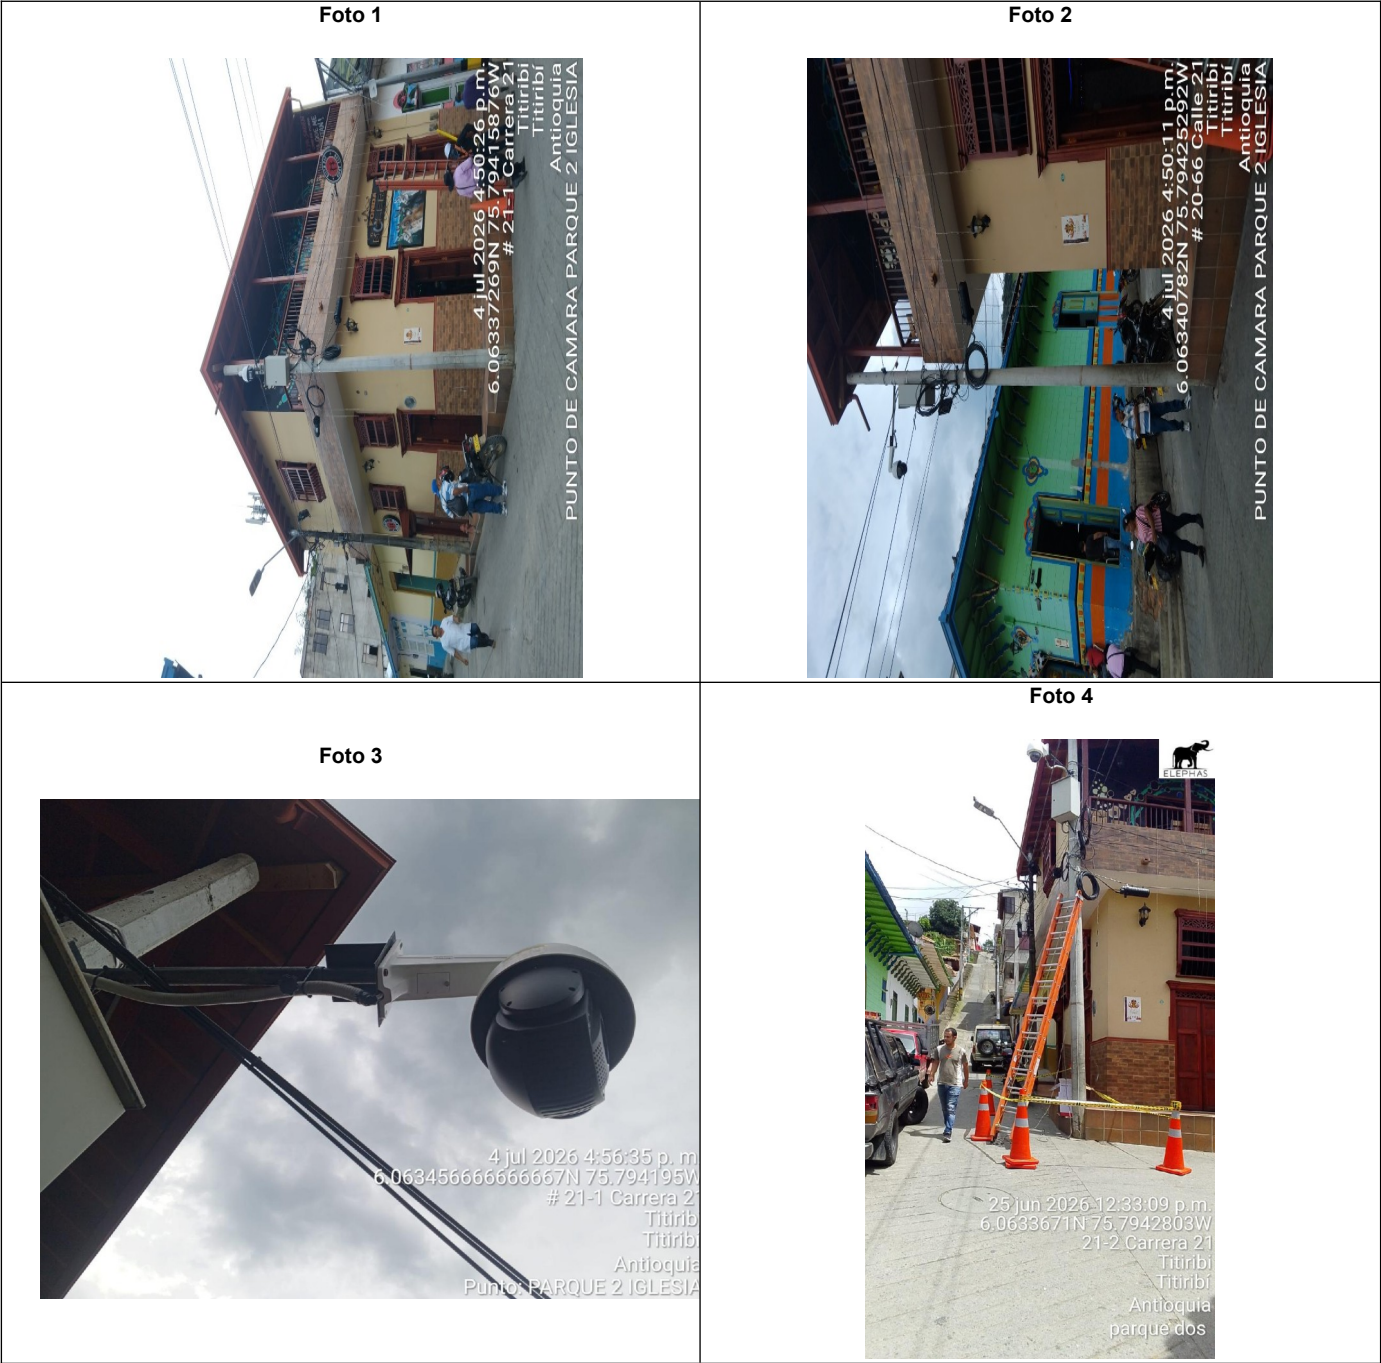

3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	ENERGIA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 21 con calle 21
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:	REGULAR
	
Requiere Cambio de anclaje:	NO
GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	REGULAR
	
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
Observaciones Gabinete:	El gabinete es muy estrecho para albergar los equipos que tiene en el interior,
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:	BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	

Existe Infraestructura Subterránea:	NO
Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50_PROY
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	SI
Observaciones Corona:	El punto no cuenta con corona
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	REGULAR
Requiere Brazo de Soporte:	SI
Observaciones Brazo:	Se recomienda el cambio del brazo para mejorar la visual sobre el parque

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	REGULAR
Requiere Cables:	SI
Tipo de cable requerido:	2X8+8AWG
Cantidad Cable 2x8+8 AWG (ml):	10
Observaciones Cables:	Se sugiere el cambio de la acometida actual cable 3x12 por cable concentrico
TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	NO
TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
CORAZA	

Existe Coraza:	NO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔧 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO
Foto UPS	
	
Requiere UPS:	NO
🔧 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	SI
🔧 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	SI
Estado Protección:	BUENO
Requiere Protección:	NO
🔧 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	REGULAR

Foto Toma 125 V



4 jul 2026 4:59:11 p. m.
 6.068363333333333N 75.79421333333333W
 21-2 Carrera 21
 Titiribí
 Titiribí
 Antioquia
 Punto: PARQUE 2 IGLESIA

Requiere Toma 125 V:	NO
Observaciones Toma 125 V:	El gabinete cuenta con un toma flotante instalado en una caja plastica, lo cual
CANAleta PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYEctor POE	
Existe Inyeector PoE:	NO
Requiere Inyeector PoE:	NO
PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	SI
Estado Patch Cord:	BUENO
Requiere Patch Cord:	NO
PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	SI
Estado Convertidor Monomodo:	BUENO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO	

Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
📡 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
📷 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	MALO



¿Requiere Cámara?	SI
Tipo de Cámara requerida:	PTZ
Cantidad de cámaras requeridas:	1
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
Observaciones Cámara:	La camara se encuentra quemada, requiere ser cambiada
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	INST-OE18
Descripción de la actividad	INSTALACIÓN DE CABLE CONCENTRICO 2X8 +8 AWG, INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LOS DEFINIDOS EN ANEXO TECNICO.
Unidad	ML
Cantidad	10
Justificación	Se recomienda el cambio de la acometida por cable concentrico
Archivo APU adjunto	APU INST-OE18 CONCENTRICO-de59b69b631646d895954daac421acbb.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	SUM-OE05
Descripción de la actividad	Adquisición gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4, techo inclinado, espacio para ubicación de elementos (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de voltaje)
Unidad	UN
Cantidad	1

Justificación	Se sugiere cambio de gabinete por uno mas amplio, para una mejor distribucion de los elementos
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE-f34058738fa240ee88aa3bcbc3180ec5.xlsx
	

ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	INST-OE08
Descripción de la actividad	Instalación gabinetes de poste/fachada, min 11U, NEMA 4, techo inclinado, espacio para ubicación de elementos (barraje de cobre, cableado, transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de voltaje)
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se sugiere cambio de gabinete por uno mas amplio, para una mejor distribucion de los elementos
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE-8d0e5f3d4c574c4aa20177e6459990c3.xlsx

Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 4	
Código del ítem	INST-OE12
Descripción de la actividad	Instalación de brazo para soporte de cámara PTZ en poste, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se sugiere cambio de brazo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE12 BRAZO-da4e7b3302644e4d990d515e99dcda35.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUERA_SERVICIO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	El poste presenta averias en su base, pero no hay espacio para cambiar el poste, por el techo de la casa en la que se encuentra instalado, se recomienda el cambio de gabinete, brazo y acomentida, y se necesita el cambio de la camara PTZ

8. CONTROL DE APROBACIÓN
