

Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Abriaquí
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	21/07/2026
Vereda / sector	MONOS
Dirección del punto / sector	Calle 11 9 2-100, Abriaquí, Antioquia
Latitud	6.632211
Longitud	-76.064708
Coordenadas formulario	-76.06_6.63

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	6.632211, -76.064708

Evidencia ubicación CCM



¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Se desconoce

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	NO
Administrador del CCM:	N/A
Teléfono del administrador:	N/A
Correo del administrador:	N/A
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

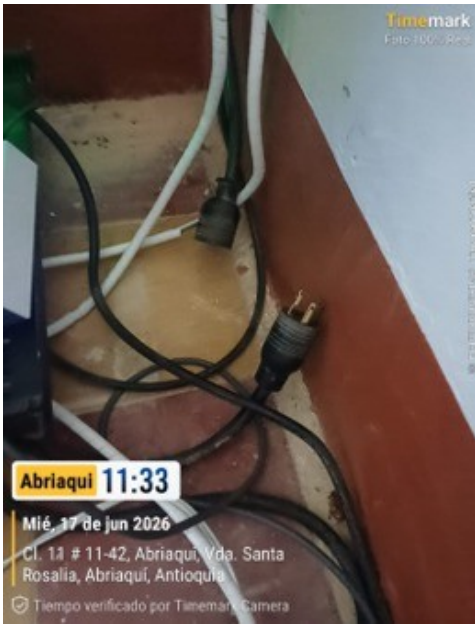

3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	SI
Estado del rack:	BUENO
Foto rack de comunicaciones 	
¿Requiere kit de ventilación doble?	NO
ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	SI
Tipo de cable requerido:	2N_12+1AGW
Observaciones cables:	Se requiere realizar acometida eléctrica para la instalación de los tableros requeridos.
TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	NO
¿Requiere breaker?	SI
Tipo de breaker requerido:	BRK_20A
Cantidad breaker (un):	2
Observaciones tablero breaker:	requiere tablero normal y regulado, su intalación permitirá una distribución adecuada de las cargas eléctricas, la protección de los equipos mediante circuitos independientes y una mejor gestión de la energía para los sistemas críticos y no críticos.
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	SI
Tipo de tubería requerida:	EMT_3_4
Cantidad tubería EMT 3/4 (ml):	35
CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
UPS	
Existe UPS:	SI

Estado UPS:	BUENO
Foto UPS 	
¿Requiere UPS?	NO
Observaciones UPS:	Se realizarón pruebas a la UPS y esta mantuvo energizados los equipos conectados de manera continua y estable, sin presentar apagados inesperados ni variaciones de voltaje, esta prueba duro aproximadamente 10 minutos.
 BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	SI
Estado baterías UPS:	BUENO
Foto baterías UPS 	
¿Requiere baterías UPS?	NO
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	SI

🔵 PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	SI
Tipo de protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
🔴 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	SI
Estado PDU multitoma:	REGULAR
Foto PDU multitoma	
	
¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Actualmente se cuenta con solo un espacio libre, se recomienda instalar nueva PDU para tener mas puertos libres.
🔴 TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	NO
🔴 CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	NO

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

📶 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
⚡ PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
🌐 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	SI
Estado fibra óptica:	BUENO

Foto fibra óptica



¿Requiere fibra óptica?

NO

ODF

Existe ODF:

SI

Estado ODF:

BUENO

Foto ODF



¿Requiere ODF?

NO

INYECTOR POE

Existe inyector PoE:

NO

¿Requiere inyector PoE?

NO

PATCH CORD

Existe patch cord:

NO

¿Requiere patch cord?

NO

PATCH PANEL

Existe patch panel:

SI

Estado patch panel:		BUENO
Foto patch panel		
¿Requiere patch panel?	NO	
¿Requiere toma RJ45?	NO	
🗂 ORGANIZADOR DE CABLEADO		
Existe organizador de cableado:	NO	
¿Requiere organizador de cableado?	NO	
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO		
Existe convertidor monomodo:	NO	
¿Requiere convertidor monomodo?	NO	
📡 MÓDULO TRANSEPTOR/TRANSCIEVER ÓPTICO		
Existe módulo óptico:	NO	
¿Requiere módulo óptico?	NO	
🔌 SWITCH		
Existe switch:	SI	
Estado switch:	BUENO	

Foto switch



¿Requiere switch?	SI
Tipo de switch requerido:	MICROTIK
Cantidad switch (un):	1
Observaciones switch:	Debido a las ampliaciones proyectadas se recomienda cambiar el switch por uno de 12 puertos, esto con el fin de poder conectar todos los equipos que se van a ir integrando en el proyecto.
DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO
¿Requiere equipo A/C mini split?	SI
ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	SI
Estado servidor NVR:	BUENO

Foto servidor NVR



¿Requiere servidor NVR? NO

 LICENCIAS

Existen licencias: NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA


☐ MONITOR

Existe monitor: SI

Cantidad monitor existente (un): 1

Estado monitor: BUENO

Foto monitor

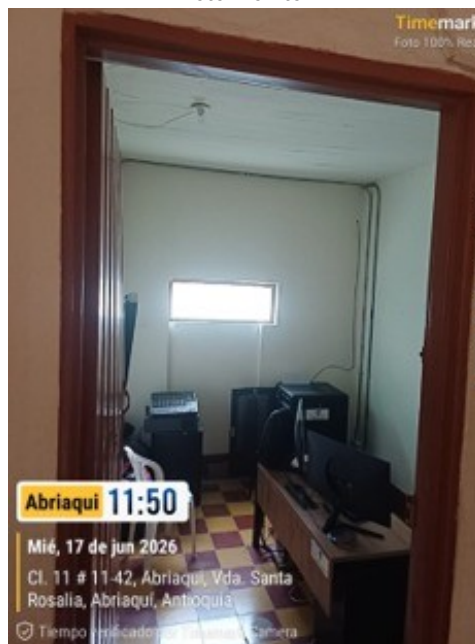

¿Requiere monitor? NO

 ESTACIÓN DE TRABAJO

Existe estación de trabajo: SI

Cantidad existente (un): 1



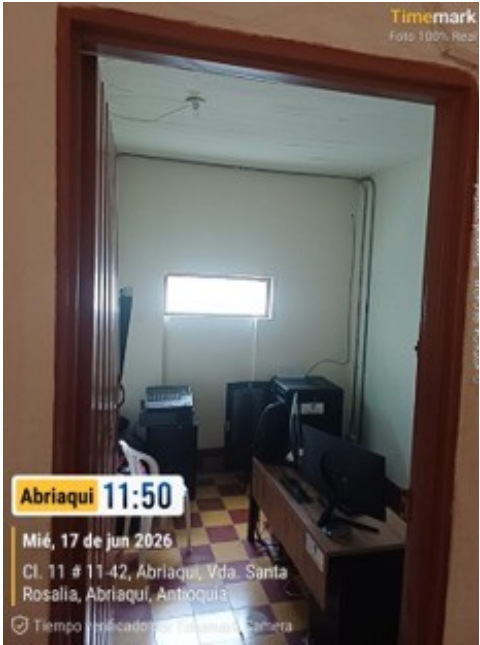
Estado estación de trabajo:	BUENO
Foto estación de trabajo	
 Timemark Foto 100% Real Abriaqui 11:50 Mié, 17 de jun 2026 Cl. 11 # 11-42, Abriaqui, Vda. Santa Rosalia, Abriaqui, Antioquia ✓ Tiempo verificado por Timemark Camera	
¿Requiere estación de trabajo?	NO
JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	SI
Cantidad existente (un):	1
Estado cable HDMI:	BUENO
Foto cable HDMI	
 Timemark Foto 100% Real Abriaqui 11:33 Mié, 17 de jun 2026 Cl. 11 # 11-42, Abriaqui, Vda. Santa Rosalia, Abriaqui, Antioquia ✓ Tiempo verificado por Timemark Camera	
¿Requiere cable HDMI?	NO
LUMINARIAS	
Existen luminarias:	SI
Estado luminarias:	MALO

Foto luminarias

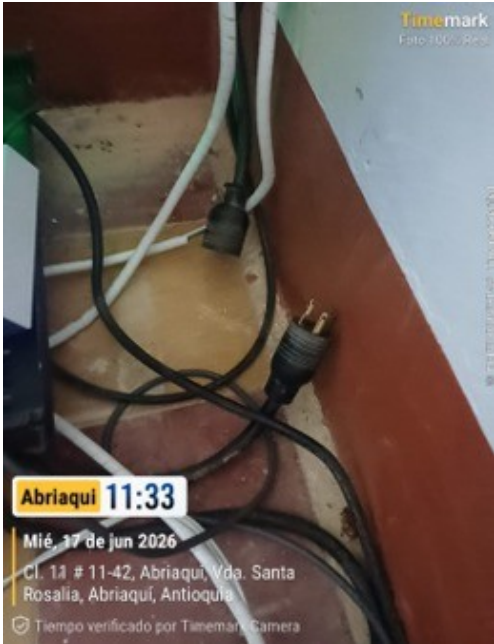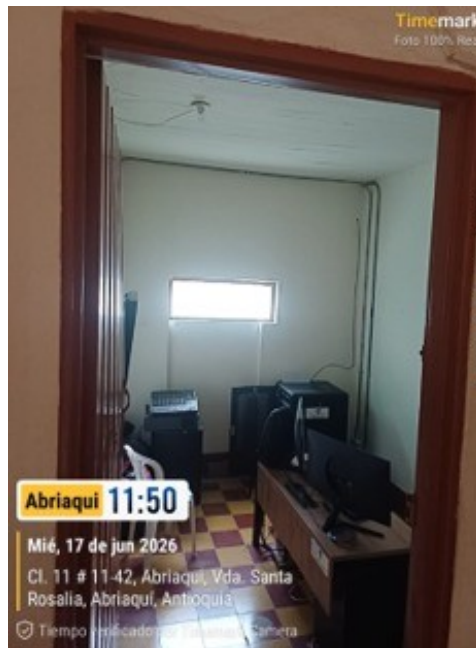

Observaciones luminarias:

No se cuenta con lamparas, el bombillo se encuentra malo, se proyecta la instalacion de una luminaria. se proyecta interruptor con cableado y acometida.

🔥 RED CONTRA INCENDIO

Existe red contra incendio:

NO

🚪 PUERTAS


Existen puertas:

SI

Estado puertas:

BUENO

Foto puertas

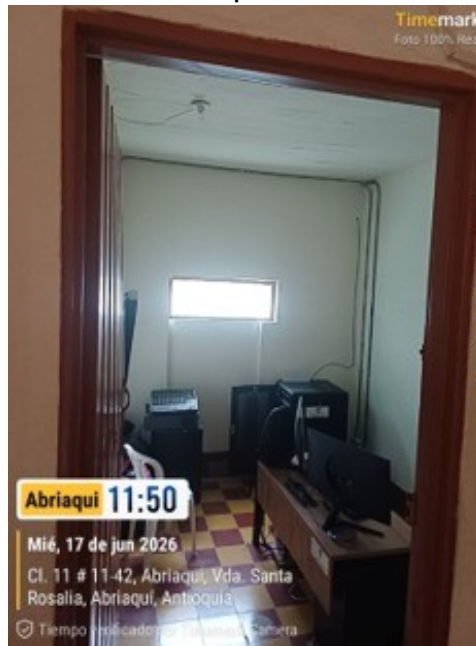

🪟 VENTANAS


Existen ventanas:

SI

Estado ventanas:

BUENO

Foto ventanas

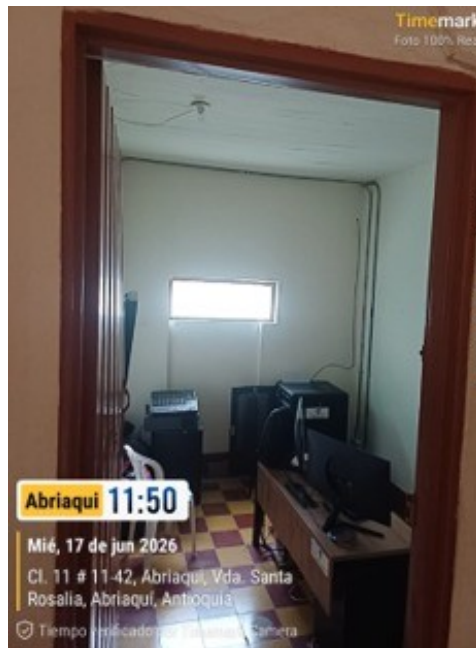

 CONTROL DE ACCESO

Existe control de acceso: NO

 CERRAMIENTO

Existe cerramiento: NO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

 ACTIVIDAD EXTRA

¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?

SI

ACTIVIDAD EXTRA 1

Descripción de la actividad

SUMINISTRO DE BANDEJA PARA RACK 1U , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. .

Unidad

UN

Cantidad

1

Justificación

Se requiere bandeja para rack y poder acomodar todos los equipos en este.

Archivo APU adjunto

APU - SUMINISTRO DE BANDEJA 1U
RACK-00cd7cde71114668ab30996031d2c72b.xlsx




ACTIVIDAD EXTRA 2

Descripción de la actividad	SUMINISTRO TABLERO ELECTRICO REGULADO , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. .
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	la implementación de este permitirá una distribución adecuada de las cargas eléctricas, la protección de los equipos mediante circuitos independientes y una mejor gestión de la energía para los sistemas
Archivo APU adjunto	APU- SUMINISTRO DE TABLERO REGULADO DE 8 CIRCUITOS-bf6fe7746cf44f6bbc5e698b6978aa2b.xlsx




ACTIVIDAD EXTRA 3

Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE TABLERO NORMAL DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	la implementación de este permitirá una distribución adecuada de las cargas eléctricas, la protección de los equipos mediante circuitos independientes y una mejor gestión de la energía para los sistemas
Archivo APU adjunto	APU- SUMINISTRO DE TABLERO NORMAL DE 8 CIRCUITOS-b3f7650e7bc34cd0a3b11166a1dca429.xlsx

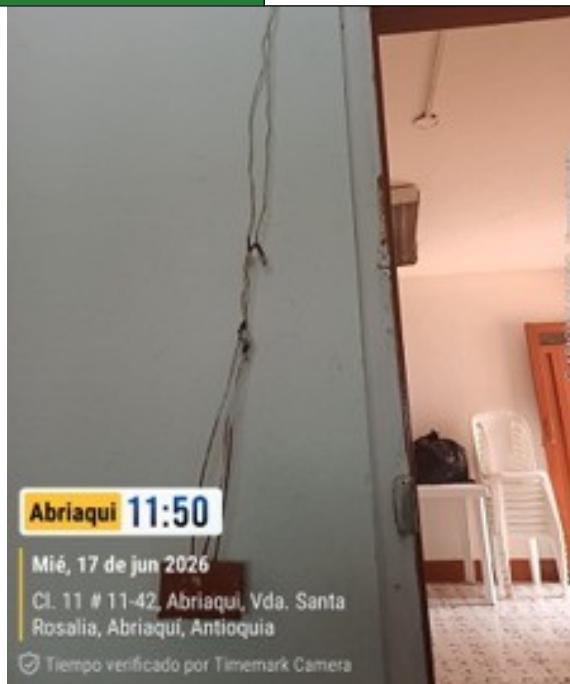

ACTIVIDAD EXTRA 4	
Descripción de la actividad	Suministro LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W T8
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere ya que el Cuarto de monitoreo no cuenta con iluminación.
Archivo APU adjunto	APU LUMINARIA-5c70669868ad405a98c46c4e973d6c71.xlsx

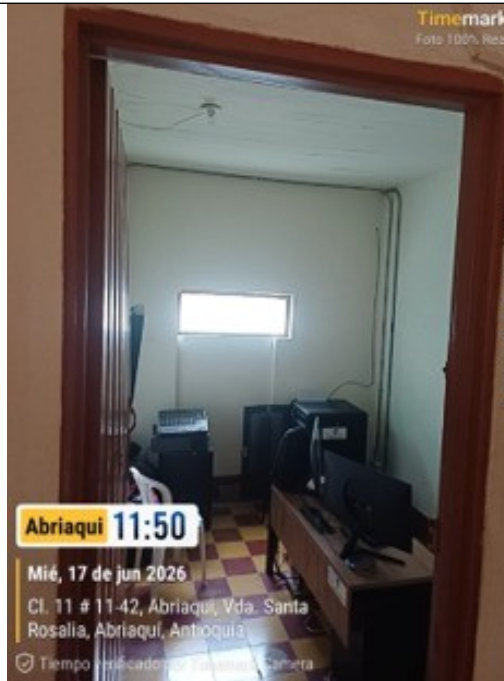

ACTIVIDAD EXTRA 5

Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE CIRCUITO ELECTRICO EN CABLE 2x8+8 AWG, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	ML
Cantidad	30
Justificación	Se requiere para a acometida de instalación del tablero eléctrico y regulado.
Archivo APU adjunto	APU CIRCUITO 8 8-16af389b64054de3834563e6e8bcf086.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUNCIONANDO
¿Requiere mantenimiento?	SI
Tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO

9. CONTROL DE APROBACIÓN
