



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Cañasgordas
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	15/07/2026
Dirección del punto / sector	Calle 25B, Cañasgordas, Antioquia
Latitud	6.747607889198604
Longitud	-76.02387052540108
Coordenadas formulario	-76.02_6.75

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	6.747650, -76.023892



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	N/A
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4

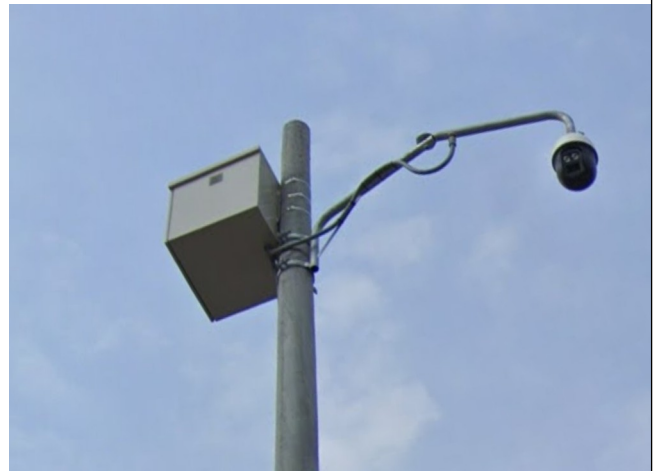


3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	12MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	6.747650, -76.023892
Propietario del poste	EPM
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO

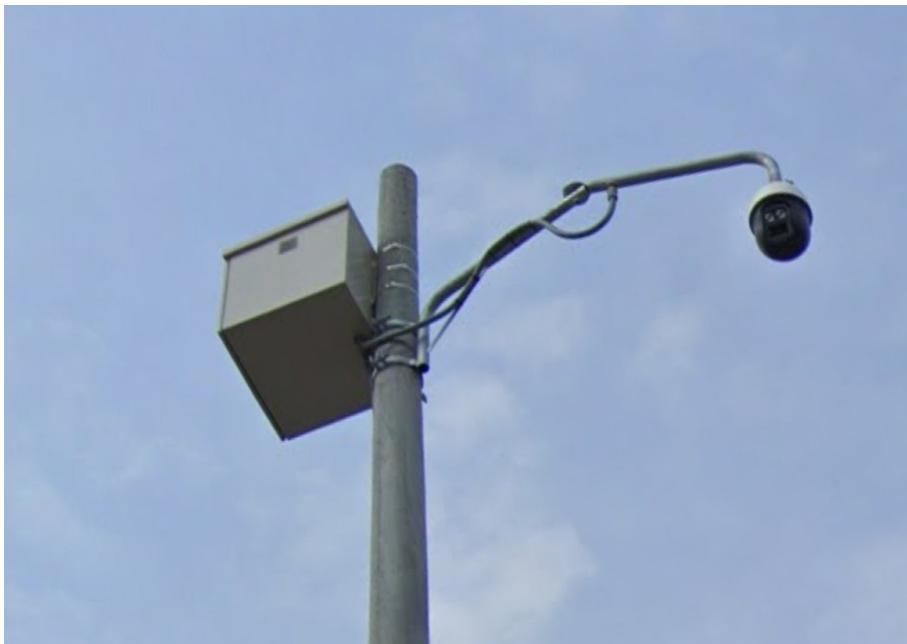

Requiere Cambio de anclaje:	NO
GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	SI
Existe Gabinete Metálico:	BUENO

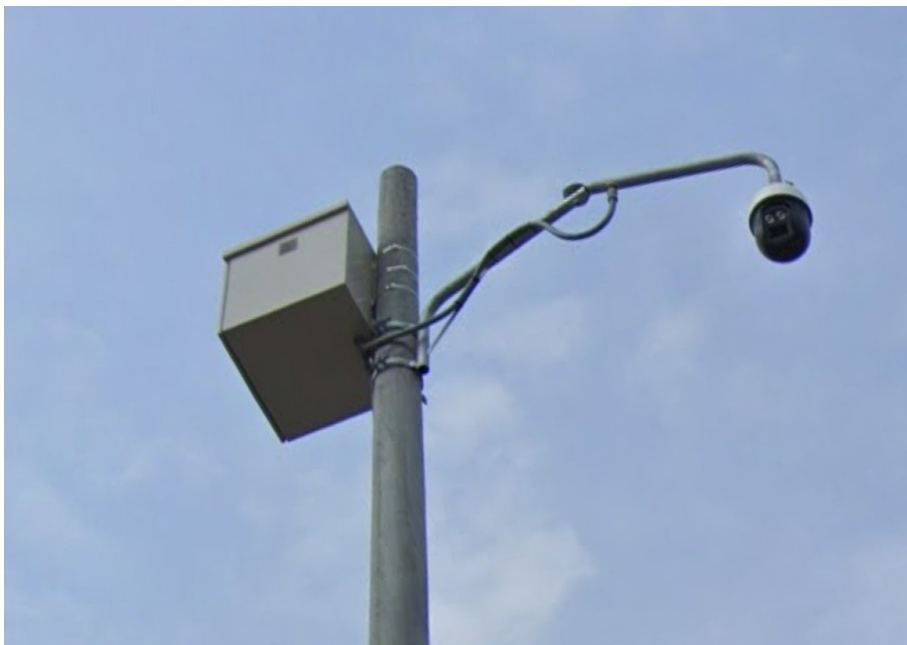

Requiere Gabinete Metálico:	NO
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	NO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	NO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO

CORONA ANTIESCALATORIA

Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO



Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	

Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO



Requiere Brazo de Soporte:	NO
----------------------------	----

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	NO
-----------------	----

Requiere Cables:	NO
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	NO
🔧 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
🛡️ CORAZA	
Existe Coraza:	NO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🔌 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



Requiere UPS:	NO
🔌 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	NO
🛡️ PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
🔌 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS

Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	

Existe Inyector PoE:	NO
Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO

Requiere Switch:	NO
📷 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
No se encontraron detalles de cámaras relacionados con este diagnóstico.	
¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	

Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

✂ ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	ADQUISICION DE CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 4 SC/LC,IP 65, ENTRADA (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	caja OB se encuentra destinada a la organización, protección y distribución de las conexiones del sistema, garantizando un adecuado funcionamiento y facilitando las labores de operación y mantenimiento.
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Cámara en funcionamiento, Se presentan deficiencias en sus elementos de protección eléctrica y de datos, condiciones que incrementan el riesgo de fallas y afectaciones en la operación del sistema.

8. CONTROL DE APROBACIÓN
