

	FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad	 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia
---	---	--


Operador	UNION TEMPORAL AEI
Contrato disponible	169_2026
Técnico responsable	Stiven Valencia Vergara
Cédula del técnico	1017274856

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Heliconia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	17/07/2026
Vereda / sector	LA CHORRERA
Dirección del punto / sector	Carrera 20, Heliconia, Antioquia
Latitud	6.207391
Longitud	-75.733024
Coordenadas formulario	-75.73_6.21

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	6.207391, -75.733024

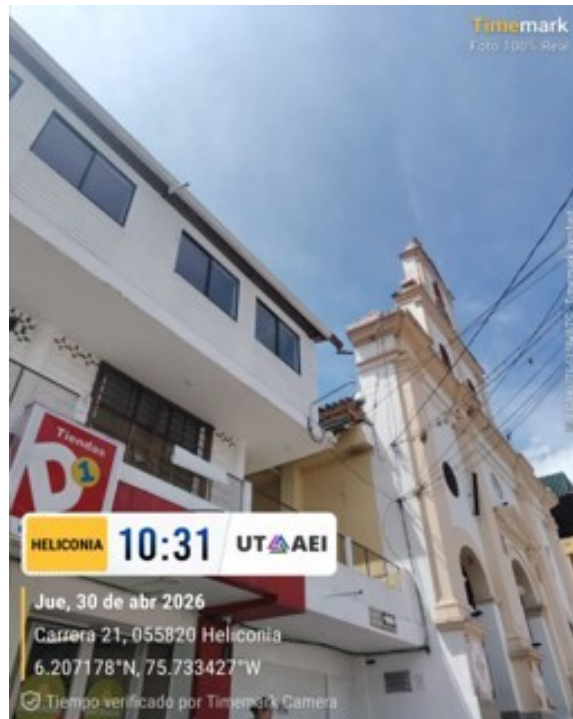

¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	POLICIA
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	CABLE_DATOS
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	N/A
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE

Tipo de anclaje:	FACHADA
Dirección de referencia del anclaje	6.207391, -75.733024
Estado en el que se encuentra el anclaje:	REGULAR



Requiere Cambio de anclaje:	NO
 GABINETE METÁLICO	
Existe Gabinete Metálico:	NO
Requiere Gabinete Metálico:	SI
Tipo Gabinete Metálico requerido:	GAB_PARED
Requiere Kit de Ventilación Doble:	NO
Observaciones Gabinete:	Se recomienda la instalación de un gabinete para la correcta implementación
 CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO	
Existe Caja Distribución Vertical:	NO
Requiere Caja Distribución Vertical:	NO
 INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA	
Existe Infraestructura Subterránea:	NO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO
 CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
 BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO



Requiere Brazo de Soporte:

NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚡ ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	NO
Requiere Cables:	SI
Tipo de cable requerido:	3X12AWG
Cantidad Cable 3x12 AWG (ml):	6
⚡ TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	NO
Requiere Breaker:	NO
🔌 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	NO
🔌 TUBERÍA	
Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO
🔌 CORAZA	
Existe Coraza:	NO
Requiere Coraza 3/4":	SI
Cantidad Coraza 3/4" (ml):	5
Observaciones Coraza:	Se requiere coraza para instalacion del nuevo gabinete y conexion por fobra
🔌 UPS	
Existe UPS:	NO
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	Actualmente no se cuenta con UPS, se proyecta nuevo gabinete para ubicar
🔌 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
🌐 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	

Existe SPT:	NO
Requiere SPT:	NO
 PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_POTENCIA,PROTECCION_ELECTRICA
Protección de potencia, video y datos en cámaras (un):	1
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	Se requieren para salvaguardar los equipos de videovigilancia frente a
 TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	NO
Requiere Toma 125 V:	NO
 CANAleta PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	NO
Requiere Fibra Óptica:	SI
Observaciones Fibra Óptica:	Se proyecta nuevo gabinete y con este cambiar la conectividad a fibra optica.
 INYEctor POE	
Existe Inyeector PoE:	NO
Requiere Inyeector PoE:	SI
 PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	NO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
 SWITCH	
Existe Switch:	NO
Requiere Switch:	SI
Tipo de Switch requerido:	SW_8P
Cantidad Switch (un):	1
Observaciones Switch:	el switch permite una distribución organizada de la conectividad de red y
 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	2
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



CÁMARA EXISTENTE 2

Tipo de cámara	LPR
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

✂ ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Descripción de la actividad	ADQUISICION GABINETES DE POSTE/FACHADA, MIN 11U, NEMA 4, TECHO INCLINADO, ESPACIO PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS (BARRAJE DE COBRE, CABLEADO, TRANSFORMADOR, TRANSMISOR DE VIDEO, ESTABILIZADOR O REGULADORES DE VOLTAJE)
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Gabinete para fachada, necesario para la proyeccion realizada para la cámara 1 y la cámara 3
Archivo APU adjunto	APU-GABINETE POSTE-FACHADA-750e95803e8c4f61857d4174ed1de7aa.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE CORAZA DE 1" INCLUYE CONECTORES RECTOS Y/O CURVOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN .
Unidad	ML
Cantidad	3
Justificación	Material necesario para la instalacion de gabinete y cambio de conexion a fibra de las cámaras 1 y 3.
Archivo APU adjunto	APU-coraza 1-87595564864d4d50b62ff1125449aef3.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Descripción de la actividad	SUMINISTRO DE CABLE CONCENTRICO TRENZA EN ALUMINIO 2*4+4, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Unidad	ML
Cantidad	50
Justificación	Material necesario para la instalacion de gabinete y cambio de conexion a fibra de las cámaras 1 y 3.
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de manteniemiiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	La implementación de un gabinete que integre una UPS, un switch de 8 puertos y los elementos de protección eléctrica y de datos constituye una mejora necesaria para garantizar la continuidad operativa, la protección y la confiabilidad del sistema de videovigilancia. Esta solución fortalece la disponibilidad de la cámara PTZ frente a fallas eléctricas, protege los equipos ante sobretensiones y facilita una gestión ordenada de la infraestructura.

8. CONTROL DE APROBACIÓN
