



FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO MANTENIMIENTO Proyecto Tasa de Seguridad



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Andes
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	28/07/2026
Dirección del punto / sector	Centro De Vacunación Andes
Latitud	5.655204226458353
Longitud	-75.87796678676592
Coordenadas formulario	-75.88_5.66

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 7 Banco de Bogota



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernacion de antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE	
Tipo de anclaje:	POSTE
Tipo de poste	POSTE_CONCRE
Altura del poste (m)	14MTS
Tipo de servicio	TELEMATICA
Dirección de referencia del anclaje	carrera 51 con calle 49 A
Propietario del poste	MUNICIPIO
Tipo tension	BAJA
Red secundaria	TB_FO

Estado en el que se encuentra el anclaje:		BUENO
 14 jul 2026 8:07:03 a.m. 5°39'18.822"N 75°52'40.813"W Andes, banco de Bogotá		
Requiere Cambio de anclaje:		NO
GABINETE METÁLICO		
Existe Gabinete Metálico:		SI
Existe Gabinete Metálico:		REGULAR
 14 jul 2026 8:18:42 a.m. 5°39'48.678"N 75°52'36.533"W Andes, banco de Bogotá		
Requiere Gabinete Metálico:		No
Requiere Kit de Ventilación Doble:		NO
Observaciones Gabinete:		Gabinete de poste o fachada, este es un rack para uso de interiores
CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO		
Existe Caja Distribución Vertical:		SI
Estado de las Caja Distribución Vertical:		BUENO
Requiere Caja Distribución Vertical:		NO

INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50
Estado Caja 50x50:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	NO

CORONA ANTIESCALATORIA

Existe Corona Antiescalatoria:	SI
Existe Corona Antiescalatoria:	BUENO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO

BRAZO DE SOPORTE

Existe Brazo de Soporte:	SI
Estado Brazo de Soporte:	BUENO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA

Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO

Foto Cables



14 jul 2026 8:18:59 a.m.
5°39'18.343"N 75°52'40.175"W
Andes
Andes, banco de Bogotá

Requiere Cables:	NO
------------------	----

TABLERO BREAKER

Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO

TRANSFORMADOR REDUCTOR

Existe Transformador Reductor:	NO
Requiere Transformador Reductor:	SI

TUBERÍA

Existe Tubería:	NO
Requiere Tubería:	NO

CORAZA

Existe Coraza:	SI
----------------	----

Estado Coraza:	BUENO
Foto Coraza	
  14 jul 2026 8:21:25 a.m. 5°39'48.678"N 75°52'36.533"W Andes Andes, banco de Bogotá	
Requiere Coraza 3/4":	NO
 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	MALO
Foto UPS	
  14 jul 2026 8:20:37 a.m. 5°39'17.937"N 75°52'39.944"W Andes Andes, banco de Bogotá	
Requiere UPS:	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_1_5
Observaciones UPS:	La UPS no enciende
 BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	

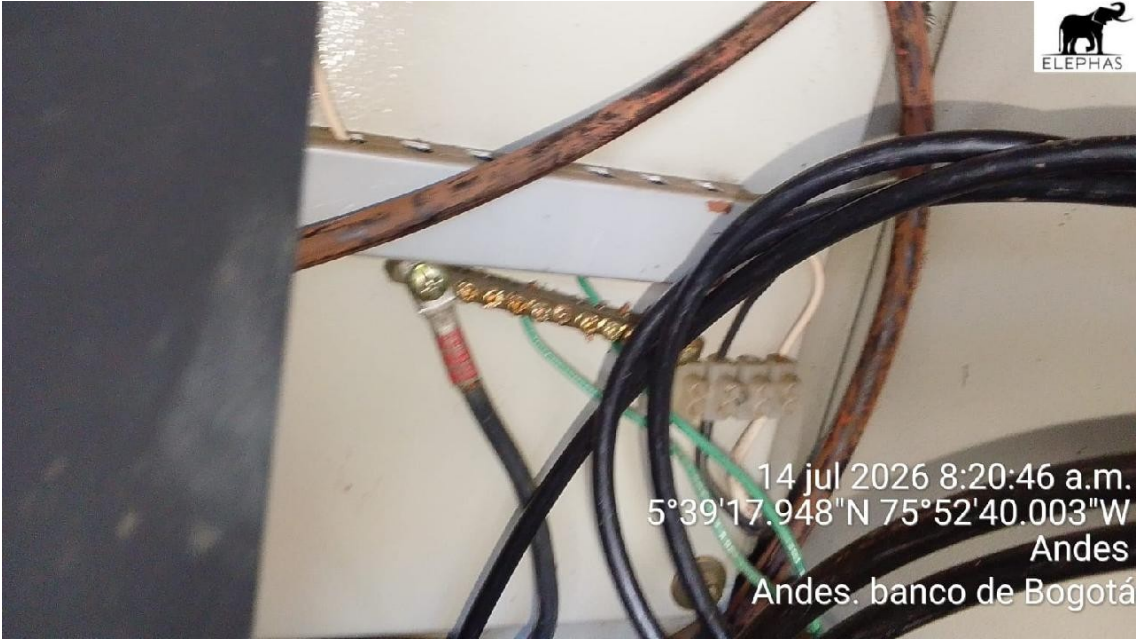
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Foto SPT	
 14 jul 2026 8:20:46 a.m. 5°39'17.948"N 75°52'40.003"W Andes Andes. banco de Bogotá	
Requiere SPT:	NO
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	Se requiere DPS
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	REGULAR

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	SI
Estado Canaleta Plástica:	BUENO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO
Requiere Fibra Óptica:	NO
INYECTOR POE	
Existe Inyector PoE:	SI
Estado Inyector PoE:	BUENO



Requiere Inyector PoE:	NO
⚡ PATCH CORD	
Existe Patch Cord:	NO
Requiere Patch Cord:	NO
🔌 PATCH PANEL	
Existe Patch Panel:	SI
Estado Patch Panel:	BUENO
Requiere Patch Panel:	NO
Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	NO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO



Requiere Switch:	NO
	CÁMARA
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	3
	CÁMARA EXISTENTE 1
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



	CÁMARA EXISTENTE 2
Tipo de cámara	FIJA
Estado de la cámara	BUENO



14 jul 2026 8:21:33 a.m.
5°39'48.678"N 75°52'36.533"W
Andes
Andes. banco de Bogotá

CÁMARA EXISTENTE 3

Tipo de cámara

FIJA

Estado de la cámara

BUENO



14 jul 2026 8:21:33 a.m.
5°39'48.678"N 75°52'36.533"W
Andes
Andes. banco de Bogotá

¿Requiere Cámara?

NO

Requiere Burbuja Domo PTZ:

NO

ENRUTADOR VPN

Existe Enrutador VPN:

NO

EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS

Existe Equipo TX/RX:

NO

Requiere Equipo TX/RX:

NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

ACTIVIDAD EXTRA

¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	OE05
Descripción de la actividad	ADQUISICION GABINETES DE POSTE/FACHADA, min 11U, NEMA 4, TECHO INCLINADO, ESPACIO PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS (BARRAJE DE COBRE, CABLEADO, TRANSFORMADOR, TRANSMISOR DE VIDEO, ESTABILIZADOR O REGULADORES DE VOLTAJE), INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO P
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	El gabinete no cumple con las especificaciones técnicas, el que se encuentra en el formulario es un gabinete tipo Rack interior, no es el acto para instalar en los puntos de Video Vigilancia
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE05 GABINETE.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	OE08
Descripción de la actividad	INSTALACION GABINETES DE POSTE/FACHADA, min 11U, NEMA 4, TECHO INCLINADO, ESPACIO PARA UBICACIÓN DE ELEMENTOS (BARRAJE DE COBRE, CABLEADO, TRANSFORMADOR, TRANSMISOR DE VIDEO, ESTABILIZADOR O REGULADORES DE VOLTAJE), INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO
Unidad	UN
Cantidad	1
Archivo APU adjunto	APU INST-OE08 GABINETE.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO

8. CONTROL DE APROBACIÓN
