



**FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO
MANTENIMIENTO
Proyecto Tasa de Seguridad**



Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863

1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Concordia
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	21/08/2026
Vereda / sector	VENTANAS
Dirección del punto / sector	Cafe Amarelo
Latitud	6.046673934367711
Longitud	-75.90725433633793
Coordenadas formulario	-75.91_6.05

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relacion con cual componente:	CCTV
Información Ubicación CCTV	PVV 1 Parque Principal



¿Hubo Acompañamiento de funcionario Alcaldía?	NO
Seleccione el propietario del punto:	MUNICIPIO
Seleccione un proveedor de energía del punto:	EPM
Seleccione el medio de comunicación del punto:	FO
Especifique el proveedor de la conexión del punto:	Gobernación de Antioquia
¿Requiere actualización de conexión?	NO

Foto 1

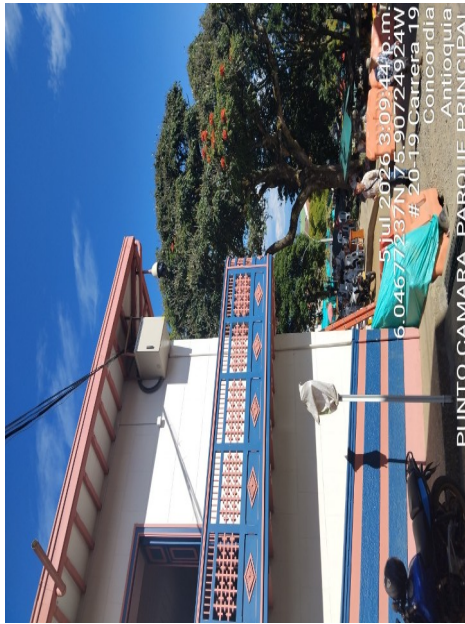


Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ESTRUCTURALES

ANCLAJE

Tipo de anclaje:	FACHADA
Dirección de referencia del anclaje	Carrera 19 N° 19-64
Estado en el que se encuentra el anclaje:	BUENO



Requiere Cambio de anclaje:

NO

GABINETE METÁLICO

Existe Gabinete Metálico:

SI

Existe Gabinete Metálico:

BUENO



Requiere Kit de Ventilación Doble:

NO

Observaciones Gabinete:

POr solicitud del propietario de la casa donde esta anclado el gabinete este

CAJA DISTRIBUCIÓN VERTICAL FO

Existe Caja Distribución Vertical:

SI

Estado de las Caja Distribución Vertical:

BUENO

Requiere Caja Distribución Vertical:

NO

INFRAESTRUCTURA SUBTERRANEA

Existe Infraestructura Subterránea:

NO

Estado Tubería:	BUENO
Requiere Infraestructura Subterránea:	SI
Infraestructura Subterránea y Obras complementarias:	CAJA_50X50_PROY
CORONA ANTIESCALATORIA	
Existe Corona Antiescalatoria:	NO
Requiere Corona Antiescalatoria:	NO
BRAZO DE SOPORTE	
Existe Brazo de Soporte:	NO
Requiere Brazo de Soporte:	NO

4. COMPONENTES ELÉCTRICOS

ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen Cables:	SI
Estado Cables:	BUENO
Foto Cables	
	
Requiere Cables:	NO
TABLERO BREAKER	
Existe Tablero Breaker:	NO
Existe Breaker:	SI
Estado Breaker:	BUENO
Requiere Breaker:	NO
TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe Transformador Reductor:	SI
Estado Transformador Reductor:	BUENO

Foto Transformador Reductor



5 jul 2026 3:20:49 p.m.
6.0467081 7N 75.90724446W
19-64 Carrera 19
Concordia
Antioquia
PUNTO CAMARA PARQUE PRINCIPAL

Requiere Transformador Reductor:	NO
✂ TUBERÍA	
Existe Tubería:	SI
Estado Tubería:	BUENO
Requiere Tubería:	NO
🔵 CORAZA	
Existe Coraza:	SI
Estado Coraza:	BUENO
Requiere Coraza 3/4":	NO
🟢 UPS	
Existe UPS:	SI
Estado UPS:	BUENO

Foto UPS



5 jul 2026 3:16:30 p.m.
6.04671122N 75.90723666W
19-64 Carrera 19
Concordia
Antioquia
PUNTO CAMARA PARQUE PRINCIPAL

Requiere UPS:	NO
BATERÍAS UPS	
Existen Baterías UPS:	NO
Requiere Baterías UPS:	NO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	SI
Estado SPT:	BUENO
Requiere SPT:	SI
Observaciones SPT:	se debe trasladar el gabinete, por ende se requiere realizar una puesta a tierra
PROTECCIÓN	
Existe Protección:	NO
Requiere Protección:	SI
Tipo de Protección requerida:	PROTECCION_ELECTRICA
Protección eléctrica DPS 40 kA - 150 V (un):	1
Observaciones Protección:	El gabinete no cuenta con DPS para la proteccion de los equipos
TOMA 125 V	
Existe Toma 125 V:	SI
Estado Toma 125 V:	BUENO

Foto Toma 125 V



Requiere Toma 125 V:	NO
CANALETA PLÁSTICA	
Existe Canaleta Plástica:	NO
Requiere Canaleta Plástica 100x45:	NO

5. COMPONENTES DE EQUIPOS

FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe Fibra Óptica:	SI
Estado Fibra Óptica:	BUENO



Requiere Fibra Óptica:

NO

🔗 INYECTOR POE

Existe Inyector PoE:

SI

Estado Inyector PoE:

BUENO



Requiere Inyector PoE:

NO

⚡ PATCH CORD

Existe Patch Cord:

SI

Estado Patch Cord:

BUENO

Requiere Patch Cord:

NO

🔌 PATCH PANEL

Existe Patch Panel:

NO

Requiere Patch Panel:

NO

Requiere Toma RJ45:	NO
📁 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe Organizador de Cableado:	NO
Requiere Organizador de Cableado:	NO
🔄 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe Convertidor Monomodo:	NO
Requiere Convertidor Monomodo:	NO
📡 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCEIVER ÓPTICO	
Existe Módulo Óptico:	SI
Estado Módulo Óptico:	BUENO
Requiere Módulo Óptico:	NO
🔌 SWITCH	
Existe Switch:	SI
Estado Switch:	BUENO
	
Requiere Switch:	NO
📷 CÁMARA	
Existe Cámara:	SI
Cantidad de cámaras existentes:	1
CÁMARA EXISTENTE 1	
Tipo de cámara	PTZ
Estado de la cámara	BUENO



¿Requiere Cámara?	NO
Requiere Burbuja Domo PTZ:	NO
🌐 ENRUTADOR VPN	
Existe Enrutador VPN:	NO
📡 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe Equipo TX/RX:	NO
Requiere Equipo TX/RX:	NO

6. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

🔧 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	OE03
Descripción de la actividad	INST-OE03 INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	ML
Cantidad	30
Justificación	Se requiere del suministro y la instalacion de 30 metros de cable UTP para comunicar el gabinete con la camara, desde la nueva ubicacion del gabinete
Archivo APU adjunto	APU INST-OE03 CABLE UTP CAT 6A-fd415228abf44f159ed8162db3c7bdf8.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

7. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento	FUNCIONANDO
Requiere mantenimiento:	SI
Seleccione el tipo de mantenimiento:	CORRECTIVO
Ingrese observaciones generales y detalles identificados en el proceso de diagnostico	Se debe trasladar el gabinete para un poste de 8 metros de alumbrado publico que se encuentra al frente del punto de camara, se requiere de 30 mts de cable UTP

8. CONTROL DE APROBACIÓN

Estado de aprobación	APROBADO
Fecha de aprobación	28/08/2026
Aprobado por	JANIER_PIEDRAHITA
Observaciones aprobación	Se aprueba mantenimiento correctivo Total: \$ 9.664.103
