

Operador	ELEPHAS SAS
Contrato disponible	166_2026
Técnico responsable	Hector Garcia Palacio
Cédula del técnico	15388863


1. LOCALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Municipio	Hispania
Departamento	Antioquia
Fecha diagnóstico	22/08/2026
Vereda / sector	POTRERILLO
Dirección del punto / sector	Calle 48 51 2-100, Hispania, Antioquia
Latitud	5.798480247854612
Longitud	-75.90777904621667
Coordenadas formulario	-75.91_5.8

2. INFORMACIÓN GENERAL

El mantenimiento tiene relación con cuál componente:	CCM
Información ubicación CCM:	Estacion de policia

Evidencia ubicación CCM

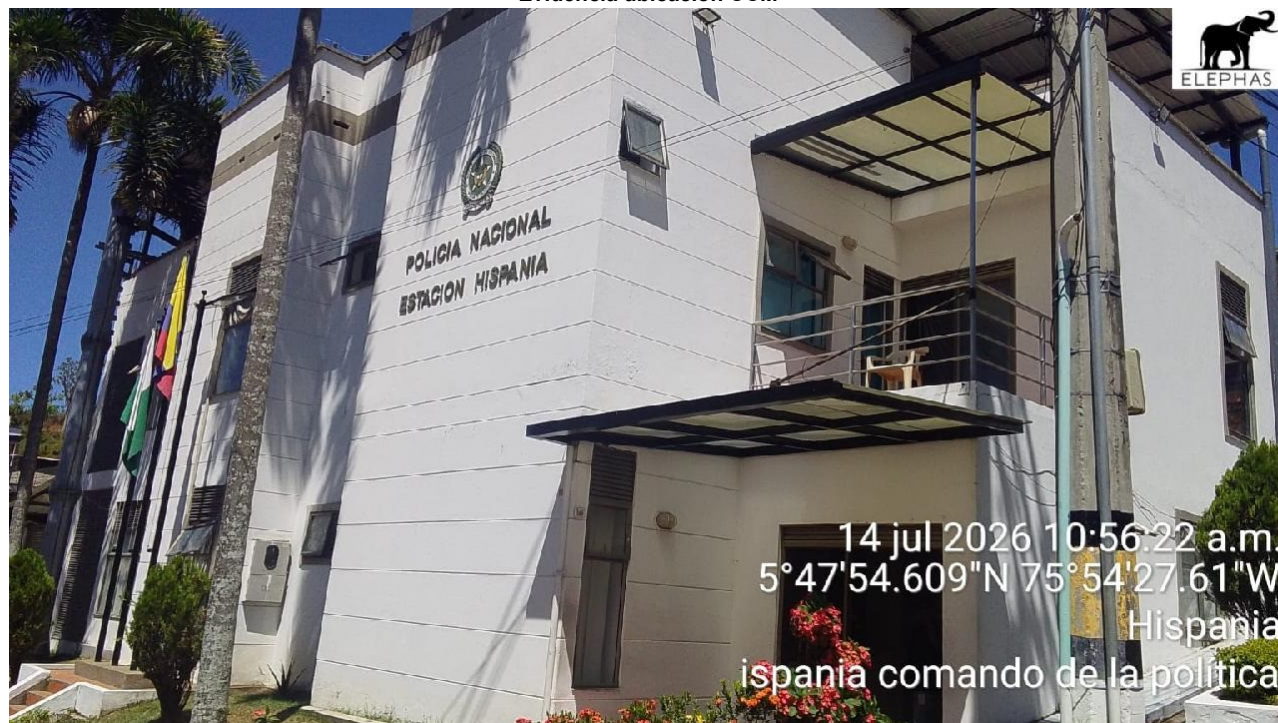

¿Hubo acompañamiento de funcionario de la Alcaldía?	NO
Propietario del CCM:	MUNICIPIO
Proveedor de energía del CCM:	EPM
Medio de comunicación del CCM:	FO
Proveedor de la conexión del CCM:	Gobernación de Antioquia

¿Requiere actualización de conexión?	NO
¿El espacio del CCM se usa para otra actividad?	SI
Otro uso del espacio del CCM:	Oficina de secretaria de la estación
Administrador del CCM:	Comandante de estación de Policía
¿Personal de T.I. en sitio?	NO

Foto 1

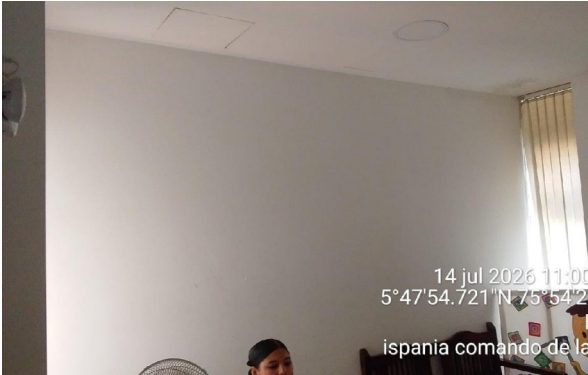


Foto 2



Foto 3



Foto 4



3. COMPONENTES ELÉCTRICOS

 RACK DE COMUNICACIONES	
Existe rack de comunicaciones:	NO
 ACOMETIDA ELÉCTRICA	
Existen cables:	NO
¿Requiere cables?	SI
Tipo de cable requerido:	2N_12+1AGW
Observaciones cables:	En la estacion de policia se instalara un espejo para la visual de las camaras ewl cual comprende de una estacion de trabajo con su respectivos monitores y monitor de 55"
 TABLERO BREAKER	
Existe tablero breaker:	NO
Existe breaker:	SI
Estado breaker:	BUENO
¿Requiere breaker?	SI
Tipo de breaker requerido:	BRK_20A
Cantidad breaker (un):	1
Observaciones tablero breaker:	Se requiere de 1 breaker para la acometida de la estacion de trabajo
 TRANSFORMADOR REDUCTOR	
Existe transformador reductor:	NO
¿Requiere transformador reductor?	NO
 TUBERÍA	
Existe tubería:	NO
¿Requiere tubería?	SI
Tipo de tubería requerida:	EMT_3_4
Cantidad tubería EMT 3/4 (ml):	60
Observaciones tubería:	Se requiere de tuberia para la acometida y la FO
 CORAZA	
Existe coraza:	NO
¿Requiere coraza 3/4?	NO
 UPS	
Existe UPS:	NO
¿Requiere UPS?	SI
Tipo de UPS requerida:	UPS_2_0
Observaciones UPS:	se requiere la instalacion d 1 UPS de 2 KVA para la proteccion de los equipos
 BATERÍAS UPS	
Existen baterías UPS:	NO
¿Requiere baterías UPS?	NO
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT)	
Existe SPT:	NO
¿Requiere SPT?	NO
 PROTECCIÓN	
Existe protección:	NO
¿Requiere protección?	NO
 PDU MULTITOMA	
Existe PDU multitoma:	NO
¿Requiere PDU multitoma?	SI
Observaciones PDU multitoma:	Se necesita 1 PDU para la coneccion de los equipos
 TOMA 125 V	
Existe toma 125 V:	NO
¿Requiere toma 125 V?	SI
Cantidad toma 125 V (un):	4
Observaciones toma 125 V:	se requieren 1 toma para la UPS, 1 para el monitor y 2 para la estacion de trabajo
 CANALETA PLÁSTICA	
Existe canaleta plástica:	NO
¿Requiere canaleta plástica 100x45?	SI

Cantidad canaleta plástica (un):	10
Observaciones canaleta plástica:	para poder llevar la comunicacion entre el rack y la estacion de trabajo

4. COMPONENTES DE EQUIPOS

 PUNTO FÍSICO DE REPETICIÓN INALÁMBRICA	
Existe punto físico de repetición:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
 PLANTA ELÉCTRICA Y TRANSFERENCIA	
Existe planta eléctrica y transferencia:	NO
¿Requiere mantenimiento?	NO
 FIBRA ÓPTICA MONOMODO 24 HILOS	
Existe fibra óptica:	NO
¿Requiere fibra óptica?	SI
Observaciones fibra óptica:	Para comunicar la FO del municipio con el espejo
 ODF	
Existe ODF:	NO
¿Requiere ODF?	NO
 INYECTOR POE	
Existe inyector PoE:	NO
¿Requiere inyector PoE?	NO
 PATCH CORD	
Existe patch cord:	NO
¿Requiere patch cord?	SI
Observaciones patch cord:	2
 PATCH PANEL	
Existe patch panel:	NO
¿Requiere patch panel?	NO
¿Requiere toma RJ45?	NO
 ORGANIZADOR DE CABLEADO	
Existe organizador de cableado:	NO
¿Requiere organizador de cableado?	SI
Cantidad organizador de cableado (un):	1
Observaciones organizador de cableado:	se requiere de 1 organizador
 CONVERTIDOR MONOMODO	
Existe convertidor monomodo:	NO
¿Requiere convertidor monomodo?	NO
 MÓDULO TRANSECTOR/TRANSCIVER ÓPTICO	
Existe módulo óptico:	NO
¿Requiere módulo óptico?	NO
 SWITCH	
Existe switch:	NO
¿Requiere switch?	SI
Tipo de switch requerido:	SW_8P
Cantidad switch (un):	1
Observaciones switch:	se requiere un Switch de 8 puertos para la comunicacion con el CCM
 DISCO DURO	
Existe disco duro:	NO
¿Requiere disco duro?	NO
 FIREWALL	
Existe firewall:	NO
¿Requiere instalación de firewall?	NO
 ENRUTADOR VPN	
Existe enrutador VPN:	NO
 EQUIPO TX/RX DE MICROONDAS	
Existe equipo TX/RX:	NO
¿Requiere equipo TX/RX?	NO
EQUIPO A/C MINI SPLIT	
Existe equipo A/C mini split:	NO

¿Requiere equipo A/C mini split?	NO
 ELECTROIMÁN 600 LB	
Existe electroimán 600 lb:	NO
¿Requiere electroimán 600 lb?	NO

5. COMPONENTES DE SOFTWARE

 SERVIDOR NVR	
Existe servidor NVR:	NO
¿Requiere servidor NVR?	NO
Cantidad servidor NVR (un):	0
 LICENCIAS	
Existen licencias:	NO

6. COMPONENTES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA

☐ MONITOR	
Existe monitor:	NO
¿Requiere monitor?	SI
Tipo de monitor requerido:	MONITOR_55
Cantidad monitor 55" (un):	1
Observaciones monitor:	Se requiere de 1 monitor para visualizar las camaras
 ESTACIÓN DE TRABAJO	
Existe estación de trabajo:	NO
¿Requiere estación de trabajo?	SI
Cantidad requerida (un):	1
Observaciones estación de trabajo:	se requiere de la estacion de trabajo para la operacion del espejo
 JOYSTICK DE OPERACIÓN	
Existe joystick de operación:	NO
 CABLE HDMI	
Existe cable HDMI:	NO
¿Requiere cable HDMI?	SI
Cantidad requerida (un):	1
Observaciones cable HDMI:	se requiere de cable HDMI para lconectar la estacion de trabajo con el monitor de 55"
 LUMINARIAS	
Existen luminarias:	NO
 RED CONTRA INCENDIO	
Existe red contra incendio:	NO
 PUERTAS	
Existen puertas:	NO
 VENTANAS	
Existen ventanas:	NO
 CONTROL DE ACCESO	
Existe control de acceso:	NO
 CERRAMIENTO	
Existe cerramiento:	NO

7. COMPONENTES DE OBRA EXTRA

 ACTIVIDAD EXTRA	
¿Existen actividades extra no contempladas en el presupuesto?	SI
ACTIVIDAD EXTRA 1	
Código del ítem	OE01
Descripción de la actividad	INST-OE01 INSTALACIÓN DE CIRCUITO ELECTRICO EN CABLE 2N°12 + 1 N°12 AWG, THHN INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
Unidad	ML
Cantidad	50
Justificación	Se requiere la instlaaion del circuito electrico para alimentar el rack y la

	estacion de trabajo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE01 CIRCUITO ELECTRICO-63711e7e4b8f4a4aabd8ecfc82c58e64.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 2	
Código del ítem	OE02
Descripción de la actividad	INST-OE02 INSTALACIÓN DE BREAKER DE 15 - 30A ENCHUFABLE
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se debe de instalar el breke para el circuito que va a alimentar el rack
Archivo APU adjunto	APU INST-OE02 BREAKER-9314fe62903c41b7aabbdd35e1984c1.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 3	
Código del ítem	OE04
Descripción de la actividad	INST-OE04 INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE ACCESORIOS, CONDULETAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Unidad	ML
Cantidad	60
Justificación	Se requiere para llevar la energia y la FO hasta el rack del espejo
Archivo APU adjunto	APU INST-OE04 TUBERÍA EMT 3-4- 3b8cd10f08f54b0ea43ce3e4499ceb05.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 4	
Código del ítem	OE10
Descripción de la actividad	INST-OE10 Instalacion de PDU, multitoma horizontal de 8 entradas nema 5-15R polo aislado a tierra, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	Se requiere para alimentar los equipos del rack
Archivo APU adjunto	APU INST-OE10 PDU-c6423888082b468d86c14be3c4f2f2a6.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 5	
Código del ítem	OE07
Descripción de la actividad	INST-OE07 Instalación de toma doble normal, 15 amp 125v, incluye, todos los elementos necesarios .
Unidad	UN
Cantidad	4
Justificación	se requiere para conectar la UPS del rack, la eestacion de trabajo y los monitores
Archivo APU adjunto	APU INST-OE07 TOMAS-c494b8ccc2714577b3e3b41eb610eeae.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 6	
Código del ítem	OE11
Descripción de la actividad	INST-OE11 Instalacion de organizador de cableado en rack, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	se requiere instalar el organizador
Archivo APU adjunto	APU INST-OE11 ORGANIZADOR- bcad904179844190a01d51d728cc843c.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 7	
Código del ítem	OE03
Descripción de la actividad	SUM-OE03 SUMINISTRO DE MONITOR DE OPERADOR 27". INCLUYE SOPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS .
Unidad	UN
Cantidad	2
Justificación	se requieren dos monitores para la estacion de trabajo
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE03 MONITOR 27-

	27d6c4529c0b4a56acdf042bae35ca88.xlsx
Sin evidencia fotográfica	
ACTIVIDAD EXTRA 8	
Código del ítem	OE08
Descripción de la actividad	SUM-OE08 ADQUISICION DE CAJA TERMINAL OB, CAPACIDAD MAX. SALIDA 4 FTTH SC/LC,IP 65, ENTRADA 2 X (8 - 16 mm), USO EN MUROS O GABINETES. INCLUYE TODO LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
Unidad	UN
Cantidad	1
Justificación	se requiere para conectar la FO en el rack
Archivo APU adjunto	APU SUM-OE08 CAJA OB-2264456d91dd4ddba3002952e0cb38c6.xlsx
Sin evidencia fotográfica	

8. CONCLUSIONES GENERALES

Estado general de funcionamiento:	FUERA_SERVICIO
¿Requiere mantenimiento?	NO
Observaciones generales del diagnóstico:	El espejo se implementara desde 0

9. CONTROL DE APROBACIÓN
